


労働環境改善スケジュール

分野名	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												備考										
			11月			12月						1月				2月		3月		4月		5月		6月以降	
			26	3	10	17	24	31	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
防護装備	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負担軽減による作業性の向上を図る	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進						(継続実施)															
	2	ヒューマンエラー発生防止 (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等						(継続実施)															
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価						(継続実施)															
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現場作業	福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告（11/30）						(継続実施)															
	4	長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付						(継続実施)															
現場作業			【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き						(継続実施)																
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の2024年1月までの医師確保完了（固定医師1名＋ローテーション支援医師） ・1F救急医療室の2～4月の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の2～4月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の2～4月の勤務医師調整						1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整						(継続実施)									
			現場作業	1F救急医療室1月までの医師確保完了						(継続実施)															
要員管理	6	感染症対策の実施 (実績) ・インフルエンザ予防接種の実施 (予定) ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業	インフルエンザ予防接種の実施						(継続実施)															
			現場作業	インフルエンザ予防接種の実施						(継続実施)															
要員管理	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼						▽作業員の確保状況調査依頼						作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼									
			現場作業	作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計						作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)についての調査・集計						作業員の確保状況(1月実績/3月予定)と地元雇用率(1月実績)についての調査・集計									
労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック						(継続実施)															
			現場作業	公表(12/21)						作業員へのアンケート(第14回)															

区分	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		11月						12月						1月			2月	3月	4月	5月	6月以降	備考
			26	3	10	17	24	31	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		

廃炉中長期実行プラン2023

年度		2022(実績)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
その他	その他	管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）												
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><凡例></p> <ul style="list-style-type: none"> : 作業の期間 : 変更が見込まれる期間 : 工程間の関連 : 追加した工程 : 変更した工程 : 実施を取り止めた工程 </div>												

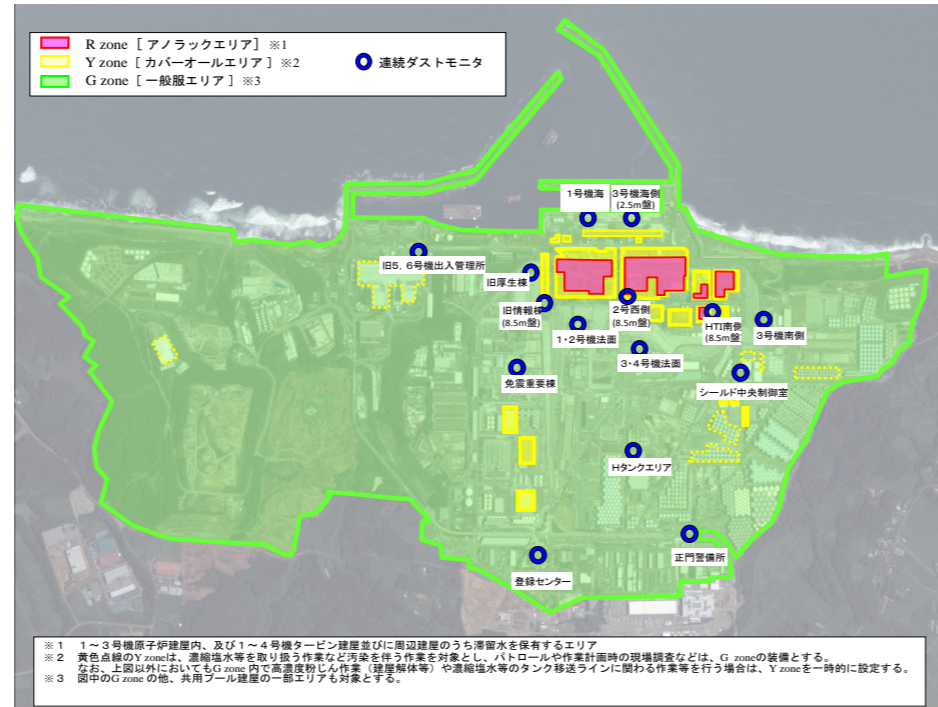

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe

労働環境改善
