

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2024年4月25日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

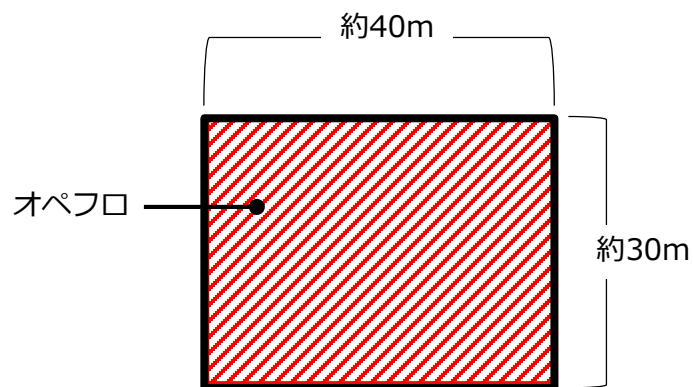
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

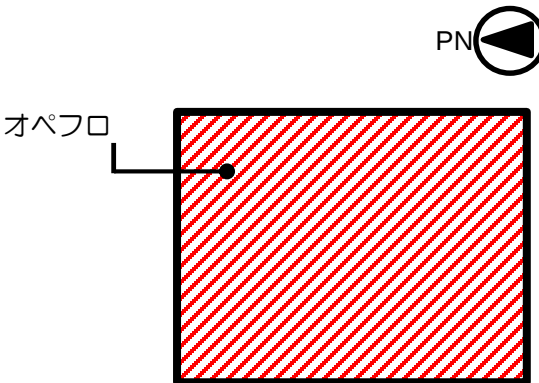
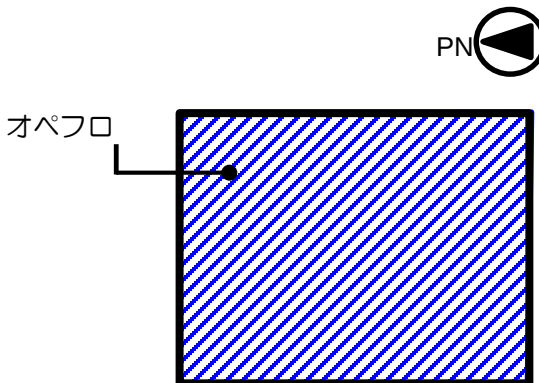
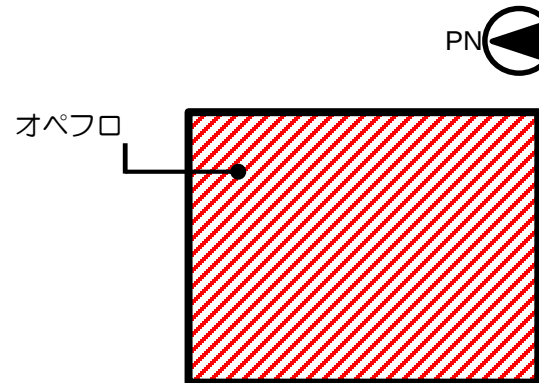


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（4月）	実績（4月）	計画（5月）
完了予定日：4月 15・16日 	完了日：4月 15・16日 	完了予定日：5月 10・11日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2024年4月23日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

3月	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	○	－	－	－
	散布実施	－	－	○	○	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.94E-05 (最大)	6.08E-05 (最大)	6.61E-05 (最大)	7.95E-05 (最大)	5.28E-05 (最大)	8.48E-05 (最大)	7.96E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
4月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.28E-04 (最大)	5.81E-05 (最大)	7.15E-05 (最大)	6.08E-05 (最大)	6.08E-05 (最大)	7.15E-05 (最大)	6.62E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	8.75E-05 (最大)	8.65E-05 (最大)	7.41E-05 (最大)	7.91E-05 (最大)	6.07E-05 (最大)	6.07E-05 (最大)	7.94E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.94E-05 (最大)	5.99E-05 (最大)	7.31E-05 (最大)	5.64E-05 (最大)	6.60E-05 (最大)	6.07E-05 (最大)	5.64E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	○	○	－	－	－	－
	散布実施	－	○	○	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.14E-05 (最大)	7.14E-05 (最大)	7.61E-05 (最大)	8.20E-05 (最大)	7.58E-05 (最大)	6.29E-05 (最大)	5.90E-05 (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	6.87E-05 (最大)	6.47E-05 (最大)	－ (最大)	－ (最大)	－ (最大)	－ (最大)	－ (最大)
		ND (最小)	ND (最小)	－ (最小)	－ (最小)	－ (最小)	－ (最小)	－ (最小)

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2024年4月23日時点
