

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2024年11月28日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

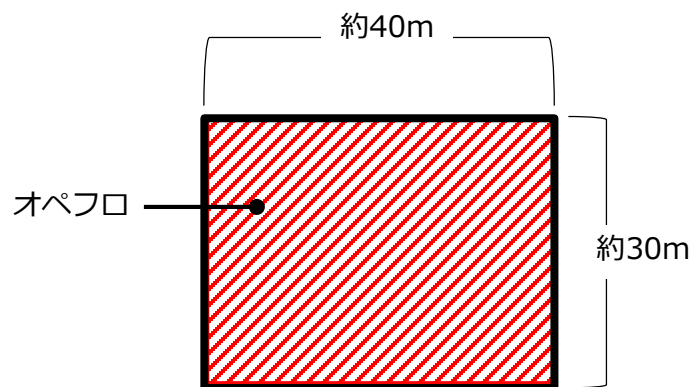
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

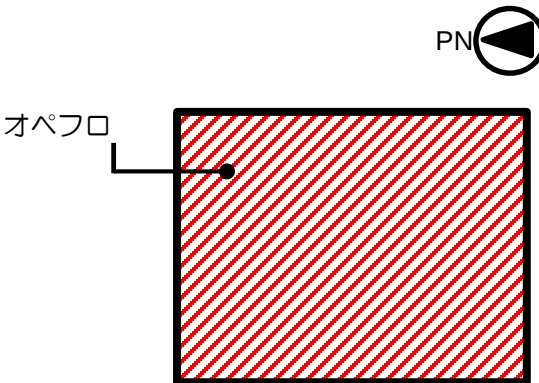
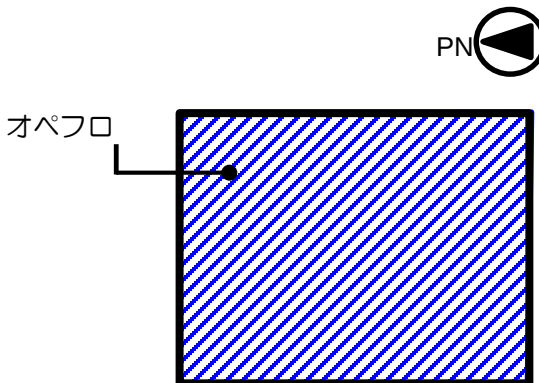
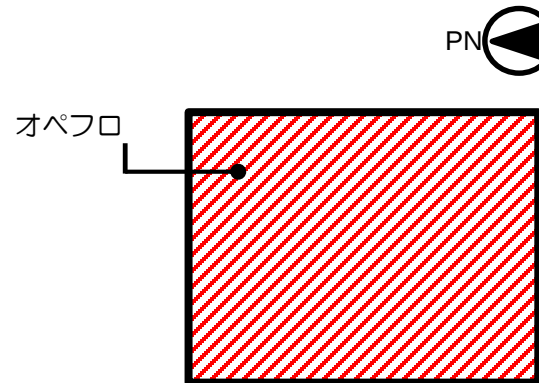


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（11月）	実績（11月）	計画（12月）
完了予定日：11月 6・7日 	完了日：11月 6・7日 	完了予定日：12月 19・20日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2024年11月27日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

10月	日	20（日）	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.90E-05（最大）	1.08E-04（最大）	8.80E-05（最大）	8.47E-05（最大）	8.44E-05（最大）	7.37E-05（最大）	8.71E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	27（日）	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
11月	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.14E-04（最大）	1.12E-04（最大）	1.03E-04（最大）	1.14E-04（最大）	1.11E-04（最大）	7.58E-05（最大）	1.07E-04（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	3（日）	4（月）	5（火）	6（水）	7（木）	8（金）	9（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	○	○	－	－
	散布実施	－	－	－	○	○	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	8.66E-05（最大）	1.07E-04（最大）	6.76E-05（最大）	6.24E-05（最大）	6.99E-05（最大）	5.92E-05（最大）	9.21E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	10（日）	11（月）	12（火）	13（水）	14（木）	15（金）	16（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.88E-05（最大）	1.05E-04（最大）	9.21E-05（最大）	7.86E-05（最大）	8.05E-05（最大）	8.14E-05（最大）	6.75E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	17（日）	18（月）	19（火）	20（水）	21（木）	22（金）	23（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.09E-04（最大）	7.42E-05（最大）	7.42E-05（最大）	7.88E-05（最大）	1.02E-04（最大）	7.42E-05（最大）	7.43E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	24（日）	25（月）	26（火）	27（水）	28（木）	29（金）	30（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.42E-05（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）
		ND（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）
