

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年4月24日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

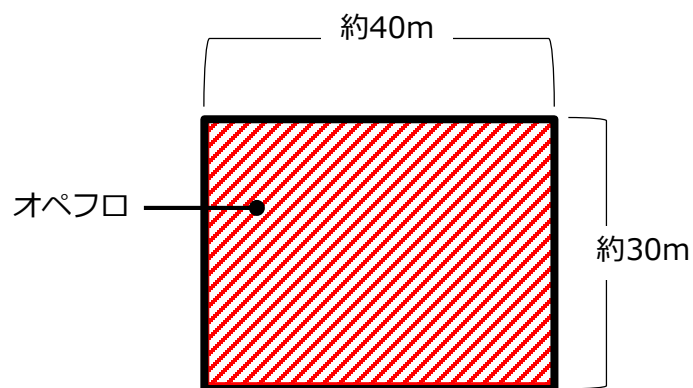
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

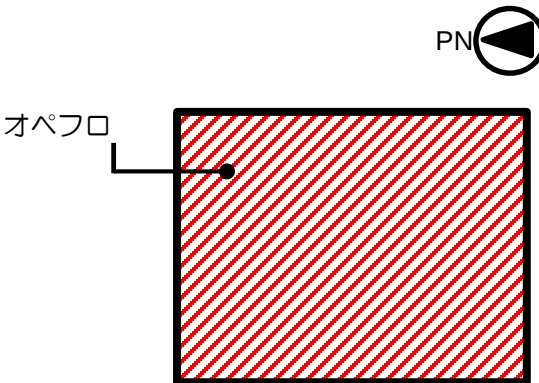
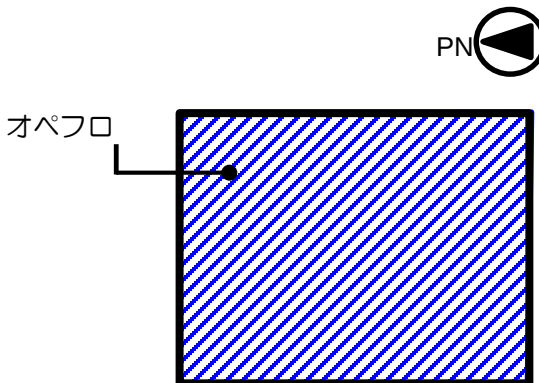
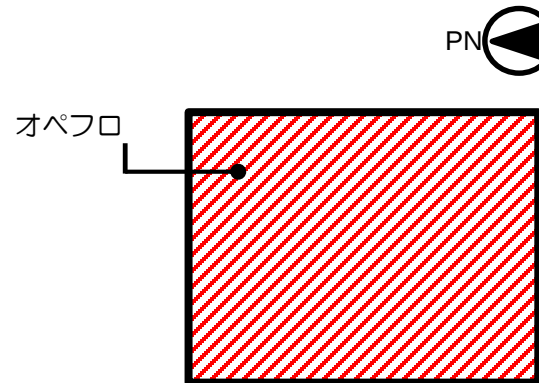


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（4月）	実績（4月）	計画（5月）
完了予定日：4月 18日 	完了日：4月 18日 	完了予定日：5月 28日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年4月24日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

3月	水	16（日）	17（月）	18（火）	19（水）	20（木）	21（金）	22（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※4	2.09E-04（最大）	2.66E-04（最大）	2.12E-04（最大）	2.18E-04（最大）	1.97E-04（最大）	2.03E-04（最大）	2.21E-04（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	1.02E-06（最小）	ND（最小）	ND（最小）	1.48E-06（最小）
	木	23（日）	24（月）	25（火）	26（水）	27（木）	28（金）	29（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
4月	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※5	2.00E-04（最大）	2.03E-04（最大）	2.09E-04（最大）	1.94E-04（最大）	2.09E-04（最大）	1.82E-04（最大）	9.83E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	木	30（日）	31（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※5	7.44E-05（最大）	9.02E-05（最大）	9.56E-05（最大）	7.17E-05（最大）	7.62E-05（最大）	9.79E-05（最大）	1.06E-04（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	金	6（日）	7（月）	8（火）	9（水）	10（木）	11（金）	12（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※6	1.01E-04（最大）	8.49E-05（最大）	9.83E-05（最大）	1.06E-04（最大）	9.83E-05（最大）	1.06E-04（最大）	9.83E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	土	13（日）	14（月）	15（火）	16（水）	17（木）	18（金）	19（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	○	－
	散布実施	－	－	－	－	－	○	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※7	9.83E-05（最大）	5.56E-05（最大）	7.96E-05（最大）	8.23E-05（最大）	8.23E-05（最大）	7.65E-05（最大）	9.82E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	日	20（日）	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※8	7.92E-05（最大）	9.57E-05（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）
