

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年8月28日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

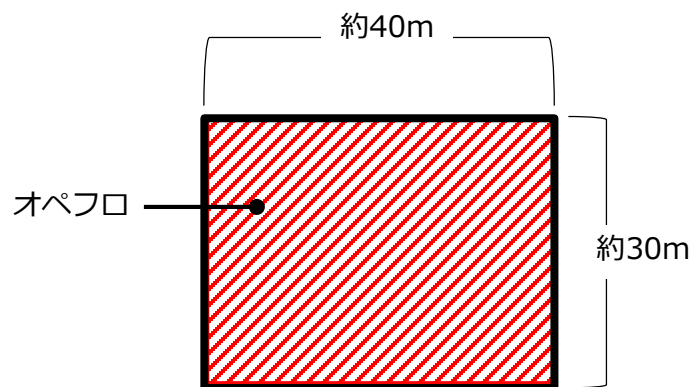
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

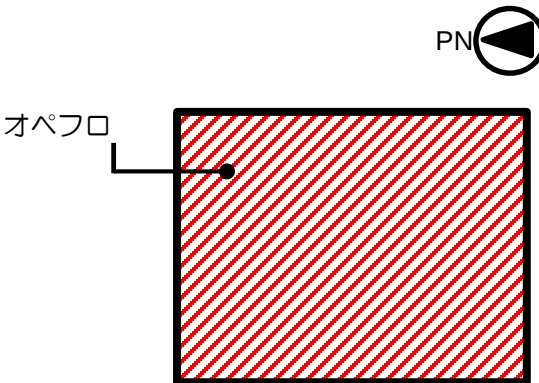
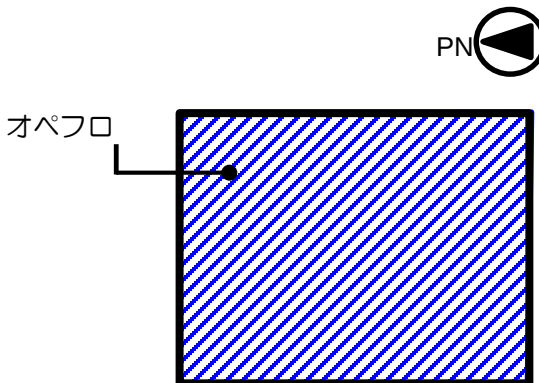
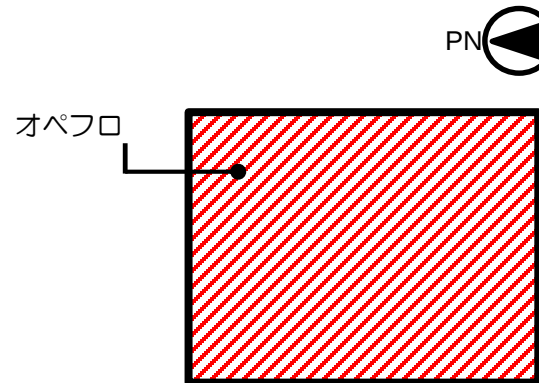


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（8月）	実績（8月）	計画（9月）
完了予定日：8月 19日 	完了日：8月 12日 	完了予定日：9月 9日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年8月26日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

7月	土	20 (日)	21 (月)	22 (火)	23 (水)	24 (木)	25 (金)	26 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	○	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※21	6.04E-04 (最大) ND (最小)	5.90E-04 (最大) ND (最小)	6.01E-04 (最大) ND (最小)	6.44E-04 (最大) ND (最小)	1.04E-04 (最大) ND (最小)	1.79E-05 (最大) ND (最小)	1.18E-05 (最大) ND (最小)
	日	27 (日)	28 (月)	29 (火)	30 (水)	31 (木)	1 (金)	2 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※22	1.27E-05 (最大) ND (最小)	1.37E-05 (最大) ND (最小)	3.99E-05 (最大) ND (最小)	5.16E-05 (最大) ND (最小)	2.51E-05 (最大) ND (最小)	1.34E-05 (最大) ND (最小)	2.81E-05 (最大) ND (最小)
8月	月	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※23	3.98E-05 (最大) ND (最小)	7.50E-06 (最大) ND (最小)	2.22E-05 (最大) ND (最小)	2.51E-05 (最大) ND (最小)	1.93E-05 (最大) ND (最小)	3.98E-05 (最大) ND (最小)	2.22E-05 (最大) ND (最小)
	火	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	○	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※24	4.56E-05 (最大) ND (最小)	4.27E-05 (最大) ND (最小)	2.81E-05 (最大) ND (最小)	2.22E-05 (最大) ND (最小)	3.40E-05 (最大) ND (最小)	2.52E-05 (最大) ND (最小)	2.51E-05 (最大) ND (最小)
	水	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※25	2.22E-05 (最大) ND (最小)	2.81E-05 (最大) ND (最小)	2.51E-05 (最大) ND (最小)	2.81E-05 (最大) ND (最小)	1.63E-05 (最大) ND (最小)	3.10E-05 (最大) ND (最小)	4.28E-05 (最大) ND (最小)
	木	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※25	2.81E-05 (最大) ND (最小)	6.04E-05 (最大) ND (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年8月26日時点
