


循環注水冷却スケジュール

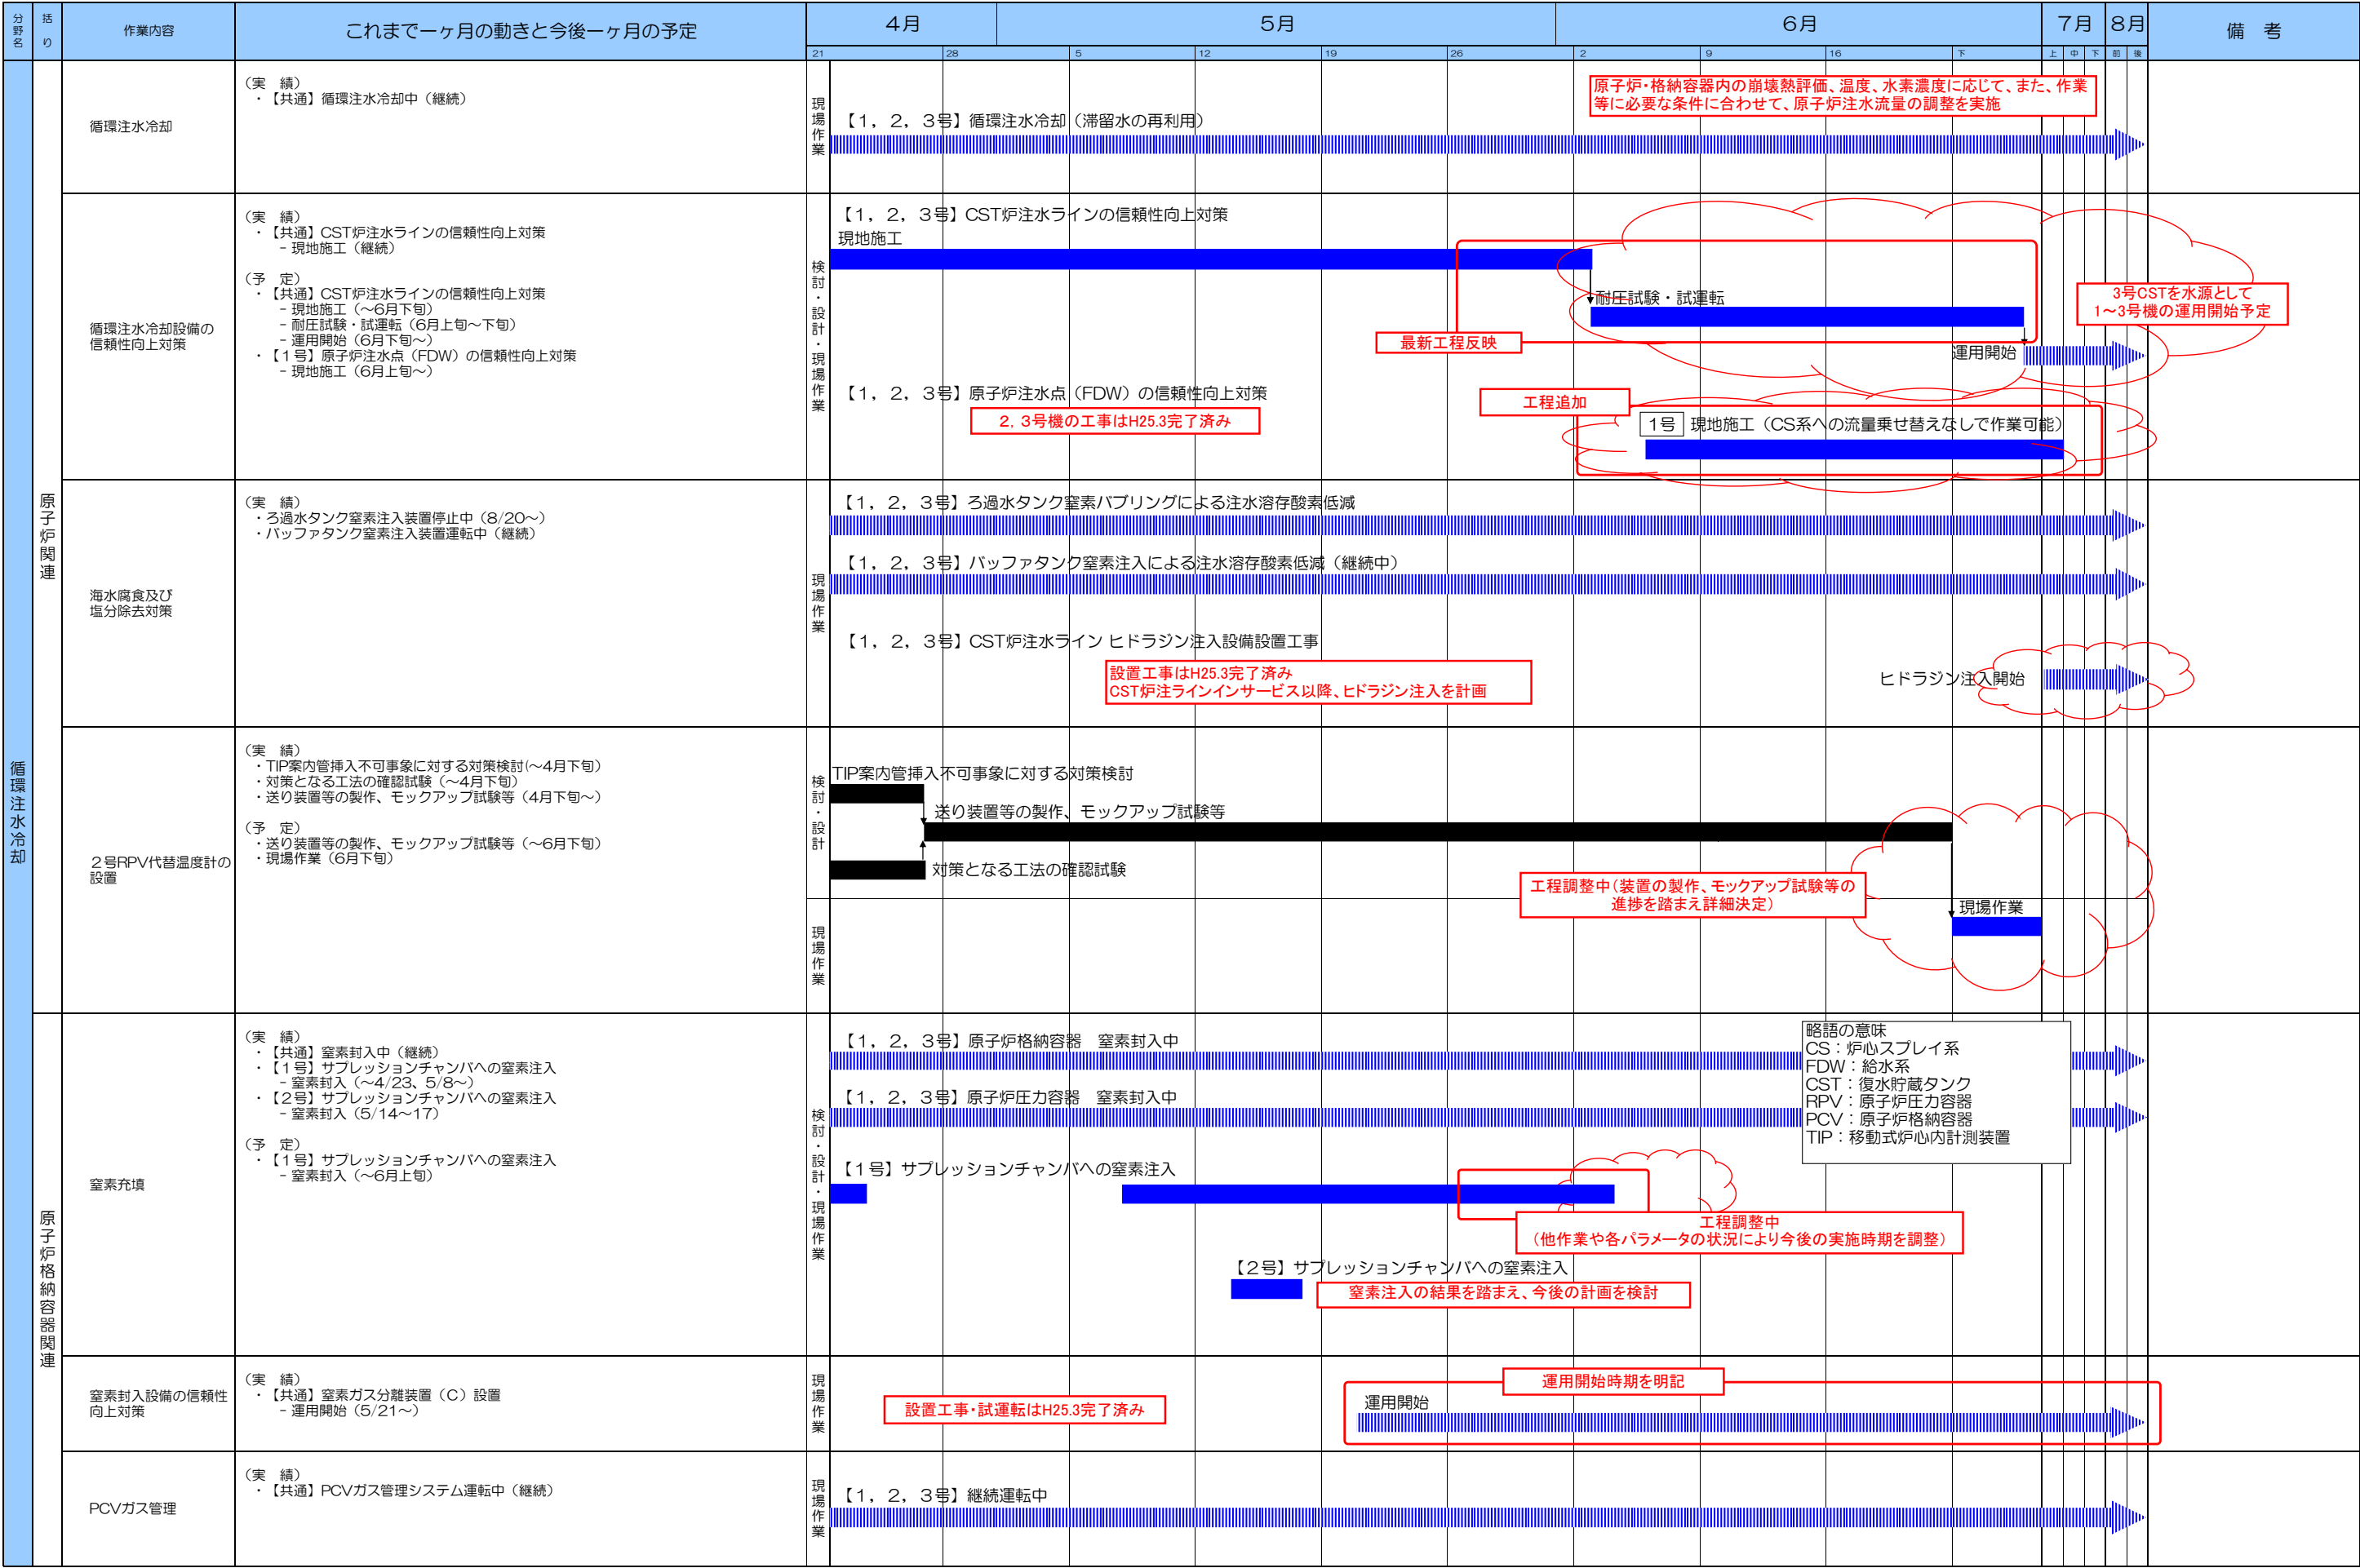

循環注水冷却スケジュール

分野名	活 り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	4月		5月					6月				7月	8月	備 考	
				21	28	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下		前
原子炉格納容器関連		PCV内部調査	(実 績) ・【2号】常設監視計器設置 - 再調査実施方針検討・再設計・再制作 (継続) ・【3号】今後のPCV内部調査の実施方針について検討中 (継続) (予 定) ・【2号】常設監視計器設置 - 再調査実施方針検討・再設計・再制作 (～6月下旬) - 再調査・常設監視計器設置 (6月下旬～) ・【3号】今後のPCV内部調査の実施方針について検討中 (継続)	検討・設計・現場作業	【2号】PCV内常設監視計器設置 再調査実施方針検討・再設計・再製作													
					再調査・常設監視計器設置													
					【3号】PCV内部調査 実施方針検討													
循環注水冷却	使用済燃料プール 循環冷却	使用済燃料プール 循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中 (継続)	現場作業	【1, 2, 3, 4号】循環冷却中													
使用済燃料プール関連	使用済燃料プール への注水冷却	使用済燃料プール への注水冷却	(実 績) ・【共通】蒸発量に応じて、内部注水を実施 (継続)	現場作業	【1, 2, 3, 4号】蒸発量に応じて、内部注水を実施													
					【1, 3, 4号】コンクリートポンプ車等の現場配備													
海水腐食及び塩分除去対策 (使用済燃料プール薬注&塩分除去)		海水腐食及び塩分除去対策 (使用済燃料プール薬注&塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中 (継続)	検討・設計・現場作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食													
					【1, 2, 3, 4号】プール水質管理													
