

大阪・関西万博の準備状況及び予算等について

2025年1月23日


経済産業省

会場建設の進捗 (2024年12月20日時点)

(2024年10月17日時点)



(2024年12月20日時点)

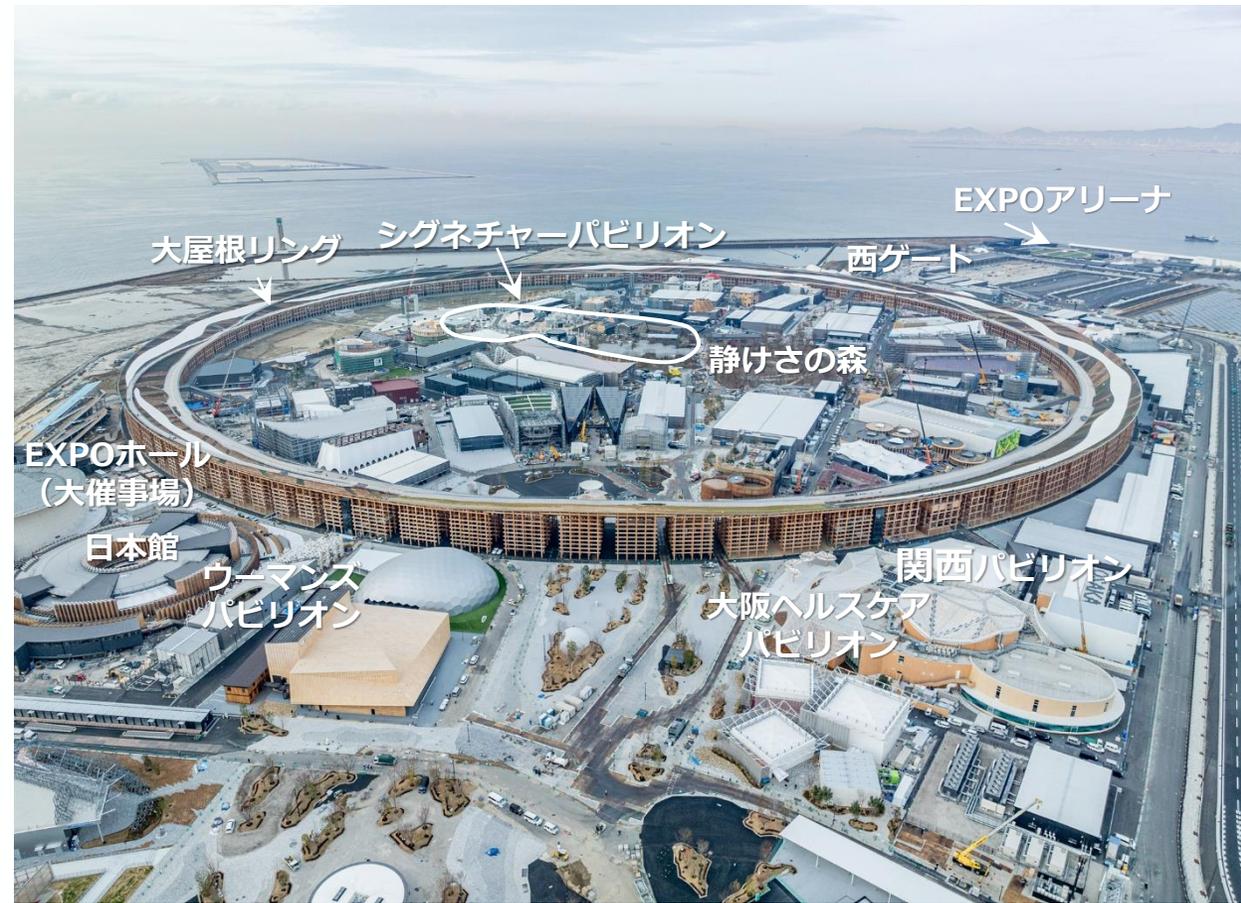

(写真提供：公益社団法人2025年国際博覧会協会、株式会社大林組 撮影：株式会社伸和)

1/13～抽選予約の開始：現時点で予約可能または今後予約開始となるパビリオン・イベント例


●シグネチャーパビリオン（全8パビリオン）



●海外パビリオン（15パビリオン）



●国内パビリオン（16パビリオン）

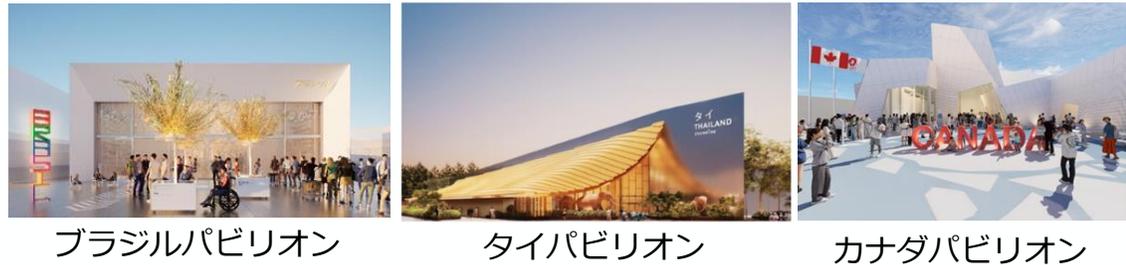

●イベント（11イベント）



QuizKnock(8/24)

※今後、予約制度に参加するパビリオンやイベントについては順次追加予定



大阪・関西万博 販売チケット一覧

- 従来のWEBチケットに加え、2024年10月13日より旅行代理店やコンビニの紙チケットを発売開始。
- 協会HPやチケットサイト等で紙チケットの買い方をわかりやすく説明するとともに、コンビニ・旅行代理店へポスターやサイネージ、POP等を掲示し、チケットが販売中であることをPRしていく。

	WEBチケット (スマホ・PC等)	紙チケット	
		旅行代理店店舗カウンター	コンビニ端末 (セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート)
万博ID登録	必須	任意	任意
来場日時予約	必須	購入時に代理店が代行	不要 ※万博ID登録をすれば可能 ※購入時に日時予約も可能
入場	QRコードでそのまま入場		会場ゲート前引換所で引き換え
主な購入者層	・ネットに慣れている層 ・パビリオン、イベントなどを確実に予約したい層	・宿泊、交通など必要な遠距離層 ・人にたくさんプレゼントしたい層	・ネットに不慣れな層 ・当日など急に来場する主に近距離層

※来場日時予約なしの場合、①11時以前、および、②混雑日（GW、お盆、閉幕直前など）の来場は不可

開催に向けた準備（IPMの開催）

- 万博の開催に先立って各国・地域、国際機関の国際博覧会責任者に対して情報提供・進捗共有を行う**IPM（国際企画会議/国際参加者会議）**を博覧会協会において順次開催しており、これまで、22年10月（全体）、23年6月（途上国対象）、23年11月、2024年6月に開催してきた。
- **今回、2025年1月15～16日に姫路にて国際参加者会議（IPM）を開催。**約160か国・地域、国際機関から約600名が参加した。万博準備の中心が建設から**イベント、運営、広報・機運醸成**へと大きくシフトし、**各公式参加者へより詳細な説明が必要な分野について、具体的かつ実践的な情報提供・意見交換を行った。**

【参加者代表集合写真】



【開会挨拶・記者会見の様子】



十倉会長 開会挨拶



羽田政府代表 開会挨拶



ケルケンツェス事務局長 開会挨拶



共同記者会見の様子

総理名誉会長就任（2025年1月17日）

- 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会から石破茂内閣総理大臣を2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の名誉会長に推戴申し上げたい旨の願い出があり、1月17日付けをもって就任。

（ご参考）

- 1970年日本万国博覧会（1970年3/15～9/13）
1969年12月 5日 佐藤 榮作内閣総理大臣名誉会長御就任
- 1975年沖縄国際海洋博覧会（1975年7/20～翌年1/18）
1975年 6月20日 三木 武夫内閣総理大臣名誉会長御就任
- 1985年国際科学技術博覧会（1985年3/17～9/16）
1985年 2月17日 中曽根 康弘内閣総理大臣名誉会長御就任
- 1990年国際花と緑の博覧会（1990年4/1～9/30）
1988年11月 1日 竹下 登内閣総理大臣名誉会長御就任
1989年 6月 3日 宇野 宗佑内閣総理大臣名誉会長御就任
1989年 8月10日 海部 俊樹内閣総理大臣名誉会長御就任
- 2005年日本国際博覧会（2005年3/25～9/25）
2004年 9月25日 小泉 純一郎内閣総理大臣名誉会長御就任

令和6年度補正予算及び令和7年度予算案の施策の概要

会場整備に関する施策（経産省）

【R6補正：約136億円、R7予算案：なし】

＜総額見通し：最大2350億円（国、府・市、民間で1／3ずつ負担）。令和6年度当初予算までに631億円措置＞

- ・ 会場建設費は最大2350億円。国はうち1／3（最大783億円）を負担。博覧会協会の支出タイミングに間に合わせる形で計上してきており、令和6年度当初予算までに累計631億円を計上。

日本政府館の出展のための費用（経産省）

【R6補正：約62億円、R7予算案：6億円】

＜総額見通し：最大360億円。令和6年度当初予算までに281億円措置＞

- ・ 日本政府の出展の展示・運営・保守運用・解体に要する費用。

途上国等の出展支援のための費用（経産省・外務省）

【R6補正：約64億円、R7予算案：31億円】

＜総額見通し：約240億円。令和6年度当初予算までに101億円措置＞

- ・ 主催国としてBIE（国際博覧会事務局）に対し約束した、途上国の出展支援等に要する費用。

会場内の安全確保に万全を期するための費用（経産省）

【R6補正：約249億円、R7予算案：0.1億円】

＜総額見通し：約255億円。令和6年度当初予算までに既に6億円措置済＞

- ・ 来場者の安全確保は、万博成功に向けて最も基本的かつ重要な前提。
- ・ 近年の警備事案や隣国の雑踏事故を踏まえ、会場内の安全確保に万全を期するために必要な費用を措置。

全国的な機運醸成等に要する費用

【R6補正：約29億円、R7予算案：約1億円】

＜総額見通し：約69億円（令和6年度補正予算までの措置額）＋今後の費用＞

- ・ 国内外メディア等を活用した情報発信や万博参加国と日本の自治体との国際交流の促進等の取組を実施（内閣官房万博事務局）。
- ・ 各省（文科省、農水省、環境省、厚労省）が万博で行う催事等の実施準備等

※上記以外のR7予算案の施策は、今後とりまとめ予定

国際博覧会事業

商務・サービスグループ
博覧会推進室

令和6年度補正予算額 511億円

事業の内容

事業目的

- ・万博の準備・運営を確実に実施することにより、「2025年に開催される国際博覧会（大阪・関西万博）の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針について」（令和2年12月21日閣議決定）に記載されている「人類における変化の意義への理解を助け、世界が直面する難題解決への針路」を示し、経済の活性化やSDGsの達成に向けた理解の促進に貢献する。
- ・日本政府館は、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」をホスト国としてプレゼンテーションする拠点であり、日本文化の根底にある「循環」の考え方をバイオガスパラントを用いたエネルギーの供給といった様々な形で表現することで、「炭素中立型の経済社会」や「循環型社会」といった未来社会の実現に向けて、来館者等の行動変容を促していく。

事業概要

- (1)大阪・関西万博安全確保事業
会場内の安全確保のため民間警備会社による警備等を行う。
- (2)大阪・関西万博日本政府出展事業
日本政府としての「循環」に関する出展やその運営にかかる準備、出展物にかかる維持管理等を行う。
- (3)大阪・関西万博途上国支援事業
途上国が大阪・関西万博に参加する為の支援を行う。
- (4)大阪・関西万博会場整備事業
会場の整備や解体を行う。

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

(1)大阪・関西万博安全確保事業



(2)大阪・関西万博日本政府出展事業



(3)大阪・関西万博途上国支援事業



(4)大阪・関西万博会場整備事業



成果目標

令和7年度に開催される大阪・関西万博において、会場内の安全を確保する。日本政府としての出展により、SDGsの達成に向けた理解の促進や、エネルギー循環等を通じた循環型社会の実現に向けた意識醸成等に貢献する。会場内の建設物の保守運用、閉幕後には解体工事を着実に実施する。途上国含めた多くの国の参加を実現する。

国際博覧会事業

令和7年度予算案額 26億円（24億円）

事業目的・概要

事業目的

・万博の準備・運営を確実に実施することにより、「2025年に開催される国際博覧会（大阪・関西万博）の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針について」（令和2年12月21日閣議決定）に記載されている「人類における変化の意義への理解を助け、世界が直面する難題解決への針路」を示し、経済の活性化やSDGsの達成に向けた理解の促進に貢献する。

事業概要

(1)大阪・関西万博日本館政府出展事業

日本政府館の会期後の解体工事を行う。

(2)大阪・関西万博途上国支援事業

途上国が大阪・関西万博に参加する為の支援を行う。

(3)大阪・関西万博安全確保事業

会場内の安全確保のため民間警備会社による警備等を行う。

(4)大阪・関西万博政府開催準備事業

BIE事務局の来日の際の受け入れに関わる業務を行う。

(5)次期海外博に係る基本計画策定業務

今後開催予定の国際博覧会へのわが国の参加・出展に向けた基本計画策定業務等を行う。

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

(1)大阪・関西万博日本館政府出展事業



(2)大阪・関西万博途上国支援事業



(3)大阪・関西万博安全確保事業



(4)大阪・関西万博政府開催準備事業



(5)次期海外博に係る事前調査及び基本計画策定業務



成果目標・事業期間

令和7年度に開催される大阪・関西万博において、閉幕後に日本館の解体工事を着実に実施する。途上国含めた多くの国の参加を実現する。会場内の安全を確保する。2027年に開催されるセルビア博に日本政府として出展を行う。

建設費の執行状況について（2024年12月末）①※速報値

執行項目	主な内容	23年9月末	23年11月末	24年2月末	24年3月末	4月15日	4月末	5月15日	5月末		6月15日	6月末		
									進捗率		進捗率		進捗率	
大工区		840	841	920	1,010	1,010	1,014	1,014	1,036	64%	1,058	1,061	69%	
PW北東工区	・大屋根（リング） ・パビリオンB、C ・管理施設、ゲート施設等の整備	229	229	270	299	299	299	299	317	56%	317	319	63%	
PW南東工区		228	229	229	253	253	253	253	253	72%	253	254	77%	
PW西工区		259	259	264	300	300	300	300	300	68%	310	310	73%	
GW工区		104	104	137	138	138	142	142	142	57%	142	142	62%	
静けさの森工区等（付帯設備含む）		20	20	20	20	20	20	20	20	-	24	24	-	
会場付帯施設整備事業 （各工区整備以外）														
施設維持補修												12	12	
主要施設		212	230	259	270	271	271	271	271	271	271	271	273	
大催事場	・各施設整備	78	78	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
小催事場		43	43	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
迎賓館		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
テーマ館		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
若手建築家施設		4	22	34	45	46	46	46	46	46	46	46	48	
土木工区	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電気管路、通信管路	99	99	105	105	107	107	107	107	107	108	108	108	
インフラ設備 （電気・熱供給、通信、警備設備 等）	・電気（引込含）・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備	201	203	204	226	226	226	226	226	226	232	232	232	
交通施設	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備	60	83	88	94	131	132	136	140	140	140	140	140	
環境評価、委託関係	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務	52	52	52	52	57	58	58	58	58	58	58	58	
合計		1,464	1,508	1,628	1,757	1,802	1,808	1,812	1,838	1,867	1,867	1,872	1,872	
執行率		64.2%	66.1%	71.3%	77.0%	79.0%	79.2%	79.4%	80.5%	81.8%	81.8%	82.1%	82.1%	

⇒次頁に続く

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

※一部、内訳端数調整有

※単位：億円

※進捗率は「工事費用（出来高）／総工事費用」で算出。

※執行率：87.5%（1,997億円/2,282億円）

建設費の執行状況について（2024年12月末）②※速報値

（単位：億円）

執行項目	確定値												速報値			確定値			速報値			今後の予定		総合計 ※予備 費執行 62億円 込		
	7月15日	7月末		8月15日		8月末		9月15日		9月末		10月15日		10月末		11月15日		11月末		12月15日		12月末			小計	主な内容
	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率	進捗	進捗率			
大工区	1,062	1,068	65%	1,095	1,096	70%	1,106	1,110	75%	1,112	1,141	80%	1,142	1,160	86%	1,164	1,168	91%	210							
PW北東工区	319	319	70%	319	319	76%	329	329	81%	330	330	85%	331	331	92%	332	332	96%								
PW南東工区	254	254	69%	275	275	72%	275	276	74%	276	277	80%	277	277	83%	277	278	86%								
PW西工区	310	310	72%	310	310	79%	310	310	82%	310	310	91%	310	322	95%	322	322	98%								
GW工区	142	142	51%	142	142	54%	142	145	65%	145	165	66%	165	165	75%	165	165	84%								
静けさの森工区等（附帯設備含む）	24	24	-	28	29	-	29	29	-	29	30	-	30	30	-	30	30	-								
会場附帯施設整備事業 （各工区整備以外）	1	3	-	5	5	-	5	5	-	5	13	-	13	19	-	22	25	-								
施設維持補修	12	16	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-								
会場基盤撤去工事			-			-			-			-			-		1	-								
主要施設	273	277		277	277		277	277		277	277		277	278		278	279		16							
大催事場	91	91		91	91		91	91		91	91		91	91		91	91									
小催事場	47	47		47	47		47	47		47	47		47	47		47	47									
迎賓館	38	38		38	38		38	38		38	38		38	38		38	38	39								
テーマ館	49	53		53	53		53	53		53	53		53	53		53	53									
若手建築家施設	48	48		48	48		48	48		48	48		48	49		49	49									
土木工区	108	108		108	108		110	110		110	110		110	110		110	110		▲1							
インフラ設備 （電気・熱供給、通信、警備設備 等）	232	232		232	233		236	237		237	237		237	237		237	237	239	18							
交通施設	140	142		147	148		148	148		148	152		154	154		157	170		9							
環境評価、委託関係	58	58		58	58		58	58		58	58		58	58		58	58		6							
合計	1,873	1,885		1,917	1,920		1,935	1,940		1,942	1,976		1,979	1,997		2,004	2,024		258							
執行率	82.1%	81.3%		84.0%	84.2%		84.8%	84.9%		85.1%	86.6%		86.7%	87.5%		87.8%	88.7%									

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

※一部、内訳端数調整有

※単位：億円

※進捗率は「工事費用（出来高）／総工事費用」で算出。

※執行率：88.7%（2,024億円/2,282億円）

予備費130億円

運営費の執行状況について（2024年12月末） ※速報値

単位：億円

執行項目	主な内容	契約済・支払済															今後の予定		総合計
		24年1月末	3月末	4月末	6月末	7月末	8月15日	8月末	9月15日	9月末	10月15日	10月末	11月15日	11月末	12月15日	12月末	小計	主な内容	
会場管理費		147	183	192	223	227	248	250	250	278	278	281	282	298	300	307	212	来場者サービス実施計画策定・実施運営業務追加業務（関係者ゲート運営、巡回業務）、ICT-PF 運用委託強化（夜間保守対応等）、感染症対策、防災関連資機材調達、万博IDユーザー対応業務委託 ほか	519
会場運営管理・来客対応費	カーボンニュートラルガス関連業務、国旗製作及び運営業務、EXPOサロンの内装工事及び運営管理業務に係る企画提案公募実施（運営費分）、警備スタッフ用通信端末の配備及びサポート保守等業務 ほか	56	59	64	93	96	116	117	117	135	135	138	139	154	156	156			
ICT関連費	関係者向けポータルサイト事務局業務、情報通信インフラ整備支援業務（SES）、バーチャル万博コンテンツ制作・運営管理業務、万博ICT-PFサービス提供業務委託（変更契約） ほか	91	124	128	130	131	132	133	133	143	143	143	143	144	144	151	42	主催者催事に係る実施計画策定及び管理運営業務（変更）、催事開催にかかる制作協力業務、催事施設備品調達、プロジェクションマッピング運営等業務、FLV交流会イベント実施運営、事業運営に係る人員の派遣契約、タイプC共同館（4館）運営管理業務 ほか	155
事業運営費		65	65	72	74	78	78	78	78	79	83	83	92	110	110	113			
共創事業費	サステナドーム実施制作・運営管理業務、CDCアドバイザー会議に係るアドバイザーへの謝礼金 ほか	15	15	15	16	17	17	17	17	18	18	18	18	21	21	21	29	入場チケット販売促進等のための広報・プロモーション業務（変更）、メディアプラン業務契約（変更）、入場券プロモーション事業（OOH）、公式記録制作等業務 ほか	95
テーマ事業費	—	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
催事費	開会式・主催者催事に係る実施計画制作業務、イベント管理システム構築・運用保守業務、OWOP管理運営業務に係る変更契約 ほか	5	5	11	11	14	14	14	14	14	18	18	27	38	38	41			
住宅・公式参加国関係費	OSSに係る執務室事務所用什器調達、賃貸借契約（守口宿舎）賃料 ほか	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11			
営業関係費		22	27	28	33	37	37	47	47	48	49	49	49	56	56	66	46	協会管理ターミナル試験運行業務・会場外輸送に係る運営実施計画及び運営管理業務（変更）、交通ターミナル等における警備業務（変更）、交通ターミナル等に係る光熱水費 ほか	184
広報宣伝費	メディア用ネットワーク構築・運用・保守業務、香港ブックフェア運営業務、会場内でのクイズラリーおよび、事前から事後学習まで一貫した学習教材作成事業 ほか	5	7	8	11	12	12	12	12	13	13	13	13	20	20	21			
入場券関係費	メディアリレーションコーディネーター業務、【変更契約】万博メディアプラン業務契約、【変更契約】入場チケット販売促進等のための広報・プロモーション業務委託 ほか	17	20	20	22	25	25	35	35	35	36	36	36	36	36	45			
輸送管理費	夢洲第1交通ターミナル運行情報サイネージ等管理システムサービス提供業務（変更契約）、輸送対策協議会開催、夢洲乗降用仮設浮橋設置および撤去並びに浮橋等運用業務（賃貸借契約） ほか	78	118	120	123	125	125	125	125	125	125	125	126	130	132	138			
管理関係費	職員手当・旅費、オフィス賃料 ほか	101	114	120	147	150	150	151	152	153	153	154	154	154	157	159	48	開幕レセプション運営業務、職員手当・旅費、オフィス賃料 ほか	207
合計		413	507	532	600	617	638	651	652	683	688	692	703	748	755	783			
執行率		35.6%	43.7%	45.9%	51.7%	53.2%	55.0%	56.1%	56.2%	58.9%	59.3%	59.7%	60.6%	64.5%	65.1%	67.5%			1,160

※1 今後の予定の内訳については現時点での計画額であり、今後執行過程において変わらうもの

※2 一部、内訳端数調整有（億円単位で四捨五入）

※3 契約案件は契約締結日ベース、その他は支払日ベースで計上
