

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

- ・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足

②1～4号機タンク貯蔵量

- ・淡水化装置による処理により、RO処理水(淡水)及び濃縮塩水の貯蔵量は変動あり
- ・蒸発濃縮装置は全台停止中

③5、6号機滞留水貯蔵量

- ・構内散水によりFエリアタンク貯蔵量は変動あり

④廃棄物発生量

- ・除染装置停止中のため、廃スラッジ貯蔵量は変動なし

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量


施設	貯蔵量	T/B建屋内水位
1号機	約4,620m ³	※7
2号機	約9,600m ³	T.P.397
3号機	約11,560m ³	T.P.226
4号機	約10,680m ³	T.P.403
合計	約36,460m ³	

貯蔵施設	貯蔵量	水位
プロセス主建屋	約15,650m ³	T.P.3,075
高温焼却炉建屋	約3,780m ³	T.P.877
合計	約19,430m ³	

(合計):+2210[m³/4週](合計):+1990[m³/週]


④廃棄物発生量

廃スラッジ




保管量:597/700[m³]※3

使用済ベッセル





保管量:3904/6368体 ※1

濃縮廃液



保管量:約9319/10700[m³] ※3
水位計0%以上の保管量:9219[m³]
タンク底部～水位計0%の保管量(DS):約100[m³]

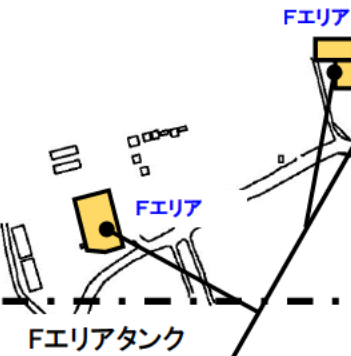


水量:15501/16300[m³] ※2,3

-199[m³/4週]/±0[m³/4週]
+11[m³/週]/±0[m³/週]

③5、6号機タンク貯蔵量

タンク総容量




水量:約1069230/1114900[m³] ※2,3

+2121[m³/4週]/-1000[m³/4週]
+1019[m³/週]/±0[m³/週]

タンク貯蔵量合計(②+③)

- ※1 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル及び多核種除去設備の保管容器、処理カラム及びモバイル式処理装置使用済ベッセルを含む
- ※2 装置移動中につき水位が安定しないため参考扱い
- ※3 貯蔵容量は運用上の上限を示す(タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てて表記)
- ※4 多核種除去設備等(ホット試験中)の処理済水を貯蔵するが、タンクの運用状況に応じて淡水や濃縮塩水を貯蔵
- ※5 ウェルポイント・地下水ドレン(約100m³/週)、その他移送量(約140m³/週)の合計約240m³/週を含む(端数処理上、各移送量の総和と異なる場合がある)
- ※6 放射性物質濃度が高い多核種除去設備B系出口水を含む
- ※7 1号機T/B建屋はすでに水抜きが完了しているため、水位を「-」表記する。



水量:約7256/12600[m³] ※2,3

水位計0%以上の水量:6356[m³]
タンク底部～水位計0%の水量(DS):約900[m³]

-1690[m³/4週]/±0[m³/4週]
-684[m³/週]/±0[m³/週]

②-a RO処理水(淡水)

水量:約700/5200[m³] ※2,3

水位計0%以上の水量:約400[m³]
タンク底部～水位計0%の水量(DS):約300[m³]

±0[m³/4週]/±0[m³/4週]
±0[m³/週]/±0[m³/週]

②-b濃縮塩水(残水)

水量:約853708/877800[m³] ※2,3,4

水位計0%以上の水量:852108[m³]
タンク底部～水位計0%の水量(DS):約1600[m³]

+912[m³/4週]/±0[m³/4週]
+1771[m³/週]/±0[m³/週]

②-c 処理水
(多核種除去設備等処理済水)

水量:約192065/203000[m³] ※2,3

水位計0%以上の水量:187965[m³]
タンク底部～水位計0%の水量(DS):約4100[m³]

+3098[m³/4週]/-1000[m³/4週]
-79[m³/週]/±0[m³/週]

②-d Sr処理水等


水量:約1053729/1098600[m³] ※3,4

水位計0%以上の水量:1046829[m³]
タンク底部～水位計0%の水量(DS):約6900[m³]

+2320[m³/4週]/-1000[m³/4週]
+1008[m³/週]/±0[m³/週]

タンク堰内水の一時的貯留量(*2月26日時点の値を記載)
・ノッチタンク群 約100(±0[m³])/約600[m³]

1～4号機タンク総容量




水量:約1112048[m³]

+5698[m³/4週] ※5
+4098[m³/週]

建屋内貯蔵量

+ 1～4号機タンク貯蔵量
(①+②)

滞留水の貯蔵状況の推移

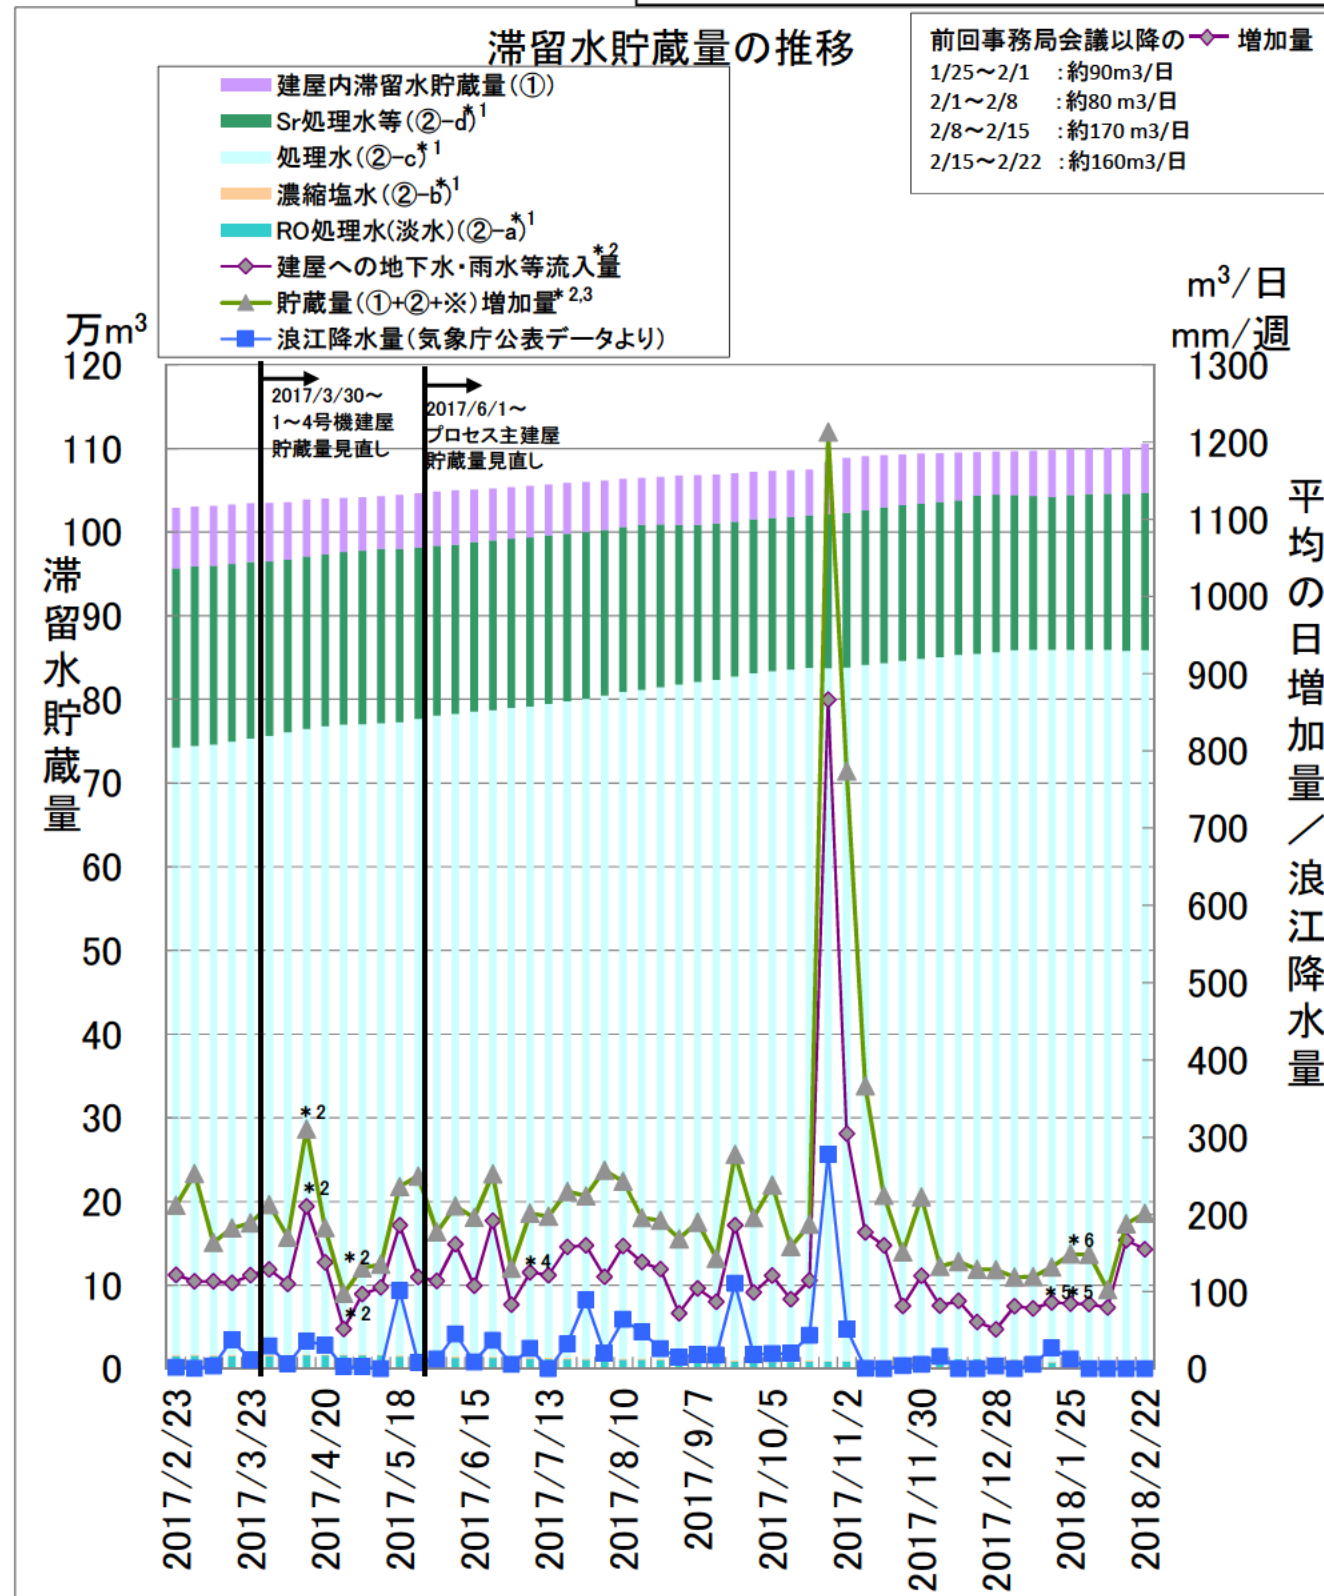

①: 建屋内滞留水貯蔵量(1～4号機、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、廃液供給タンク、SPT(B))

②: 1～4号機タンク貯蔵量

(〔②-aRO処理水(淡水)〕+〔②-b濃縮塩水〕+〔②-c処理水〕+〔②-dSr処理水等〕)

※: タンク底部から水位計0%までの水量(DS)

*1: 水位計0%以上の水量

*2: 集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な水位に応じた断面積(評価値)の不確かさによるものと推定。

2017/6/1の集計値以降、集中RW建屋の貯蔵量算出に必要な水位に応じた断面積(評価値)を見直し


*3: 貯蔵量増加量の精度向上として、2017/2/9より算出方法を以下の通り見直し。(2018/3/1見直し実施)
〔(建屋への地下水・雨水等流入量)+(その他移送量)+(ALPS薬液注入量)〕

*4: 2017/7/5に実施した調査結果から、1号機T/B未調査エリアの水量が想定水量よりも少ないことが判明したため補正

*5: 残水エリアへ流入した地下水・雨水等流入量を加味して再評価(2018/1/18, 1/25)。

*6: SARRY逆洗水を「貯蔵量増加量」に加味していたことから見直し。

万m³ 建屋内滞留水、濃縮塩水及び処理水、Sr処理水等の推移m³/週

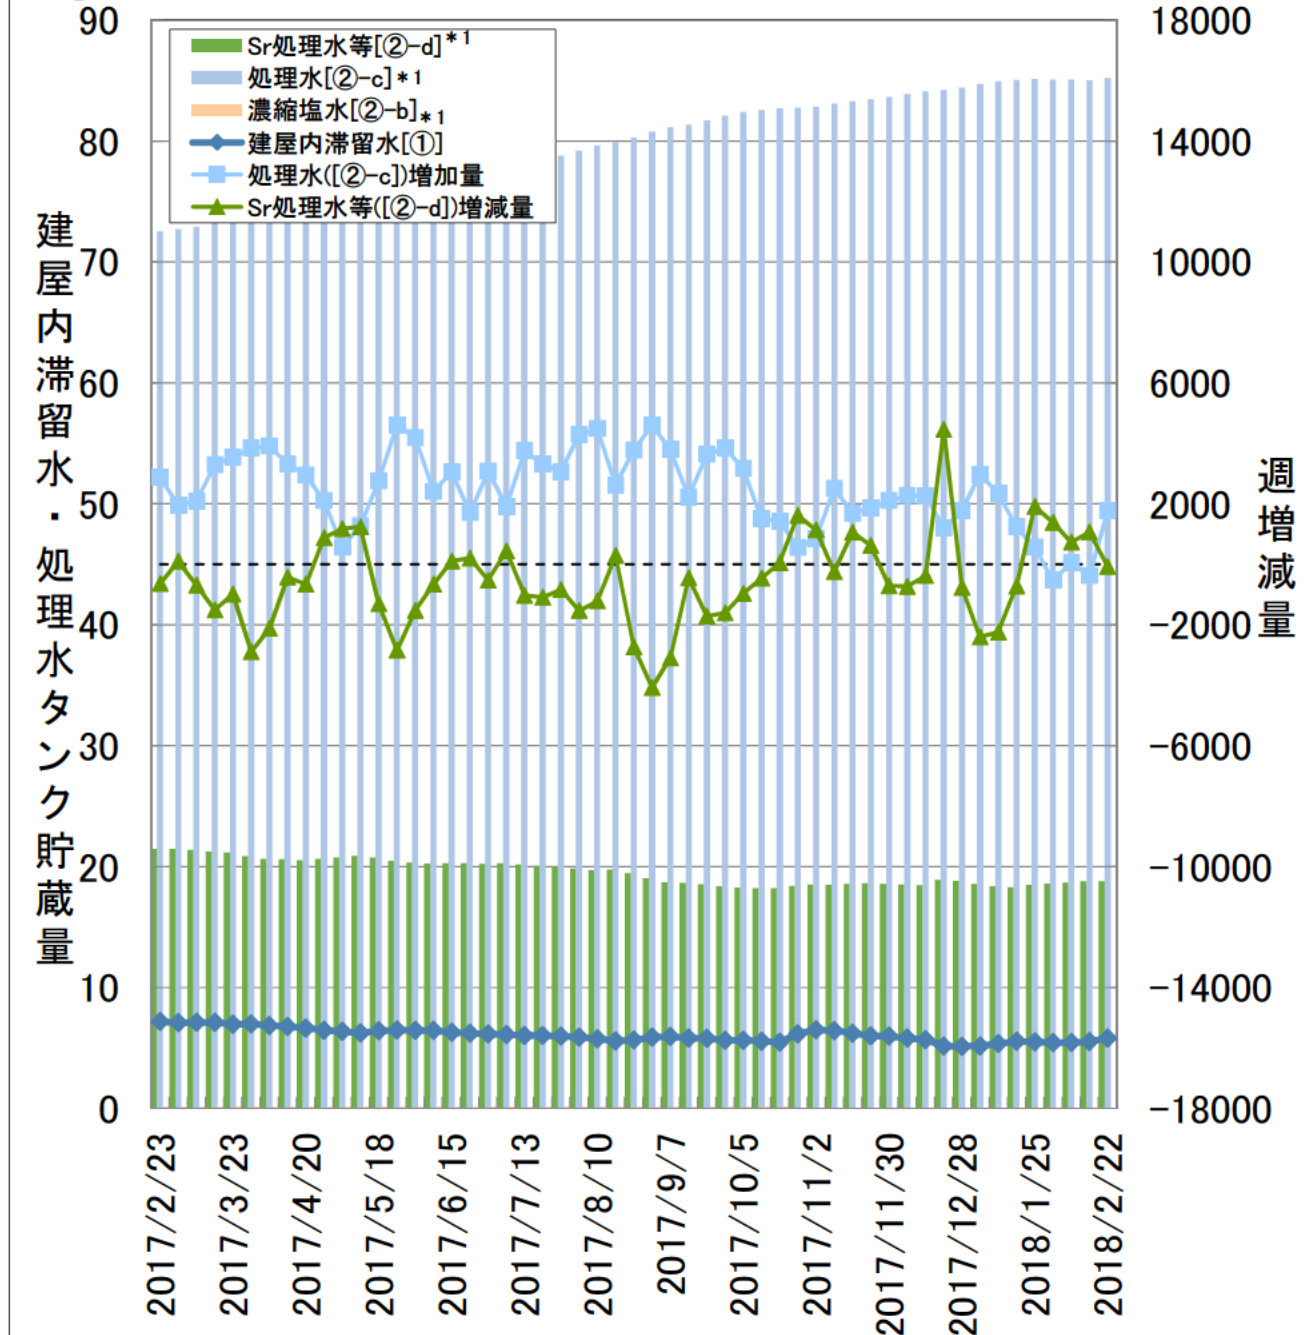

処理水	累積処理水	期間処理水		定格処理量
	[m ³]	[m ³ /週]	[m ³ /日] ^{注1)}	[m ³ /日]
既設多核種除去設備 ^{注2)}	370,365	186	27	750以上
増設多核種除去設備 ^{注2)}	412,188	1,585	226	750以上
高性能多核種除去設備	102,556	0	0	500以上
高性能 検証試験装置	1,128	0	0	50
Sr処理水等	期間処理水		定格処理量	
	[m ³ /週]	[m ³ /日] ^{注1)}	[m ³ /日]	
セシウム吸着装置	823	118	600	
第二セシウム吸着装置			1200	

注1) 週間の平均値

注2) 既設・増設多核種除去設備処理水の一部は、残水があるRO濃縮塩水タンクに移送し、Sr処理水等として貯蔵
