

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

- ①建屋内滞留水水位及び貯蔵量
 - ・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足
- ②1～4号機タンク貯蔵量
 - ・淡水化装置による処理により、RO処理水(淡水)及び濃縮塩水の貯蔵量は変動あり
 - ・蒸発濃縮装置は全台停止中
- ③5、6号機滞留水貯蔵量
 - ・構内散水によりFエリアタンク貯蔵量は変動あり
- ④廃棄物発生量
 - ・除染装置停止中のため、廃スラッジ貯蔵量は変動なし

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

施設	貯蔵量	T/B建屋内水位
1号機	約1,280 m ³	※7
2号機	約3,360 m ³	T.P.-1.286
3号機	約3,550 m ³	T.P.-1.254
4号機	約1,650 m ³	T.P.1.479以下
合計	約9,840 m ³	

(合計):-1140[m3/4週] (合計):-790[m3/週]


貯蔵施設	貯蔵量	水位
プロセス主建屋	約10,430 m ³	T.P.1.199
高温焼却炉建屋	約3,430 m ³	T.P.590
合計	約13,860 m ³	

(合計):+170[m3/4週] (合計):-260[m3/週]


	貯蔵量	貯蔵容量
廃液供給タンク	758 m ³	1,200 m ³
SPT(B)	1,730 m ³	3,100 m ³

(合計):-94[m3/4週] (合計):-223[m3/週]


④廃棄物発生量



保管量:597/700[m3]※3





保管量:4705/6372体※1



保管量:約9345/10300[m3] ※3
水位計0%以上の保管量:9245[m3]
タンク底部～水位計0%の保管量(DS):約100[m3]


- ②-a RO処理水(淡水)
- ②-b 濃縮塩水(残水)
- ②-c 処理水(多核種除去設備等処理水)
- ②-d Sr処理水等
- タンク解体・建設中エリア
- 水処理二次廃棄物(既設)
- 水処理二次廃棄物(追設予定)
- 循環注水ルート(実線:主に使用するルート)
- ろ過水注水ルート

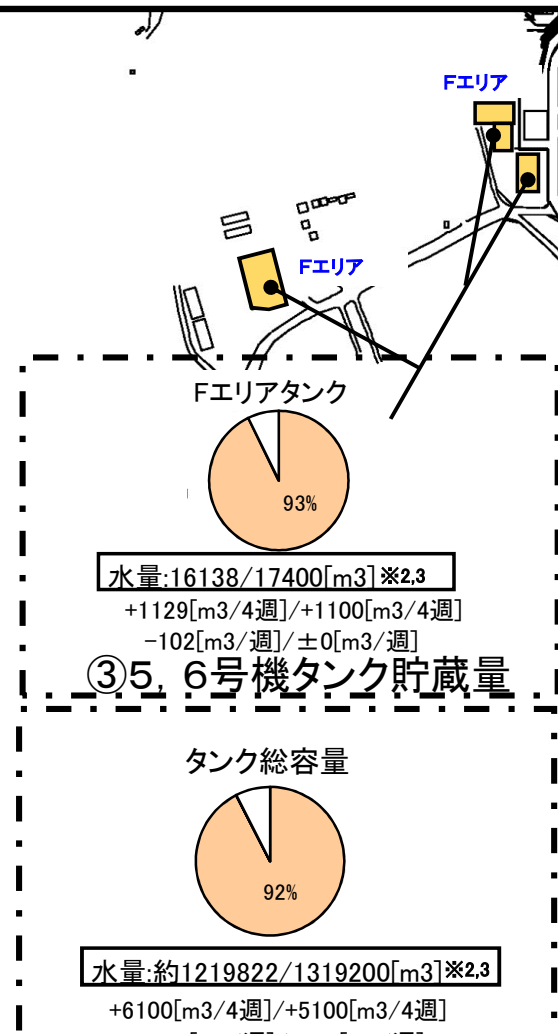

水量:約8864/24600[m3] ※2.3 水位計0%以上の水量:7764[m3] タンク底部～水位計0%の水量(DS):約1100[m3]	水量:約500/2100[m3] ※2.3 水位計0%以上の水量:約400[m3] タンク底部～水位計0%の水量(DS):約100[m3]	水量:約1135808/1166100[m3] ※2.3,4.6 水位計0%以上の水量:1133808[m3] ※8 タンク底部～水位計0%の水量(DS):約2000[m3]	水量:約58512/109000[m3] ※2.3 水位計0%以上の水量:58112[m3] ※8 タンク底部～水位計0%の水量(DS):約400[m3]	水量:約1203684/1301800[m3] ※2.3,4 水位計0%以上の水量:1200084[m3] タンク底部～水位計0%の水量(DS):約3600[m3]
-856[m3/4週]/±0[m3/4週] +258[m3/週]/±0[m3/週]	±0[m3/4週]/±0[m3/4週] ±0[m3/週]/±0[m3/週]	+13012[m3/4週]/+9400[m3/4週] +2957[m3/週]/+200[m3/週]	-7185[m3/4週]/-5400[m3/4週] -1157[m3/週]/+600[m3/週]	+4971[m3/4週]/+4000[m3/4週] +2058[m3/週]/+800[m3/週]
②-a RO処理水(淡水)	②-b 濃縮塩水(残水)	②-c 処理水 (多核種除去設備等処理済水)	②-d Sr処理水等	

②1～4号機タンク貯蔵量

1～4号機タンク総容量





水量:約1229872[m3]

+3907[m3/4週] ※5
+785[m3/週]

建屋内貯蔵量
+
1～4号機タンク貯蔵量
(①+②)

※1 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル及び多核種除去設備の保管容器、処理カラム及びモバイル式処理装置使用済ベッセルを含む
※2 装置稼働中につき水位が安定しないため参考扱い
※3 貯蔵容量は運用上の上限を示す(タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てて表記)
※4 多核種除去設備等(ホット試験中)の処理済水を貯蔵するが、タンクの運用状況に応じて淡水や濃縮塩水を貯蔵
※5 ウェルポイント・地下水ドレン(約70m³/週)、共用プール建屋から高温焼却炉建屋への移送量(約20m³/週)、その他移送量(約220m³/週)、の合計310m³/週を含む
(端数処理上、各移送量の総和と異なる場合がある)
※6 放射性物質濃度が高い多核種除去設備B系出口水を含む
※7 1号機T/Bはすでに水抜きが完了しているため、水位を「-」表記
※8 フランジ型タンクに貯蔵するSr処理水の処理完了(2018/11/17) フランジ型タンクに貯蔵する多核種除去設備等処理済水の移送完了(2019/3/27)。引き続き、残水処理を進める観点から、以後、フランジ型タンクのタンク底部～水位計0%の水量(DS)は水位計0%以上の水量に含める


滞留水の貯蔵状況の推移

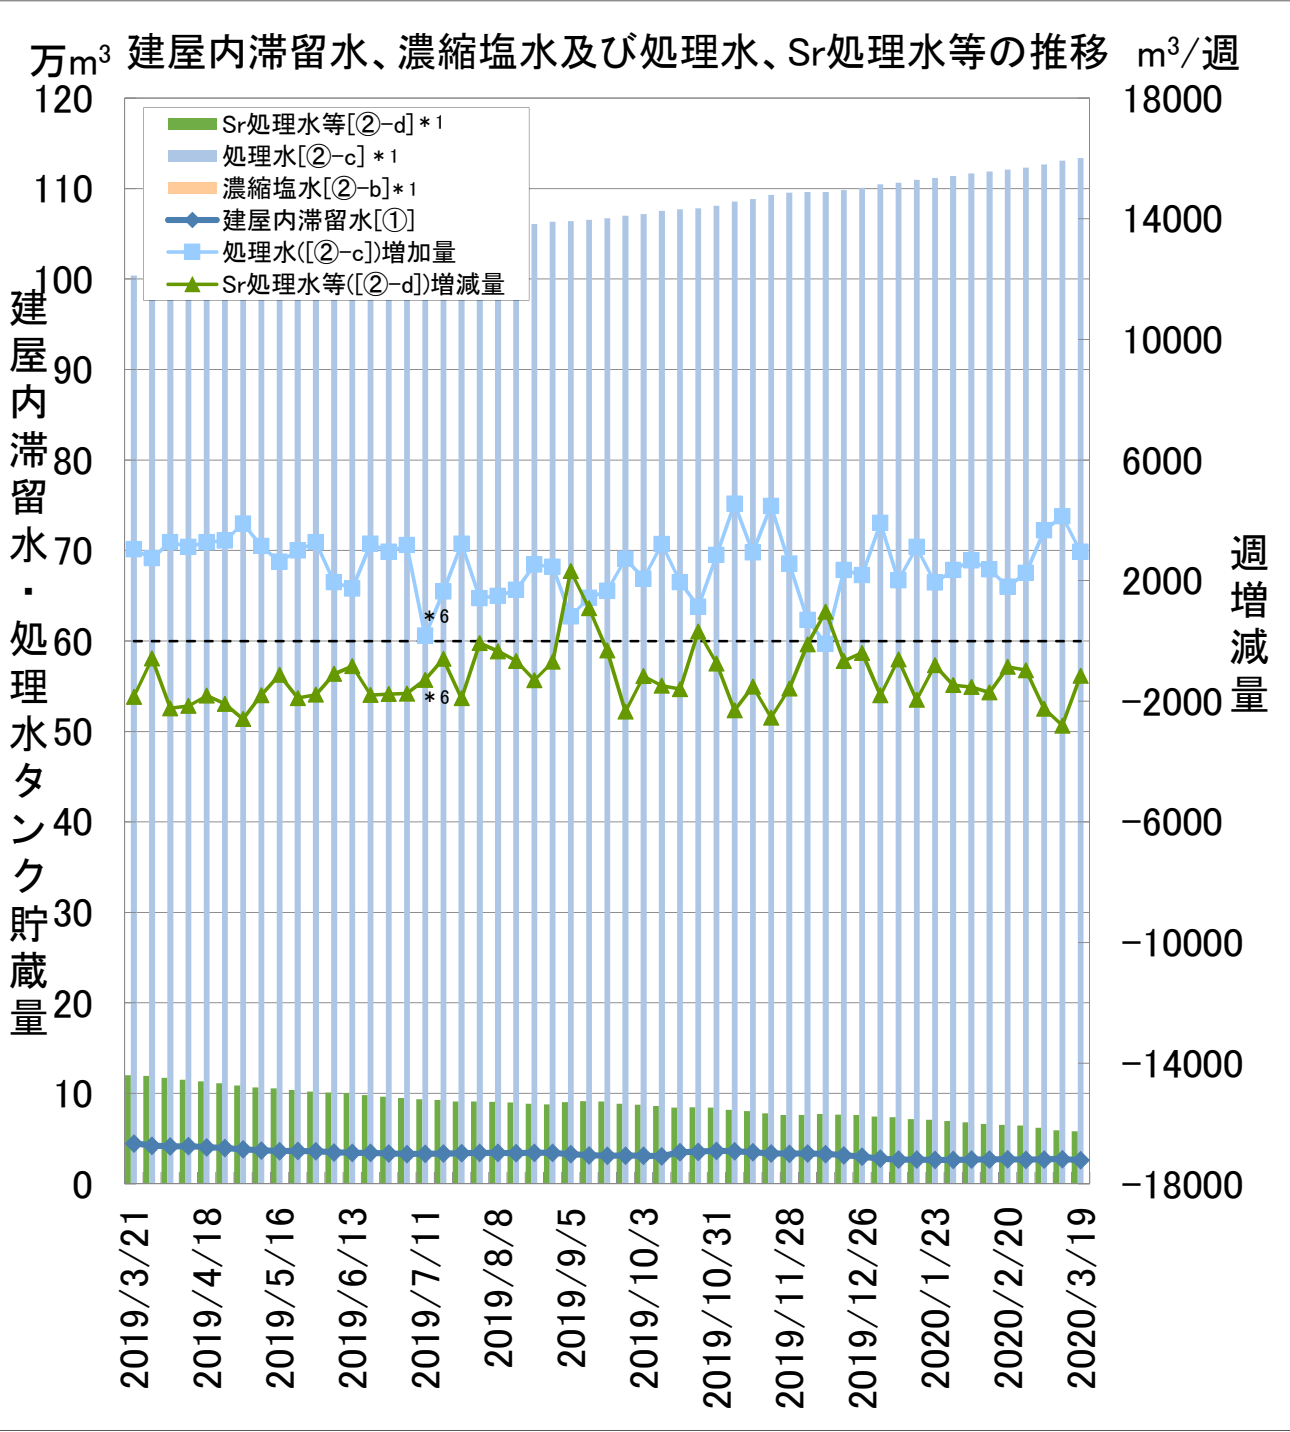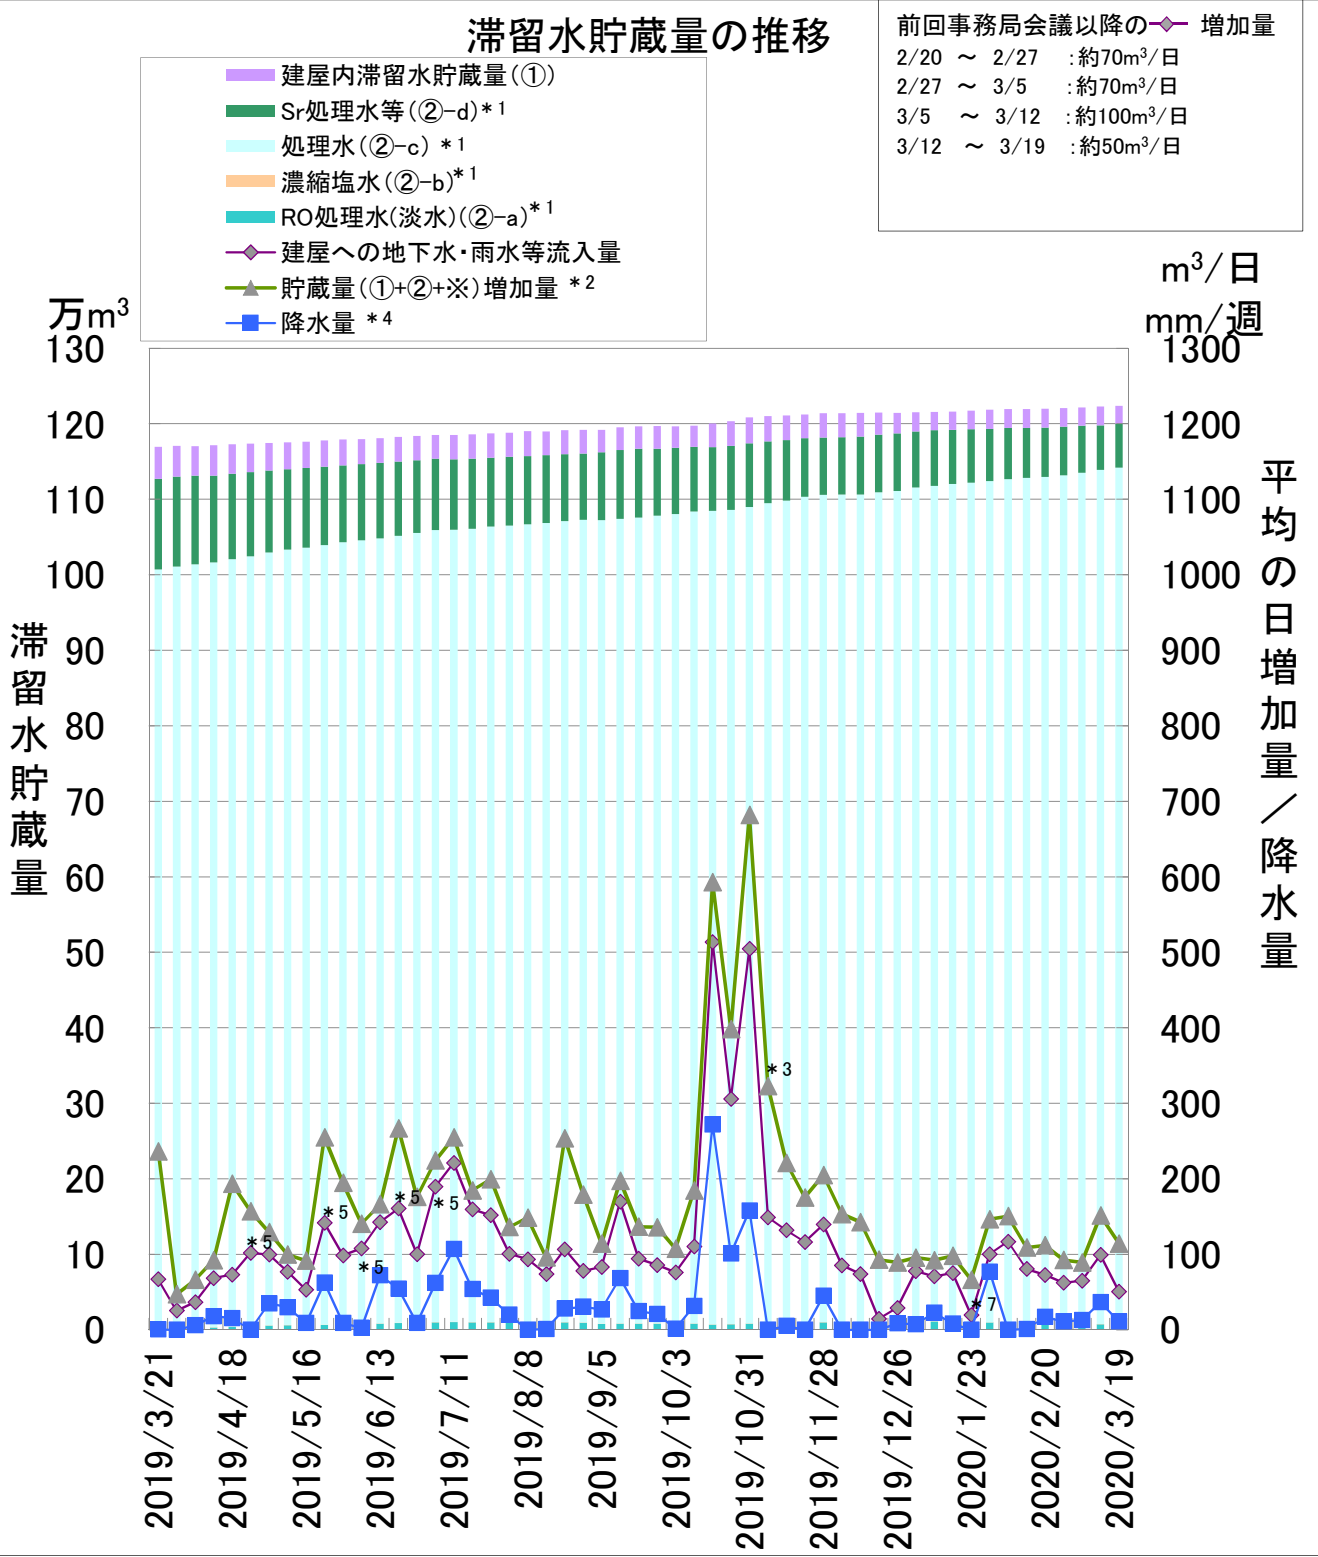

処理水	累積処理水	期間処理水		定格処理量
	[m3]	[m3/週]	[m3/日] ^{注1)}	[m3/日]
既設多核種除去設備 ^{注2)}	431,079	689	98	750以上
増設多核種除去設備 ^{注2)}	633,560	2,268	324	750以上
高性能多核種除去設備	102,556	0	0	500以上
高性能 検証試験装置	1,128	0	0	50
Sr処理水等	期間処理水		定格処理量	
	[m3/週]	[m3/日] ^{注1)}	[m3/日]	
セシウム吸着装置	1,585	226	600	
第二セシウム吸着装置			1200	
第三セシウム吸着装置			600	

注1) 週間の平均値
注2) 既設・増設多核種除去設備処理水の一部は、残水があるRO濃縮塩水タンクに移送し、Sr処理水等として貯蔵

滞留水の貯蔵状況の推移(長期グラフ)

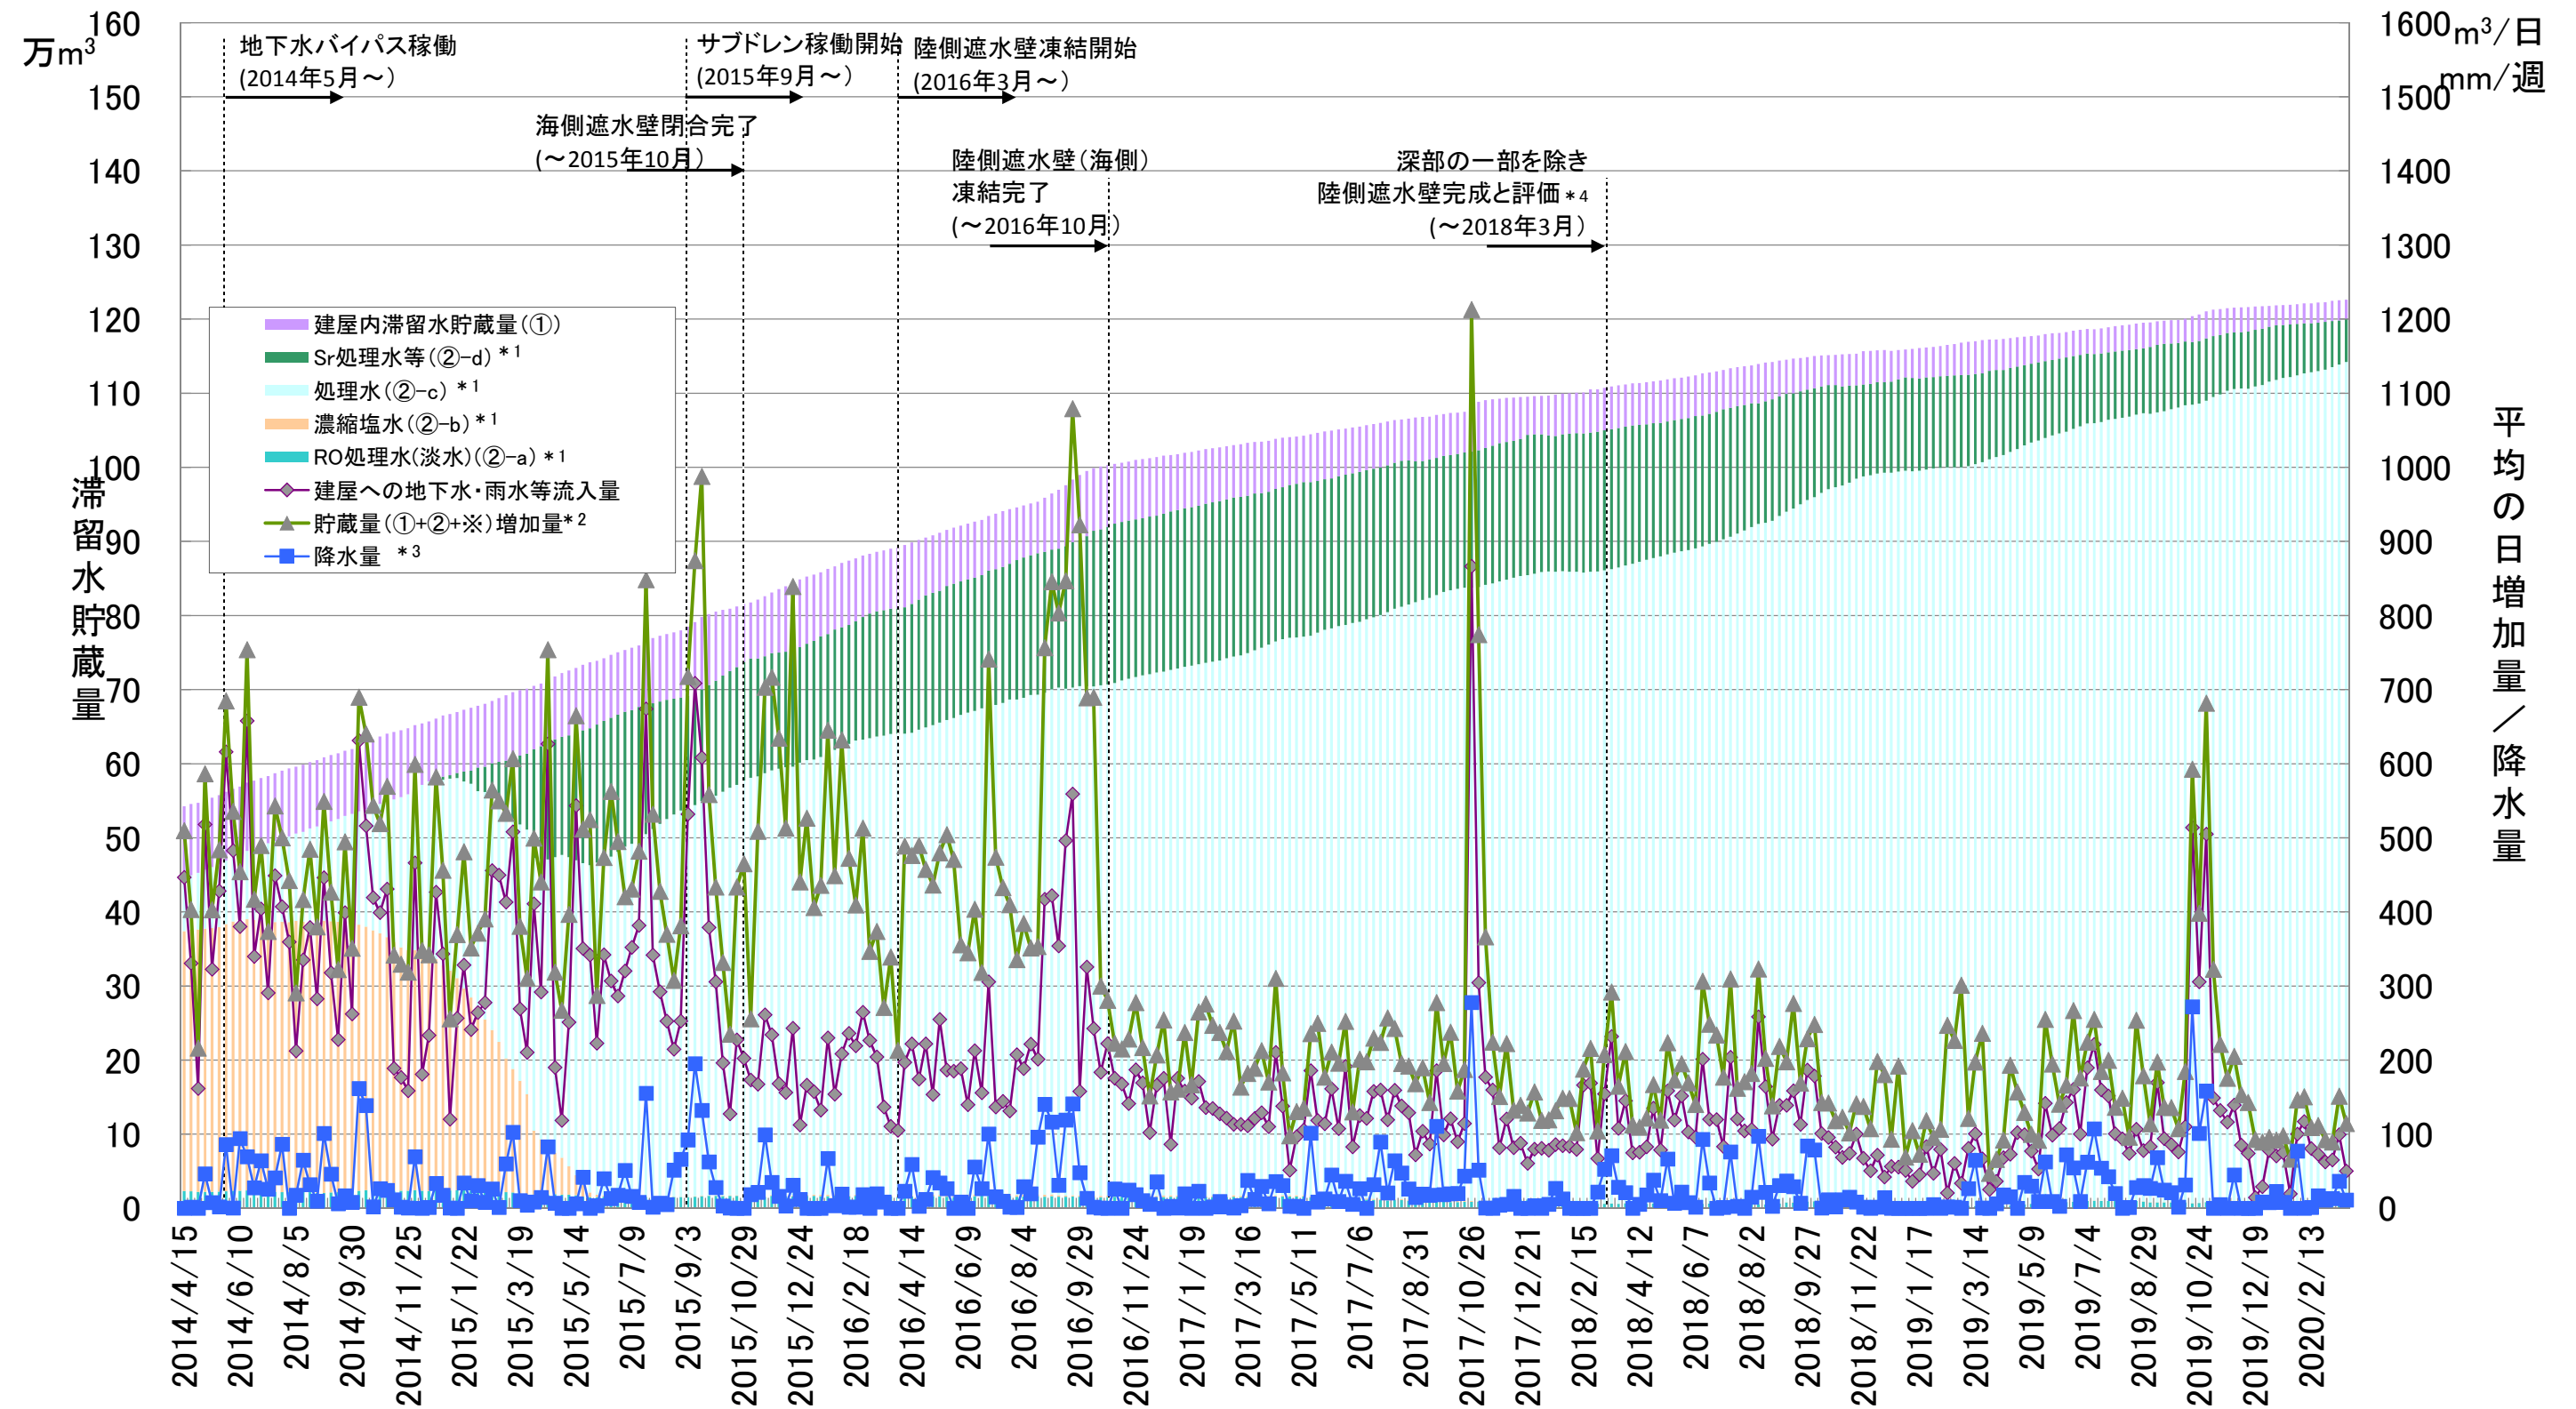

①: 建屋内滞留水貯蔵量(1～4号機、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、廃液供給タンク、SPT(B))

②: 1～4号機タンク貯蔵量

(〔②-aRO処理水(淡水)〕+〔②-b濃縮塩水〕+〔②-c処理水〕+〔②-dSr処理水等〕)

※: タンク底部から水位計0%までの水量(DS)

*1: 水位計0%以上の水量

*2: 貯蔵量増加量の精度向上として、2017/2/9より算出方法を以下の通り見直し。(2018/3/1見直し実施)
〔(建屋への地下水・雨水等流入量)+(その他移送量)+(ALPS薬液注入量)〕

*3: 2018/12/6まで浪江地点の降水量を使用していたが、2018/12/13より1F構内の降水量に変更

*4: 深部未凍結箇所3箇所については、2018年9月までに凍結完了
