

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

- ①建屋内滞留水水位及び貯蔵量
 - ・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足
- ②1~4号機タンク貯蔵量
 - ・淡水化装置による処理により、RO処理水(淡水)及び濃縮塩水の貯蔵量は変動あり
 - ・蒸発濃縮装置は全台停止中
- ③5, 6号機滞留水貯蔵量
 - ・構内散水によりFエリアタンク貯蔵量は変動あり
- ④廃棄物発生量
 - ・除染装置停止中のため、廃スラッジ貯蔵量は変動なし

①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

| 施設 | 貯蔵量 | T/B建屋内水位 |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1号機 | 約1,320 m ³ | -※7 |
| 2号機 | 約3,360 m ³ | T.P.-1,288 |
| 3号機 | 約2,050 m ³ | T.P.-1,637 |
| 4号機 | 約10 m ³ | T.P.-1,479以下 |
| 合計 | 約6,740 m ³ | |


| 貯蔵施設 | 貯蔵量 | 水位 |
|---------|-----------------------|----------|
| プロセス主建屋 | 約5,610 m ³ | T.P.-277 |
| 高温焼却炉建屋 | 約3,140 m ³ | T.P.346 |
| 合計 | 約8,750 m ³ | |

(合計):-1050[m³/4週](合計):+900[m³/週]


| 施設 | 貯蔵量 | 貯蔵容量 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 廃液供給タンク | 952 m ³ | 1,200 m ³ |
| SPT(B) | 2,322 m ³ | 3,100 m ³ |

(合計):+1988[m³/4週](合計):+1219[m³/週]


④廃棄物発生量



保管量:421/700[m³]*3




保管量:4923/6372体*1




保管量:約9391/10300[m³]*3
水位計0%以上の保管量:9291[m³]
タンク底部~水位計0%の保管量(DS):約100[m³]


- ②-a RO処理水(淡水)
- ②-b 濃縮塩水(残水)
- ②-c 処理水(多核種除去設備等処理水)
- ②-d Sr処理水等
- タンク解体・建設中エリア
- 水処理二次廃棄物(既設)
- 水処理二次廃棄物(追設予定)
- 循環注水ルート(実線:主に使用するルート)
- ろ過水注水ルート

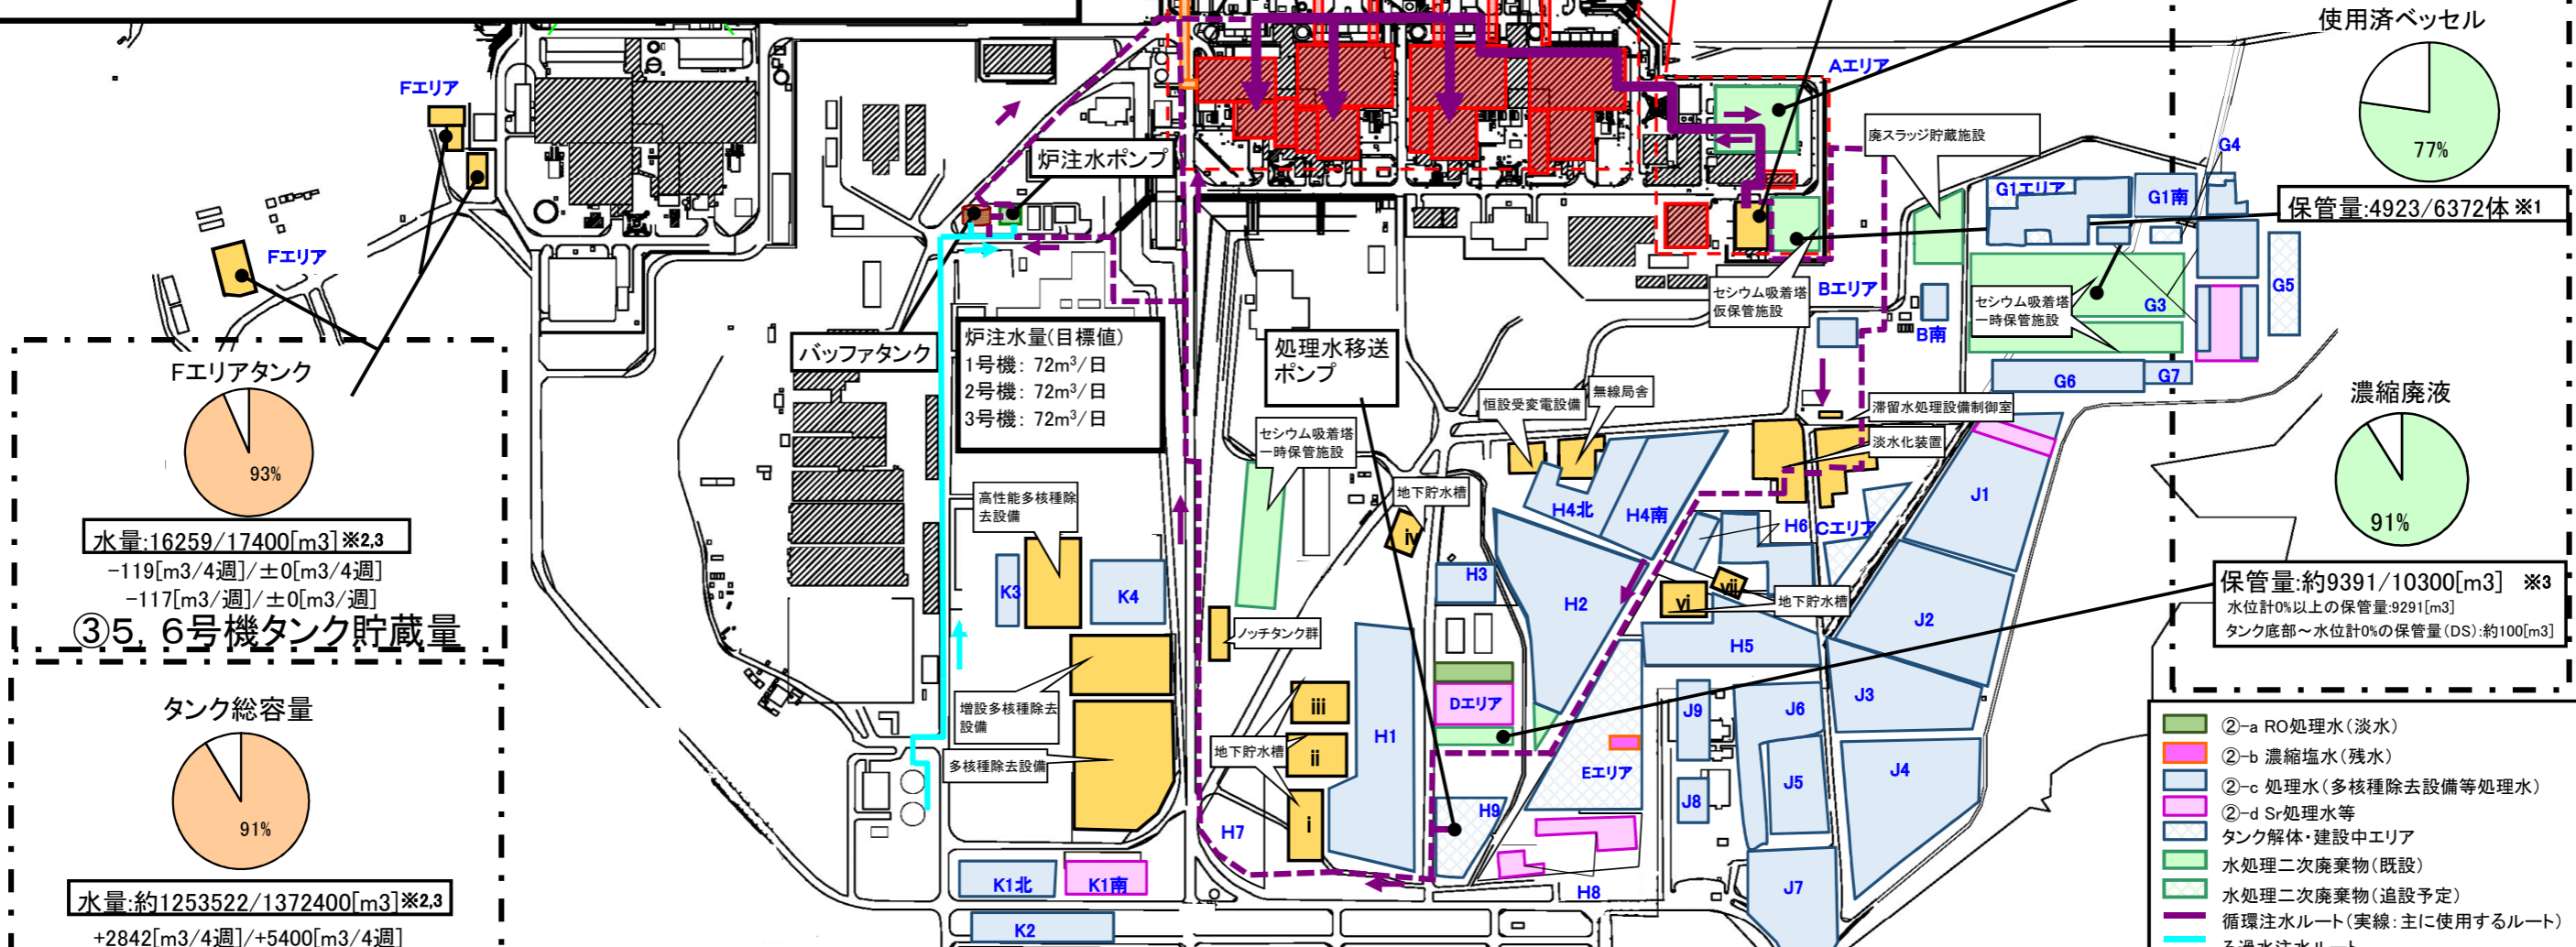

③5, 6号機タンク貯蔵量




水量:16259/17400[m³]*2,3
-119[m³/4週]/±0[m³/4週]
-117[m³/週]/±0[m³/週]



水量:約1253522/1372400[m³]*2,3
+2842[m³/4週]/+5400[m³/4週]
-2403[m³/週]/-2500[m³/週]

②タンク貯蔵量合計(②+③)


- ※1 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル及び多核種除去設備の保管容器、処理カラム及びモバイル式処理装置使用済ベッセルを含む
- ※2 装置稼働中につき水位が安定しないため参考扱い
- ※3 貯蔵容量は運用上の上限を示す(タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てて表記)
- ※4 多核種除去設備等(ホット試験中)の処理済水を貯蔵するが、タンクの運用状況に応じて淡水や濃縮塩水を貯蔵
- ※5 ウェルポイント・地下水ドレン(約40m³/週)、共用プールから高温焼却炉建屋への移送量(約20m³/週)、その他移送量(約60m³/週)の合計90m³/週を含む(端数処理上、各移送量の総和と異なる場合がある)
- ※6 放射性物質濃度が高い多核種除去設備B系出口水を含む
- ※7 1号機T/Bはすでに水抜きが完了しているため、水位を「-」表記
- ※8 フランジ型タンクに貯蔵するSr処理水の処理完了(2018/11/17)フランジ型タンクに貯蔵する多核種除去設備等処理済水の移送完了(2019/3/27)。引き続き、残水処理を進める観点から、以後、フランジ型タンクのタンク底部~水位計0%の水量(DS)は水位計0%以上の水量に含める



| ②-a RO処理水(淡水) | ②-b 濃縮塩水(残水) | ②-c 処理水(多核種除去設備等処理水) | ②-d Sr処理水等 |
|---|---|---|---|
| 水量:約6039/19400[m ³]*2,3 水位計0%以上の水量:5239[m ³] タンク底部~水位計0%の水量(DS):約800[m ³] -1384[m ³ /4週]/-5200[m ³ /4週] -1870[m ³ /週]/-5200[m ³ /週] | 水量:約500/2100[m ³]*2,3 水位計0%以上の水量:約400[m ³] タンク底部~水位計0%の水量(DS):約100[m ³] ±0[m ³ /4週]/±0[m ³ /4週] ±0[m ³ /週]/±0[m ³ /週] | 水量:約1208171/1259300[m ³]*2,3,4,6 水位計0%以上の水量:1206071[m ³]*2,3,4,6 タンク底部~水位計0%の水量(DS):約2100[m ³]*8 +4617[m ³ /4週]/+10600[m ³ /4週] +73[m ³ /週]/+2700[m ³ /週] | 水量:約22553/74200[m ³]*2,3 水位計0%以上の水量:22253[m ³]*8 タンク底部~水位計0%の水量(DS):約300[m ³]*8 -272[m ³ /4週]/±0[m ³ /4週] -489[m ³ /週]/±0[m ³ /週] |

②1~4号機タンク貯蔵量

1~4号機タンク総容量





水量:約1256027[m³]*5
+3429[m³/4週]
-187[m³/週]

建屋内貯蔵量 + 1~4号機タンク貯蔵量(①+②)

| ②1~4号機タンク貯蔵量 |
|--|
| 水量:約1237263/1355000[m ³]*2,3,4 水位計0%以上の水量:1233963[m ³] タンク底部~水位計0%の水量(DS):約3300[m ³] +2961[m ³ /4週]/+5400[m ³ /4週] -2286[m ³ /週]/-2500[m ³ /週] |

滞留水の貯蔵状況の推移

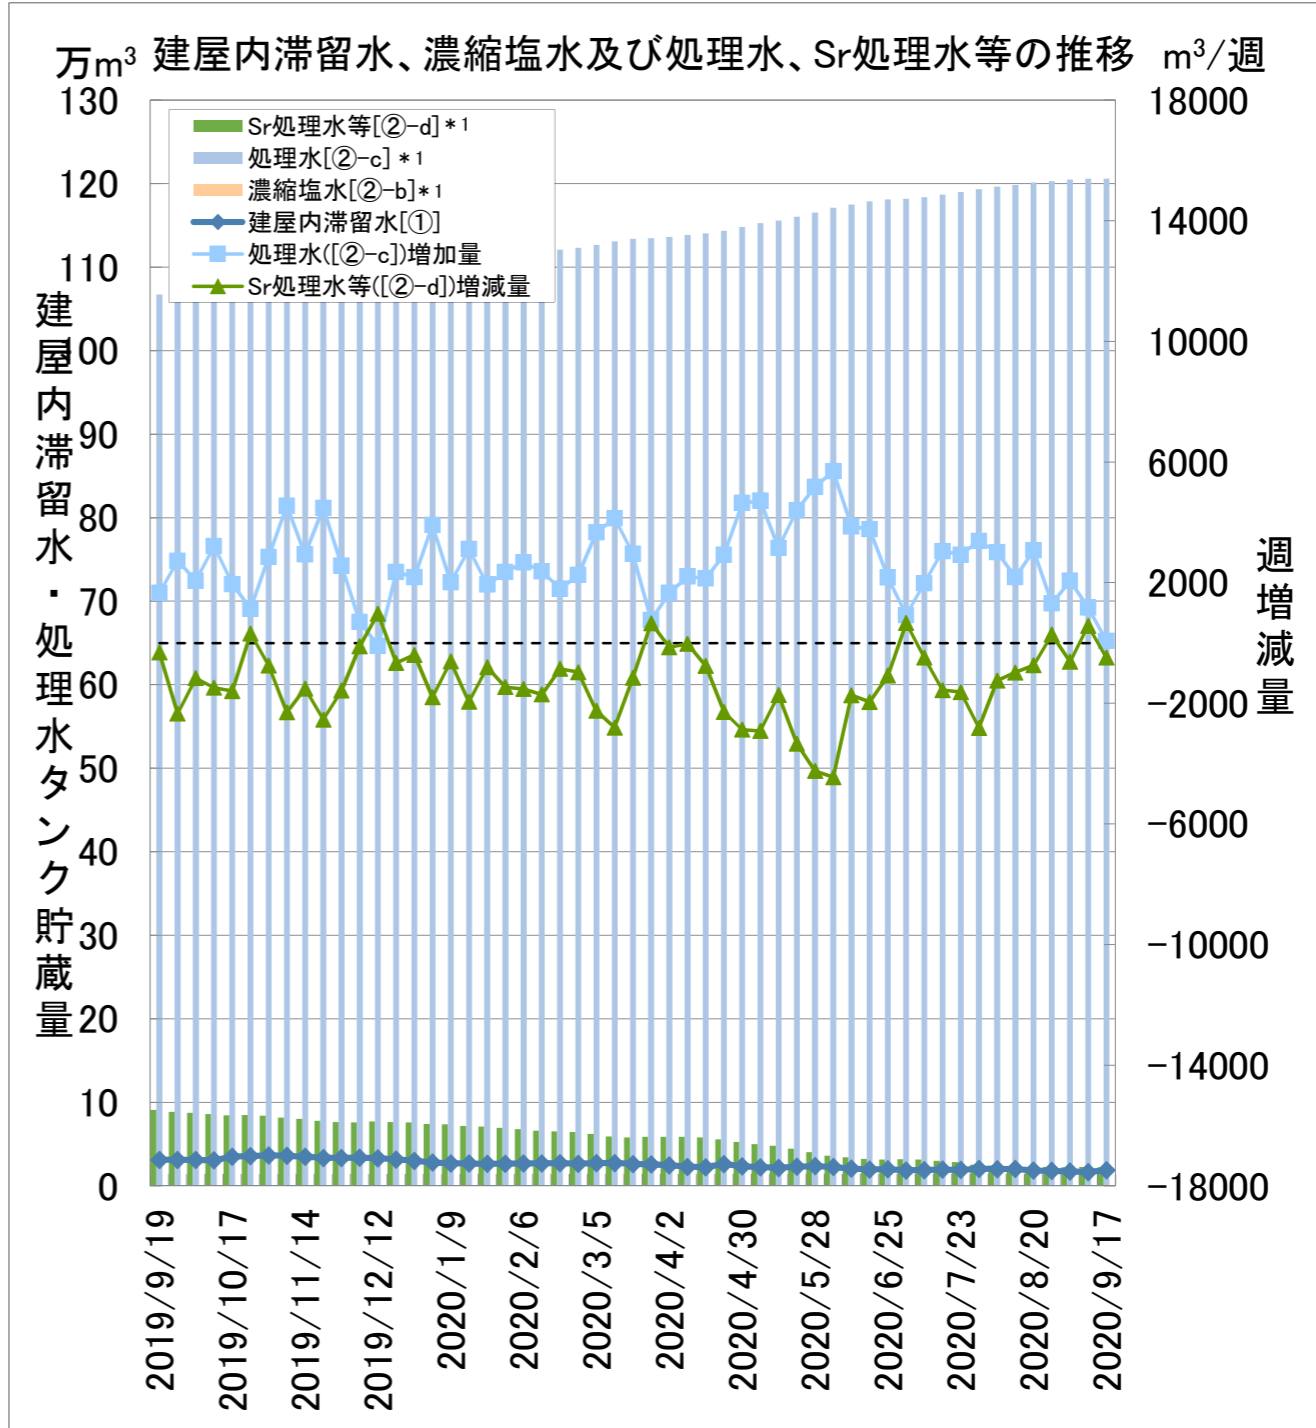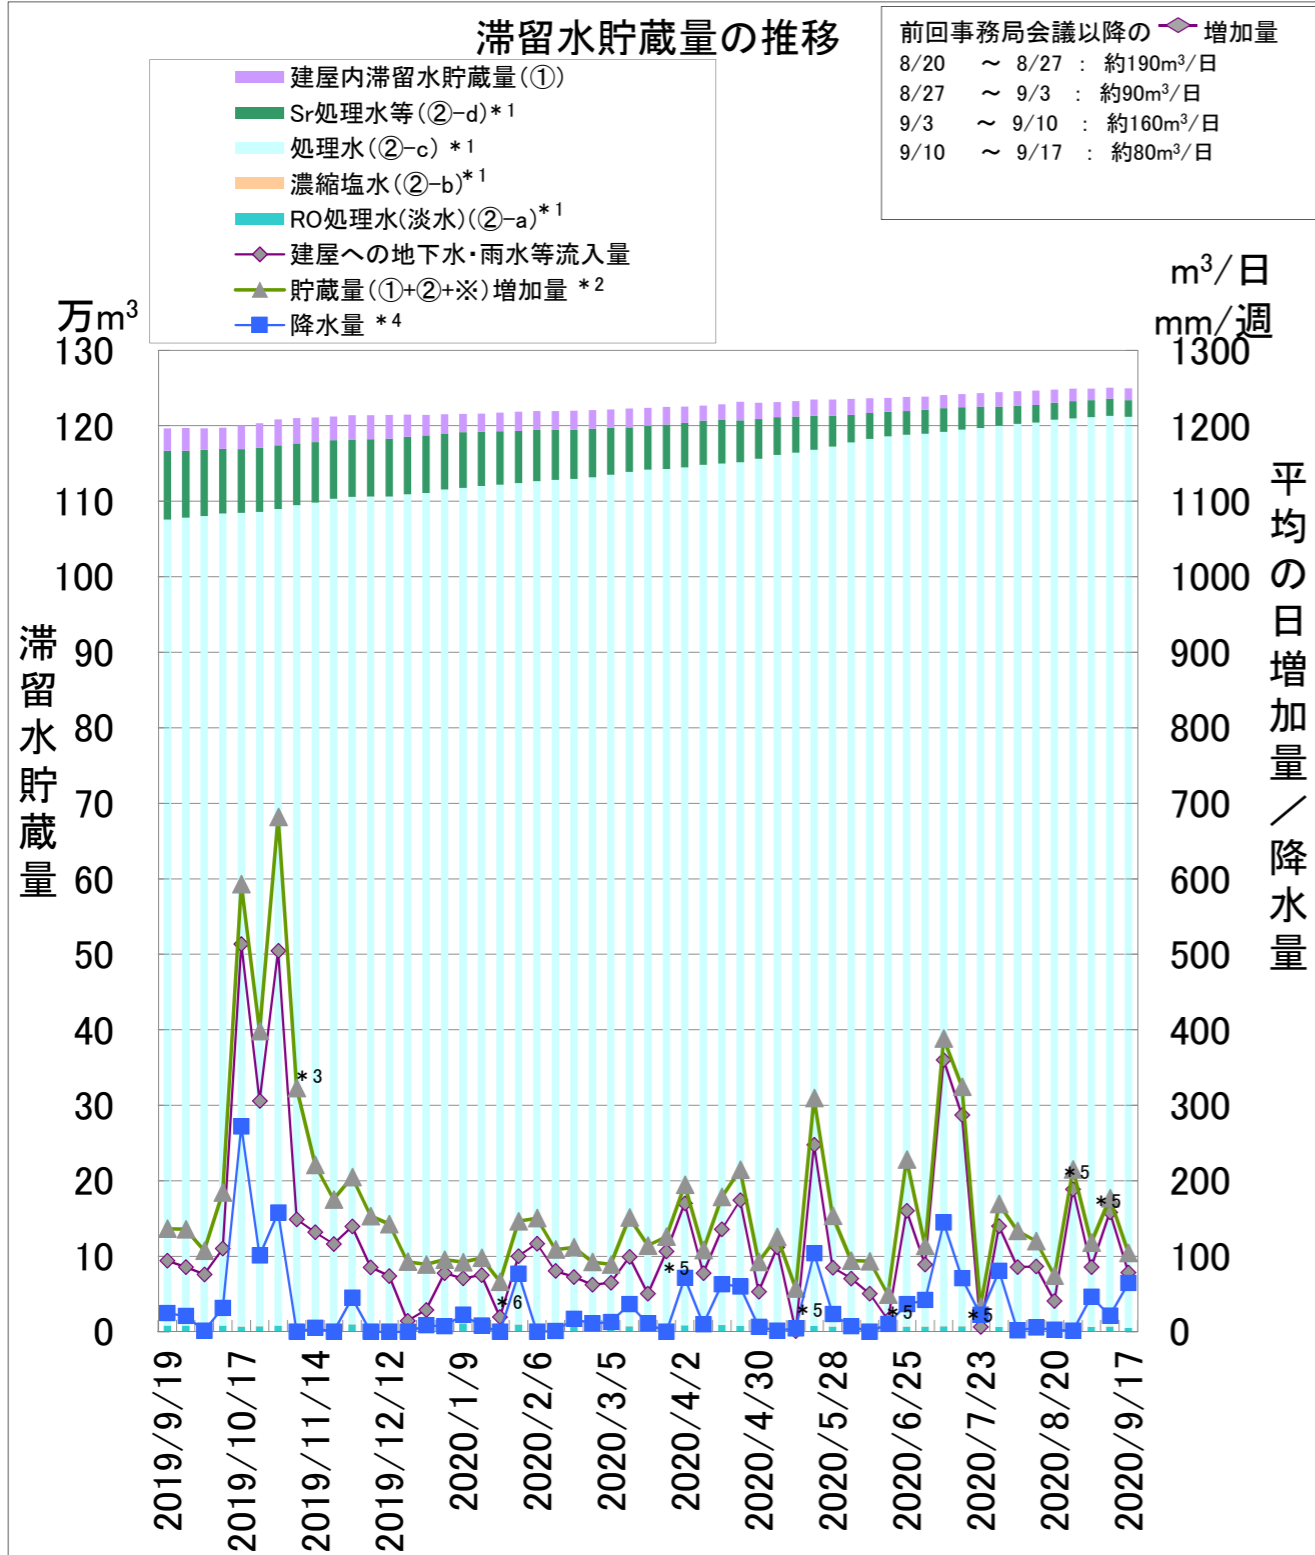

①: 建屋内滞留水貯蔵量(1~4号機、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、廃液供給タンク、SPT(B))
 ②: 1~4号機タンク貯蔵量([②-aRO処理水(淡水)]+[②-b濃縮塩水]+[②-c処理水]+[②-dSr処理水等])

※: タンク底部から水位計0%までの水量(DS)


- *1: 水位計0%以上の水量
- *2: 貯蔵量増加量の精度向上として、2017/2/9より算出方法を以下の通り見直し。(2018/3/1見直し実施)
 [(建屋への地下水・雨水等流入量)+(その他移送量)+(ALPS薬液注入量)]
- *3: 廃炉作業に伴う建屋への移送により貯蔵量が増加。
 (移送量の主な内訳は①地下水ドレンRO濃縮水をタービン建屋へ移送:約80m³/日、②ウェル・地下水ドレンからの移送:約50m³/日、③5/6号SPTからプロセス主建屋へ移送:20m³/日、他)
- *4: 2018/12/13より浪江地点の降水量から1F構内の降水量に変更。
- *5: 建屋内滞留水の水位低下の影響で、評価上、建屋への地下水・雨水等流入量が一時的に変動したものと推定。(2020/3/18,2020/5/7~14,2020/6/11~18,2020/7/16~23,2020/8/20~27,2020/9/3~10)
- *6: 2019/1/16~23集計分より4号機R/B水位低下に伴いR/B滞留水へ流出するS/C内系統水量について、廃炉作業に伴い発生する移送量に加え、建屋への地下水・雨水等流入量へ反映

| 処理水 | 累積処理水 | 期間処理水 | | 定格処理量 |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | [m ³] | [m ³ /週] | [m ³ /日] ^{注1)} | [m ³ /日] |
| 既設多核種除去設備 ^{注2)} | 455,058 | 42 | 6 | 750以上 |
| 増設多核種除去設備 ^{注2)} | 681,943 | 31 | 4 | 750以上 |
| 高性能多核種除去設備 | 102,556 | 0 | 0 | 500以上 |
| 高性能 検証試験装置 | 1,128 | 0 | 0 | 50 |
| Sr処理水等 | 期間処理水 | | 定格処理量 | |
| | [m ³ /週] | [m ³ /日] ^{注1)} | [m ³ /日] | |
| セシウム吸着装置 | 0 | 0 | 600 | |
| 第二セシウム吸着装置 | | | 1200 | |
| 第三セシウム吸着装置 | | | 600 | |

注1) 週間の平均値

注2) 既設・増設多核種除去設備処理水の一部は、残水があるRO濃縮塩水タンクに移送し、Sr処理水等として貯蔵

滞留水の貯蔵状況の推移(長期グラフ)

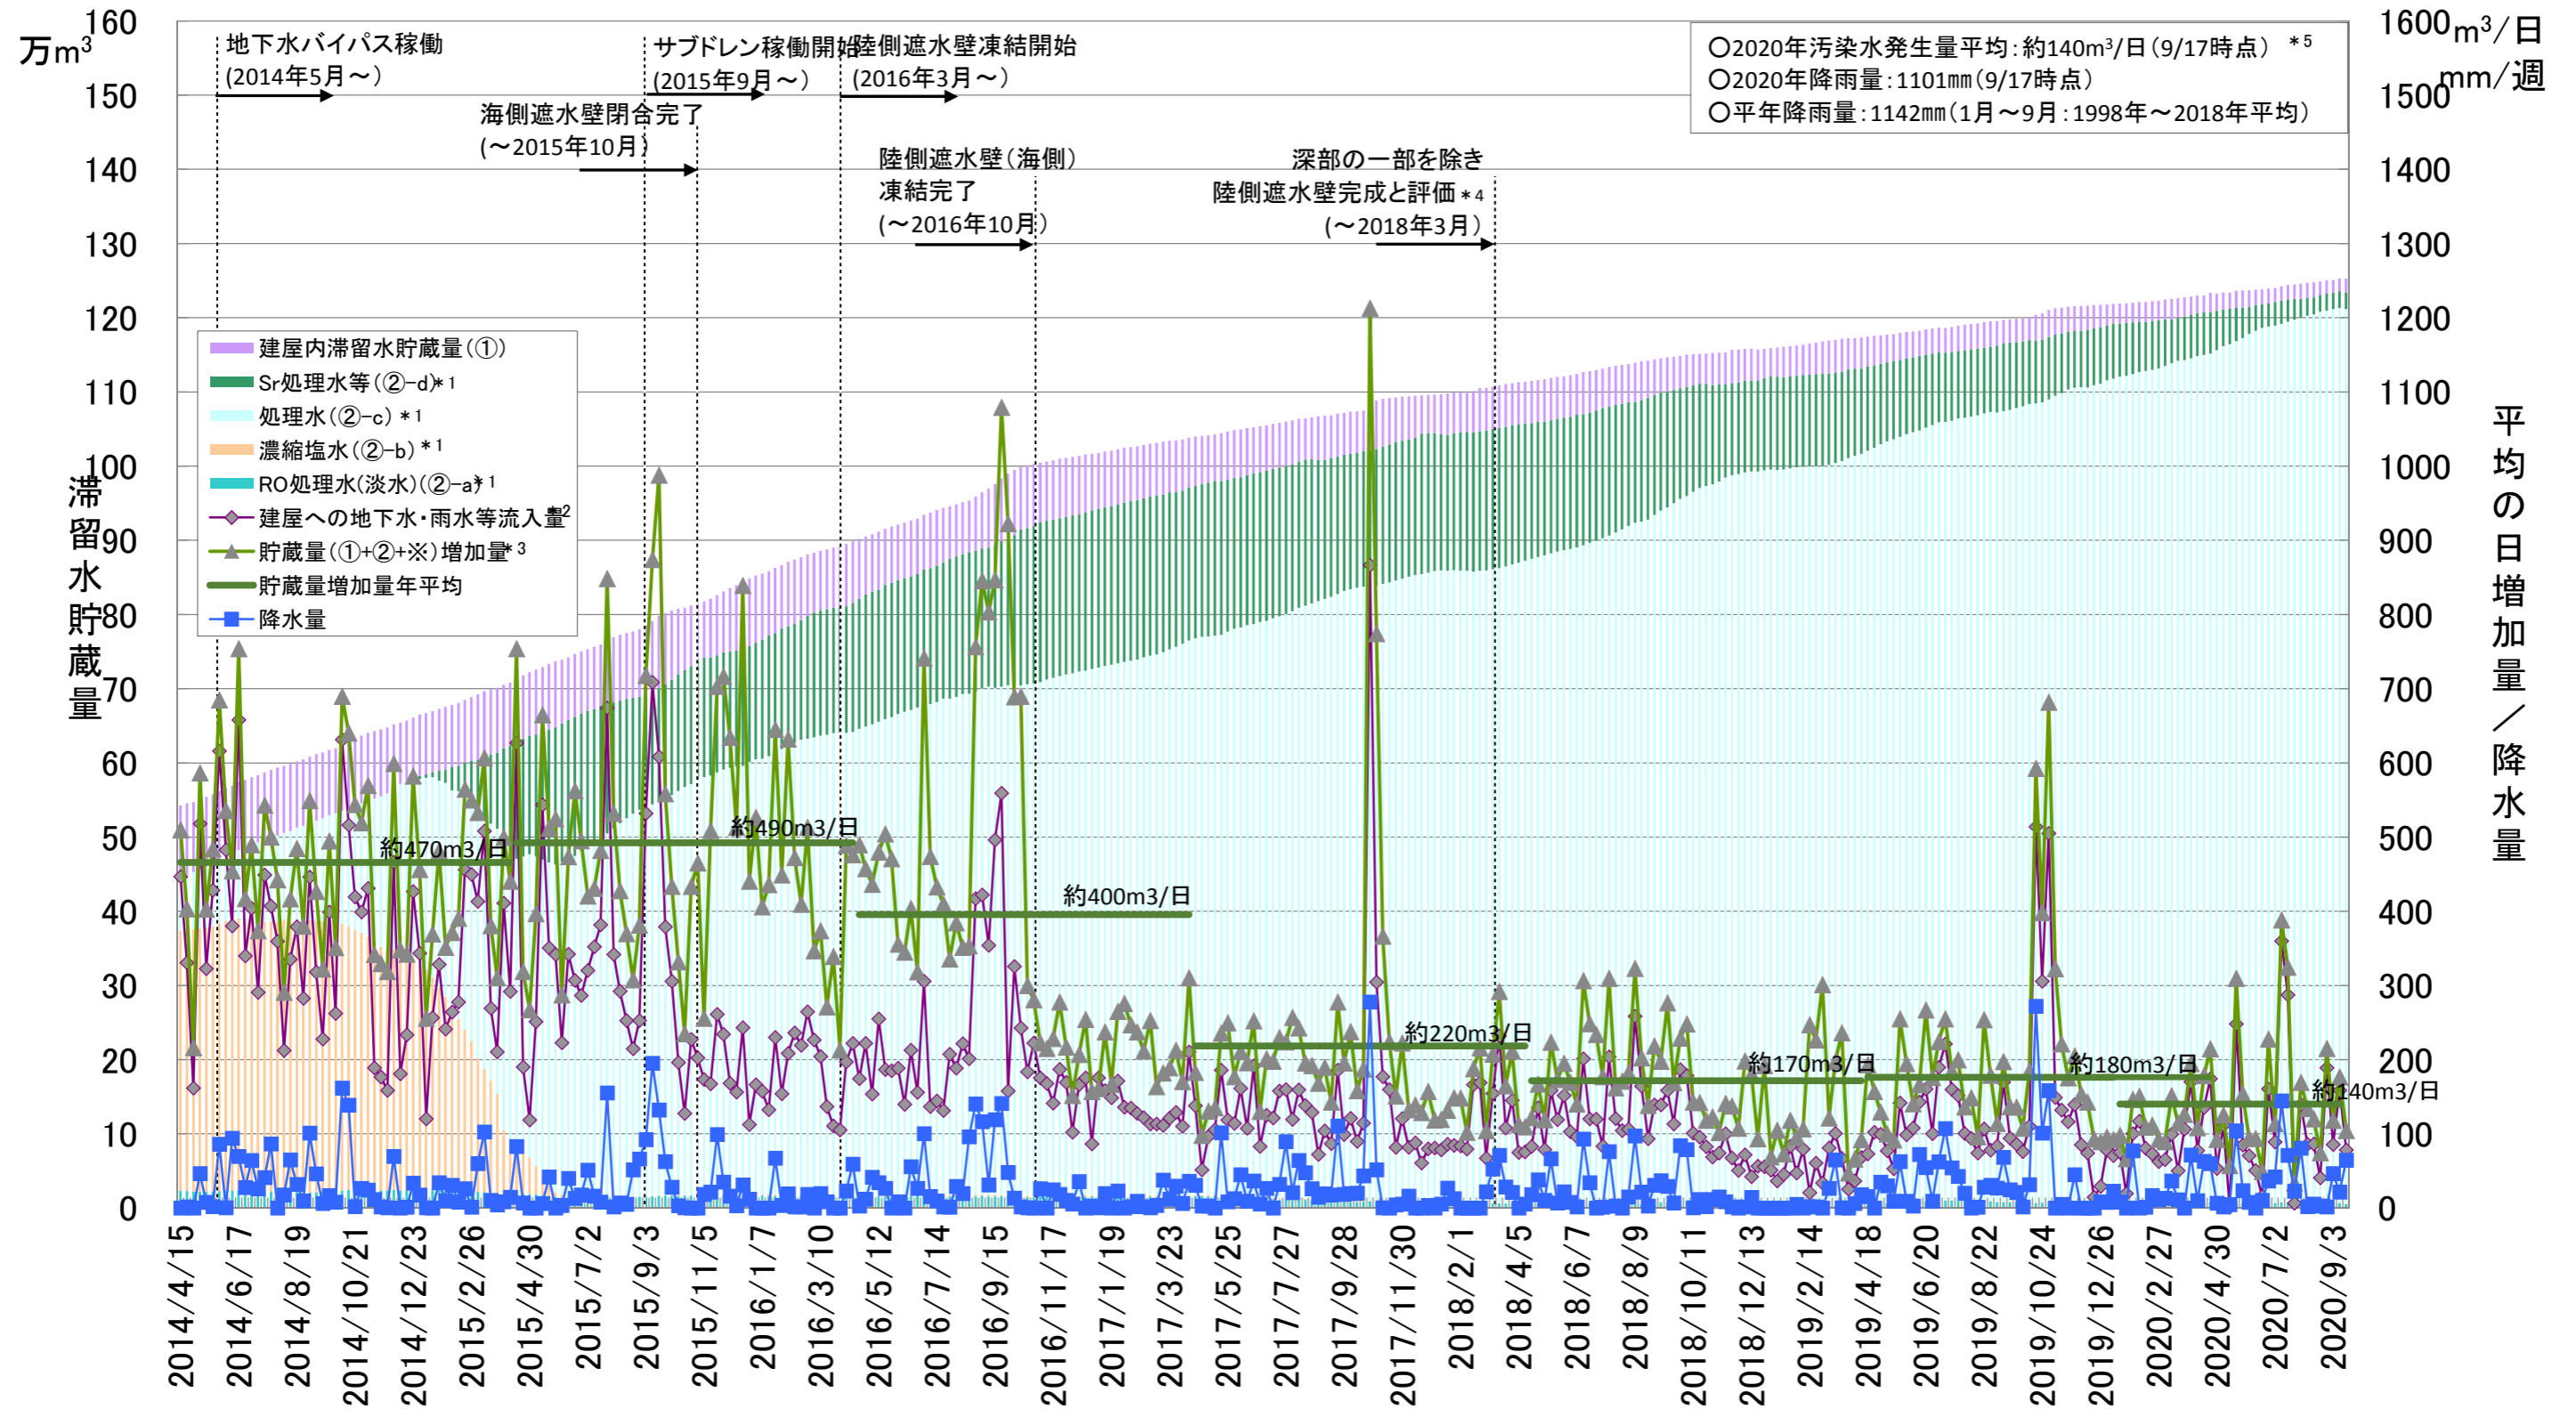

①: 建屋内滞留水貯蔵量(1~4号機、プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、廃液供給タンク、SPT(B))

②: 1~4号機タンク貯蔵量

(〔②-aRO処理水(淡水)〕+〔②-b濃縮塩水〕+〔②-c処理水〕+〔②-dSr処理水等〕)

※: タンク底部から水位計0%までの水量(DS)

*1: 水位計0%以上の水量

*2: 貯蔵量増加量の精度向上として、2017/2/9より算出方法を以下の通り見直し。(2018/3/1見直し実施)
〔(建屋への地下水・雨水等流入量)+(その他移送量)+(ALPS薬液注入量)〕

*3: 2018/12/6まで浪江地点の降水量を使用していたが、2018/12/13より1F構内の降水量に変更

*4: 深部未凍結箇所3箇所については、2018年9月までに凍結完了

*5: 福島第一原子力発電所の廃炉に向けた中長期ロードマップ上、平均的な降雨に対して、2020年内に汚染水発生量を150m³/日程度に抑制することを目標としている。
