

# 2号機復水器ホットウェル天板下部 貯留水の水抜き完了について

2017年11月30日

東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

TEPCO

## 1. 2号機復水器内ホットウェル天板下部水抜き実績について **TEPCO**

- 2号機復水器内ホットウェル（以下、H/W）天板下部貯留水の水抜きを実施。  
実施期間 : 2017年11月6日 ~ 2017年11月17日 水抜き作業実施  
2017年11月20日 カメラにて水抜き完了を確認

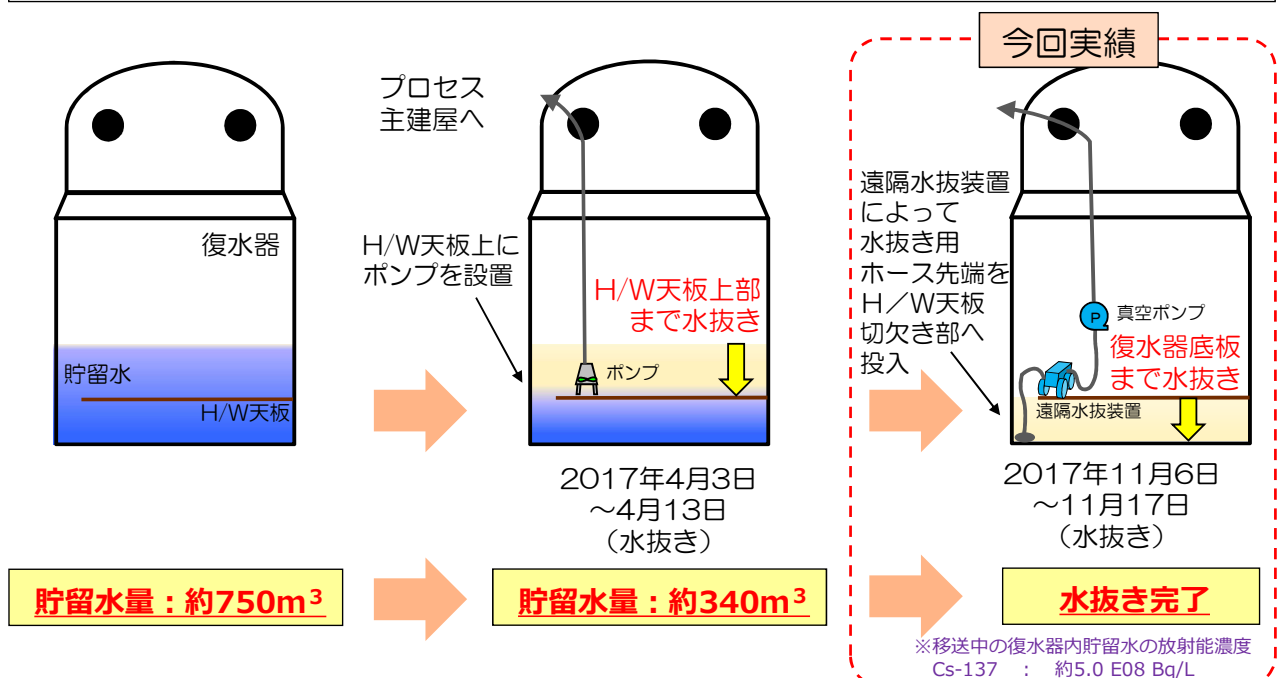

## 2. 2号機復水器内ホットウェル天板下部の水抜き状況



水抜き用のホース


復水器H/W天板下部の水抜き作業 (移送前)



復水器H/W天板下部の水抜き作業 (移送中)



復水器H/W天板下部の水抜き作業 (移送後)

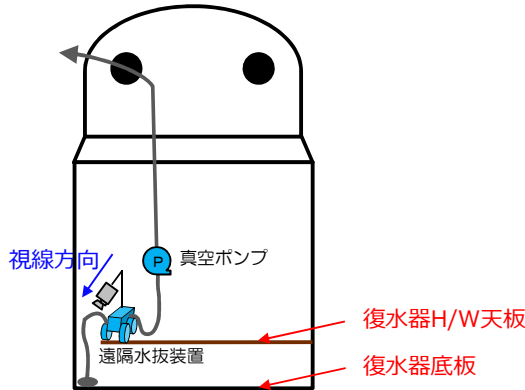

遠隔監視室

## 3. スケジュール

- 2号機は、2017年11月に水抜きが完了。
- 3号機については、ポンプ設置、移送ライン設置作業を進めており、2号機と同様な方法にて2017年12月から水抜き実施予定。

作業内容		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月以降
2号機	復水器内構造物の調査およびH/W下部水抜き方法の検討	■■■■■							
	ポンプ設置、移送ライン設置作業				■■■■■				
	H/W天板下部貯留水の移送						■■■		
3号機	復水器内構造物の調査およびH/W下部水抜き方法の検討		■■■■■						
	ポンプ設置、移送ライン設置作業					■■■■■	■		
	H/W天板下部貯留水の移送							■■■	
