

福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー屋根パネルの取り外しについて

2015年7月30日
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー 屋根パネル（1枚目）の取り外しについて

< 参 考 資 料 >
2015年7月28日
東京電力株式会社

本日、1号機建屋カバーの屋根パネルの取り外しを行いました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタや敷地境界に設置してあるモニタリングポストに有意な変動はありませんでした。

< 概要 >

■作業日
2015年7月28日

■作業時間
6時59分：屋根パネル吊り上げ開始
7時38分：屋根パネル仮置き

屋根パネル取り外し状況



クレーンカメラより撮影



1号機建屋山側より撮影




1号機建屋山側より撮影

(参考) 防風カーテン設置状況

カーテンの布地と同材質で目張りをする事で開口面積を縮小

ホース・ケーブル類の回りに難燃性スポンジを充填し、開口面積を縮小

カーテンの開口面積
幅：約3m
高さ：約4m

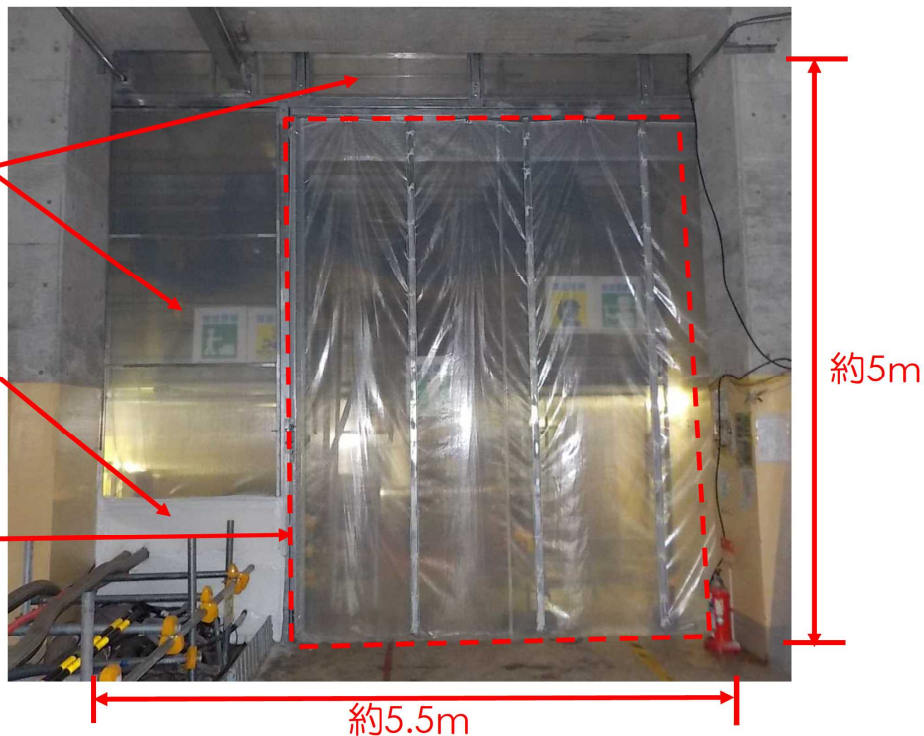

布地仕様	ポリエステル100%（糸入り透明タイプ） ポリ塩化ビニール樹脂コーティング
	防災（建築養生Ⅱ類適合品）
	厚み 約0.5mm
風荷重耐圧	10m/s
