

建屋滞留水処理の進捗状況について (1,2号機間の連通部の切り離し)

2018年 9月 6日

東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社



今後の建屋水位低下計画

- 2018年内の1,2号機間の連通部の切り離しに向けて、建屋水位を低下中。
- 今後、更に建屋水位を順次低下させ、9月中に1,2号機間の連通部の切り離し完了の見通し※。

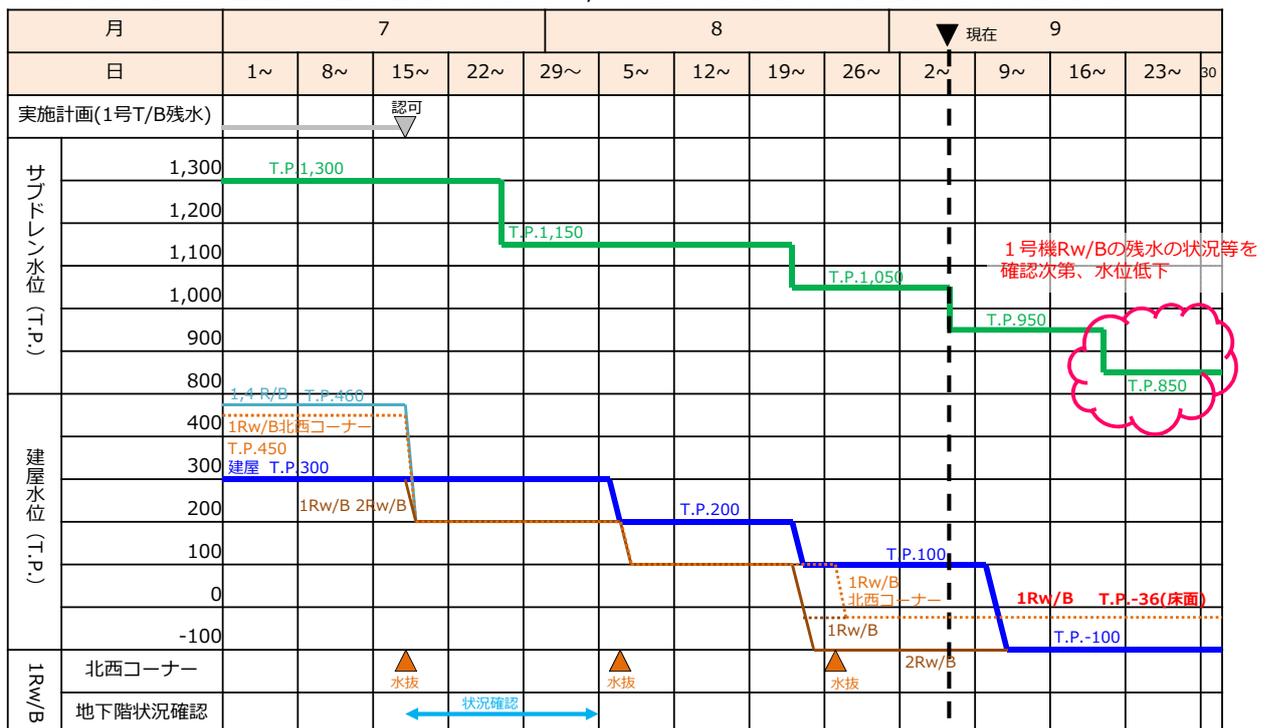

※中長期ロードマップにおけるマイルストーン「1,2号機間及び3,4号機間の連通部の切り離し（2018年度）」達成の見通し。
なお、3,4号機間の連通部は2017年12月の建屋水位低下時（2~4号機T/B最下階中間部露出時）に切り離しを達成済み。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

