

# サブドレン他水処理施設の運用状況等




---

2022年12月22日


東京電力ホールディングス株式会社

# 1-1. サブドレン他水処理施設の概要

## ・設備構成

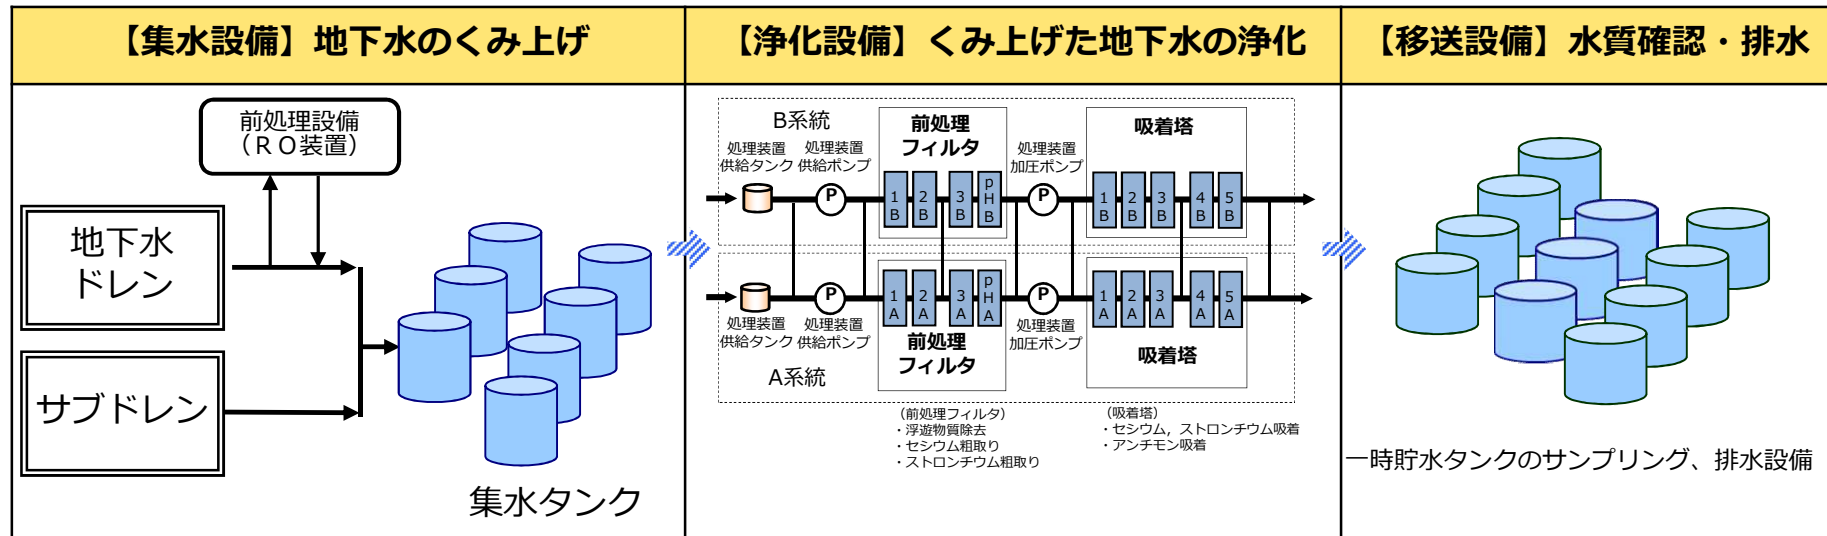

## ・ピット配置図

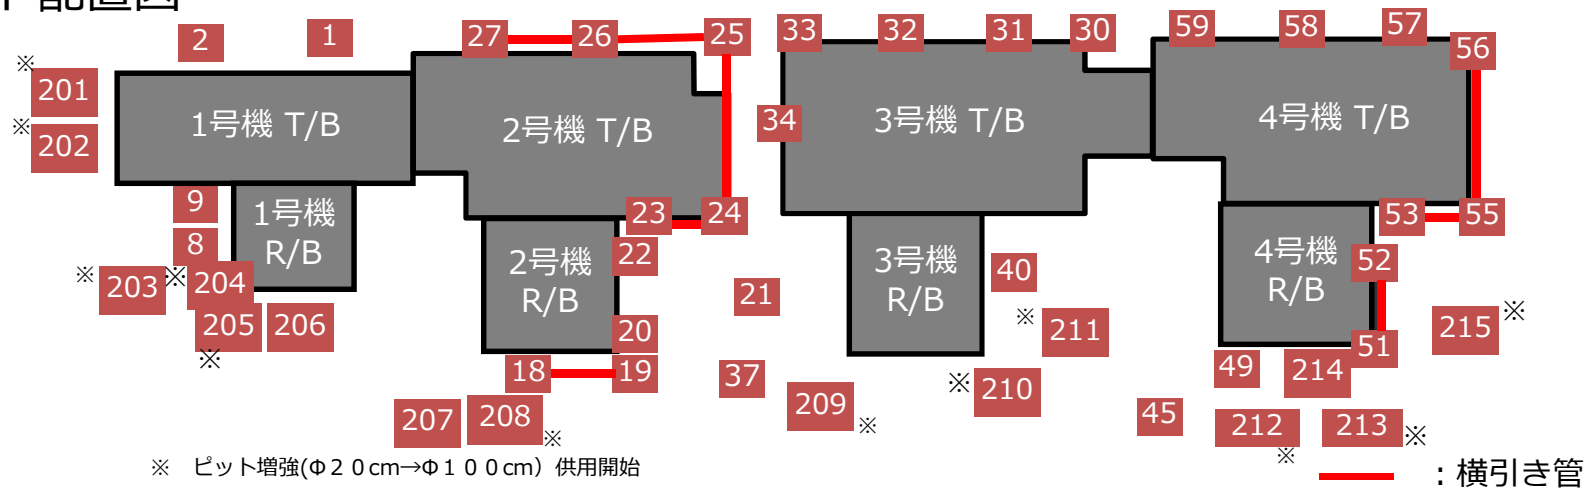

## 1-2. サブドレンの運転状況（24時間運転）

- 山側サブドレン設定水位のL値をT.P.+5,064mmから稼働し、段階的にL値の低下を実施。  
実施期間：2015年9月17日～、L値設定：2021年5月13日～T.P.-650mmで稼働中。
- 海側サブドレンL値をT.P.+4,064mmから稼働し、段階的にL値の低下を実施。  
実施期間：2015年10月30日～、L値設定：2021年5月13日～T.P.-650mmで稼働中。
- サブドレンピットNo.30,37,57を復旧し、2018年12月26日より運転開始。No.49ピットは復旧後、2020年10月9日より運転開始。
- 5/6号機サブドレンは、3/28に復旧し、日中時間帯（7h/日）の短時間運転を実施してきたが、4/14より24時間運転に移行し、継続稼働中。
- サブドレンピットNo.21は、2号機燃料取り出し構台の設置工事に干渉するため、移設を行い、2022年10月7日より稼働を開始した。
- サブドレン集水設備No.4中継タンク内の油分確認による、No.4中継サブドレンピットの稼働状況は下記の通り。
  - ・'20/11末 No.4中継タンク内及びNo.40ピットで油分が確認され、近傍のピット210,211を含め稼働を停止したが、タンク等清掃を行い、9月より設定水位（L値）をNo.40:T.P.+1,000、No.210,211:T.P.+1,500で稼働を再開した。
  - ・'22/4/21～ 3号機起動用変圧器からの絶縁油の漏えい確認後にサブドレンNo.40ピットにて油分（PCB含有量の分析結果は、0.56mg/kgと低濃度PCB含有）が確認されたため、No.40ピット及び近傍のNo.210,211ピットの運転を停止中。
  - ・'22/7初～ No.210,211の運転を再開するため、油分拡散抑制対策を計画しており、その準備として、設置エリアにある瓦礫の撤去等を実施している。
- その他トピックス
  - ・特になし。



- ※1 台風19号対応として10月12～15日の間、一時的に全ピットのL値をT.P.1400mmに変更した。
- ※2 1月の大雨に備えて基本のL値をT.P.1300mmとし、2月7日に水位設定値を元に戻した（L値:T.P.-0.15 m）

### 1-3. 至近の排水実績

- サブドレン他水処理設備においては、2015年9月14日に排水を開始し、2022年12月13日までに2,063回目の排水を完了。
- 一時貯水タンクの水質はいずれも運用目標（Cs134=1, Cs137=1, 全β=3, H3=1,500(Bq/L)）を満足している。




排水日		12/8	12/10	12/11	12/12	12/13
一時貯水タンクNo.		B	G	F	K	J
浄化後の水質 (Bq/L)	試料採取日	12/3	12/5	12/6	12/7	12/8
	Cs-134	ND(0.78)	ND(0.66)	ND(0.75)	ND(0.73)	ND(0.76)
	Cs-137	ND(0.65)	ND(0.65)	ND(0.65)	ND(0.75)	ND(0.77)
	全β	ND(2.0)	ND(2.0)	ND(1.7)	ND(1.8)	ND(0.65)
	H-3	760	820	750	750	730
排水量 (m <sup>3</sup> )		511	1,010	655	557	522
浄化前の水質 (Bq/L)	試料採取日	12/1	12/3	12/4	12/5	12/6
	Cs-134	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(5.0)	ND(5.0)
	Cs-137	33	36	31	27	34
	全β	—	—	—	300	—
	H-3	770	900	800	800	760

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。


\* 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

\* 浄化前水質における全ベータ分析については、浄化設備の浄化性能把握のため週一回サンプリングを実施。

# 【参考】 1/2号機排気筒周辺サブドレンピットの水質

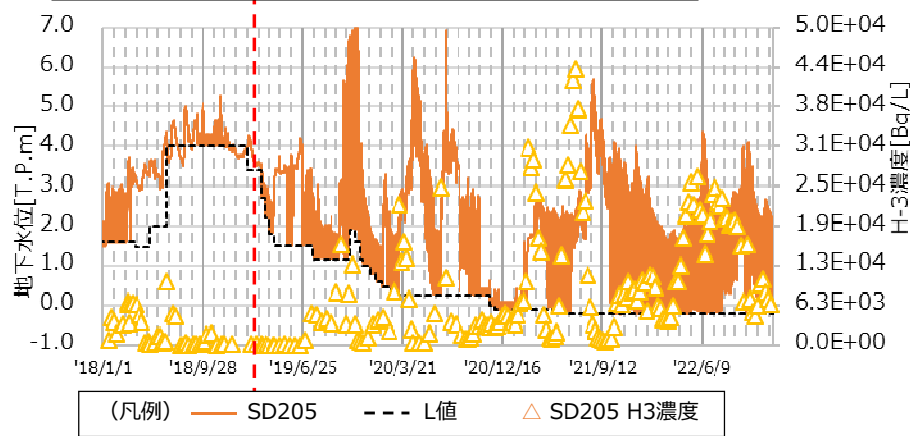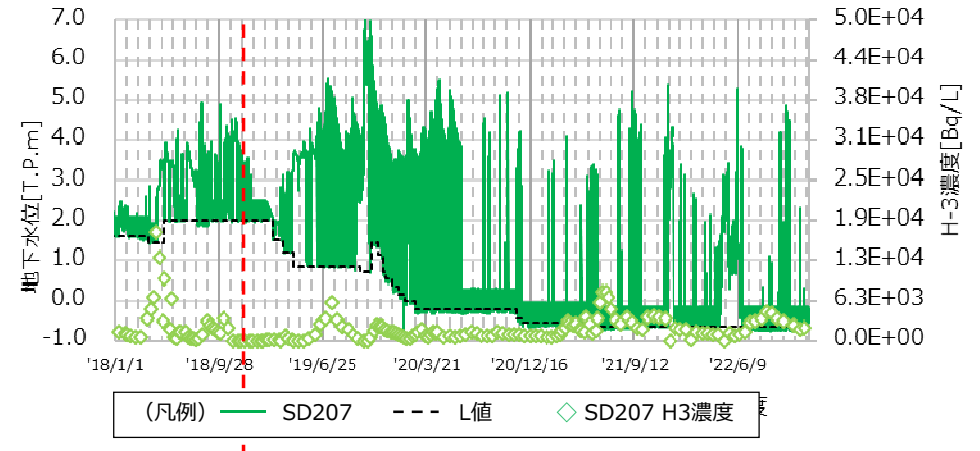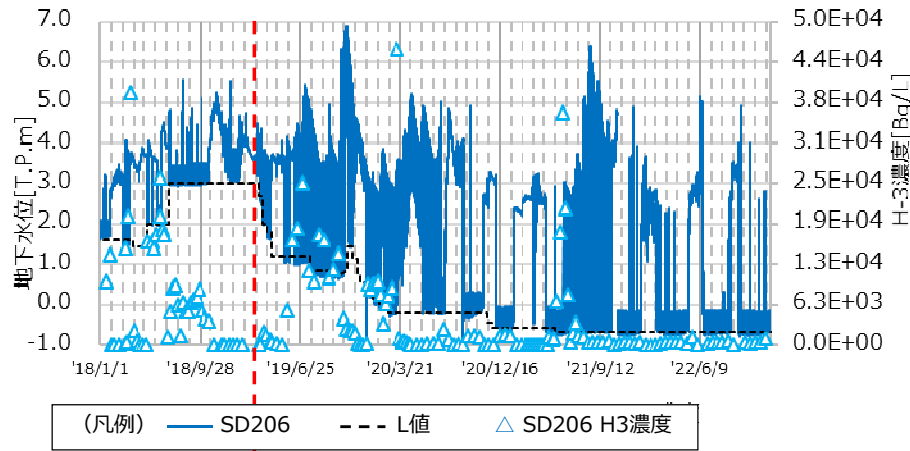

2019/2/6地改良完了

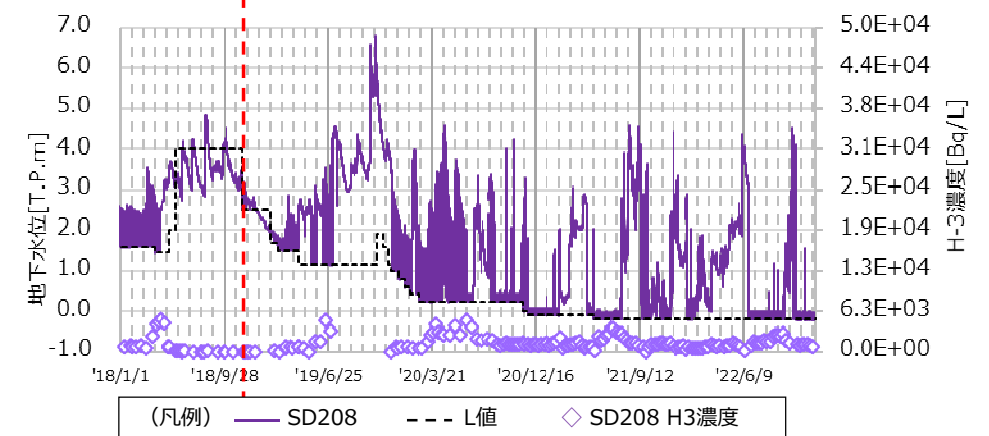

2018/11/6地盤改良完了
