

# 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2023.6.30時点)

分類	保管場所	保管容量※1	保管量※1	前回集約からの増減※1	エリア占有率	保管量 / 保管容量※1 割合	トピックス	
瓦礫類	屋外集積 (0.1mSv/h以下)	A	13,800 m <sup>3</sup>	2,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	16%	301,700 / 397,900 76%	<ul style="list-style-type: none"> <li>主な増減理由</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアC)</li> <li>港湾関連工事 (エリアF2)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアP1)</li> <li>フランジタンク除染作業 (エリアAA)</li> <li>港湾関連工事 (エリアBB)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアCC)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアDD1)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアDD2)</li> <li>1～4号機建屋周辺関連工事 (エリアEE1)</li> <li>1～4号機建屋周辺関連工事 (エリアEE2)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアd)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアk)</li> </ul>
		B	5,300 m <sup>3</sup>	5,300 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%		
		C	67,000 m <sup>3</sup>	66,600 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	99%		
		D	2,700 m <sup>3</sup>	2,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	97%		
		F1	700 m <sup>3</sup>	600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%		
		F2	6,400 m <sup>3</sup>	6,100 m <sup>3</sup>	+200 m <sup>3</sup>	95%		
		J	6,300 m <sup>3</sup>	6,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	97%		
		N	9,700 m <sup>3</sup>	9,600 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	99%		
		O	44,100 m <sup>3</sup>	44,000 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%		
		P1	62,700 m <sup>3</sup>	57,100 m <sup>3</sup>	-600 m <sup>3</sup>	91%		
		U	800 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%		
		V	6,000 m <sup>3</sup>	6,000 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%		
		AA	58,000 m <sup>3</sup>	25,900 m <sup>3</sup>	+1,200 m <sup>3</sup>	45%		
		BB	44,800 m <sup>3</sup>	44,700 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	100%		
		CC	18,800 m <sup>3</sup>	12,900 m <sup>3</sup>	-1,100 m <sup>3</sup>	68%		
		DD1	4,100 m <sup>3</sup>	1,200 m <sup>3</sup>	+1,000 m <sup>3</sup>	30%		
		DD2	6,800 m <sup>3</sup>	1,500 m <sup>3</sup>	+200 m <sup>3</sup>	22%		
		EE1	8,600 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>	+400 m <sup>3</sup>	4%		
		EE2	6,300 m <sup>3</sup>	800 m <sup>3</sup>	+800 m <sup>3</sup>	13%		
		d	1,900 m <sup>3</sup>	700 m <sup>3</sup>	-400 m <sup>3</sup>	37%		
		e	6,700 m <sup>3</sup>	6,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	94%		
k	9,500 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>	+100 m <sup>3</sup>	4%				
l	7,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0%				
シート養生 (0.1～1mSv/h)	E1	16,000 m <sup>3</sup>	13,900 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	87%	43,600 / 55,300 79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>主な増減理由</li> <li>1～4号機建屋周辺関連工事 (エリアW)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアX)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアm)</li> <li>エリア整理のための移動 (エリアn)</li> </ul>	
	P2	6,700 m <sup>3</sup>	6,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	91%			
	W	11,600 m <sup>3</sup>	9,100 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	78%			
	X	7,900 m <sup>3</sup>	7,200 m <sup>3</sup>	-600 m <sup>3</sup>	91%			
	m	4,400 m <sup>3</sup>	800 m <sup>3</sup>	+300 m <sup>3</sup>	18%			
	n	8,700 m <sup>3</sup>	6,500 m <sup>3</sup>	-500 m <sup>3</sup>	75%			
覆土式一時保管施設、容器 (1～30mSv/h)	E2※2	1,200 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	33%	16,400 / 17,200 95%		
	L	16,000 m <sup>3</sup>	16,000 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	100%			
固体廃棄物貯蔵庫※2		39,600 m <sup>3</sup>	29,400 m <sup>3</sup>	+300 m <sup>3</sup>	74%	29,400 / 39,600 74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>主な増減理由</li> <li>エリア整理のための移動、1～4号機建屋周辺関連工事</li> </ul>	
合計		509,900 m <sup>3</sup>	391,000 m <sup>3</sup>	+1,500 m <sup>3</sup>	77%			
伐採木	屋外集積 (幹・根・枝・葉)	G	40,000 m <sup>3</sup>	19,500 m <sup>3</sup>	-2,700 m <sup>3</sup>	49%	74,400 / 134,000 56%	<ul style="list-style-type: none"> <li>主な増減理由</li> <li>焼却前処理及び増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却 (エリアG)</li> <li>焼却前処理のための取り出し (エリアH)</li> <li>増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却 (エリアM)</li> </ul>
		H	43,000 m <sup>3</sup>	26,700 m <sup>3</sup>	-2,100 m <sup>3</sup>	62%		
		M	45,000 m <sup>3</sup>	25,800 m <sup>3</sup>	-300 m <sup>3</sup>	57%		
		V	6,000 m <sup>3</sup>	2,400 m <sup>3</sup>	+100 m <sup>3</sup>	40%		
	一時保管槽 (枝・葉)	G	29,700 m <sup>3</sup>	26,200 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	88%	37,300 / 41,600 90%	
T	11,900 m <sup>3</sup>	11,100 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	94%				
合計		175,600 m <sup>3</sup>	111,700 m <sup>3</sup>	-5,100 m <sup>3</sup>	64%			
使用済保護衣等※3	屋外集積	25,300 m <sup>3</sup>	18,900 m <sup>3</sup>	+1,200 m <sup>3</sup>	75%			
放射性固体廃棄物 (焼却灰等) ※4	固体廃棄物貯蔵庫	63,700 m <sup>3</sup>	38,100 m <sup>3</sup>	微増 m <sup>3</sup>	60%			

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。また、50m<sup>3</sup>未満の保管量を微量、50m<sup>3</sup>未満の増減を微増・微減と示している。

※2 水処理二次廃棄物 (小型フィルタ等) を含む。


※3 エリアAA、エリアk、エリアlは、使用済保護衣等の保管も行うが、主に瓦礫類を保管するため、使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

※4 ドラム缶1本を0.2m<sup>3</sup>、ボックスコンテナ1個を0.8m<sup>3</sup>として換算している。


# 水処理二次廃棄物の管理状況(2023.7.6時点)

分類	保管場所	種類	保管量		前回集約からの増減		保管量 / 保管容量 割合		トピックス
			数量	単位	数量	単位	数量	単位	
水処理二次廃棄物	使用済吸着塔 保管施設	セシウム吸着装置使用済ベッセル	779	本	0	本	5,594 / 6,500 86%		
		第二セシウム吸着装置使用済ベッセル	263	本	+4	本			
		第三セシウム吸着装置使用済ベッセル	18	本	0	本			
		多核種除去設備等保管容器	4,198	基	+7	基			
		高性能多核種除去設備使用済ベッセル	90	本	0	本			
		多核種除去設備処理カラム	17	塔	0	塔			
		モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類	229	本	0	本			
廃スラッジ 貯蔵施設	廃スラッジ	418	m <sup>3</sup>	-69	m <sup>3</sup>	418 / 700 60%	• 造粒固化体貯槽(D)周辺の除染作業を実施中		
濃縮廃液タンク	濃縮廃液	9,469	m <sup>3</sup>	+11	m <sup>3</sup>	9,469 / 10,300 92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• タンク水位の変動は、計器精度±1%の誤差範囲内(現場パトロール異常なし)</li> <li>• 水位計0%以上の保管量： 9,369 m<sup>3</sup></li> <li>• タンク底部～水位計の保管量(DS)： 約 100 m<sup>3</sup></li> </ul>		

# 福島第一原子力発電所 固体廃棄物等保管エリアの構内配置図

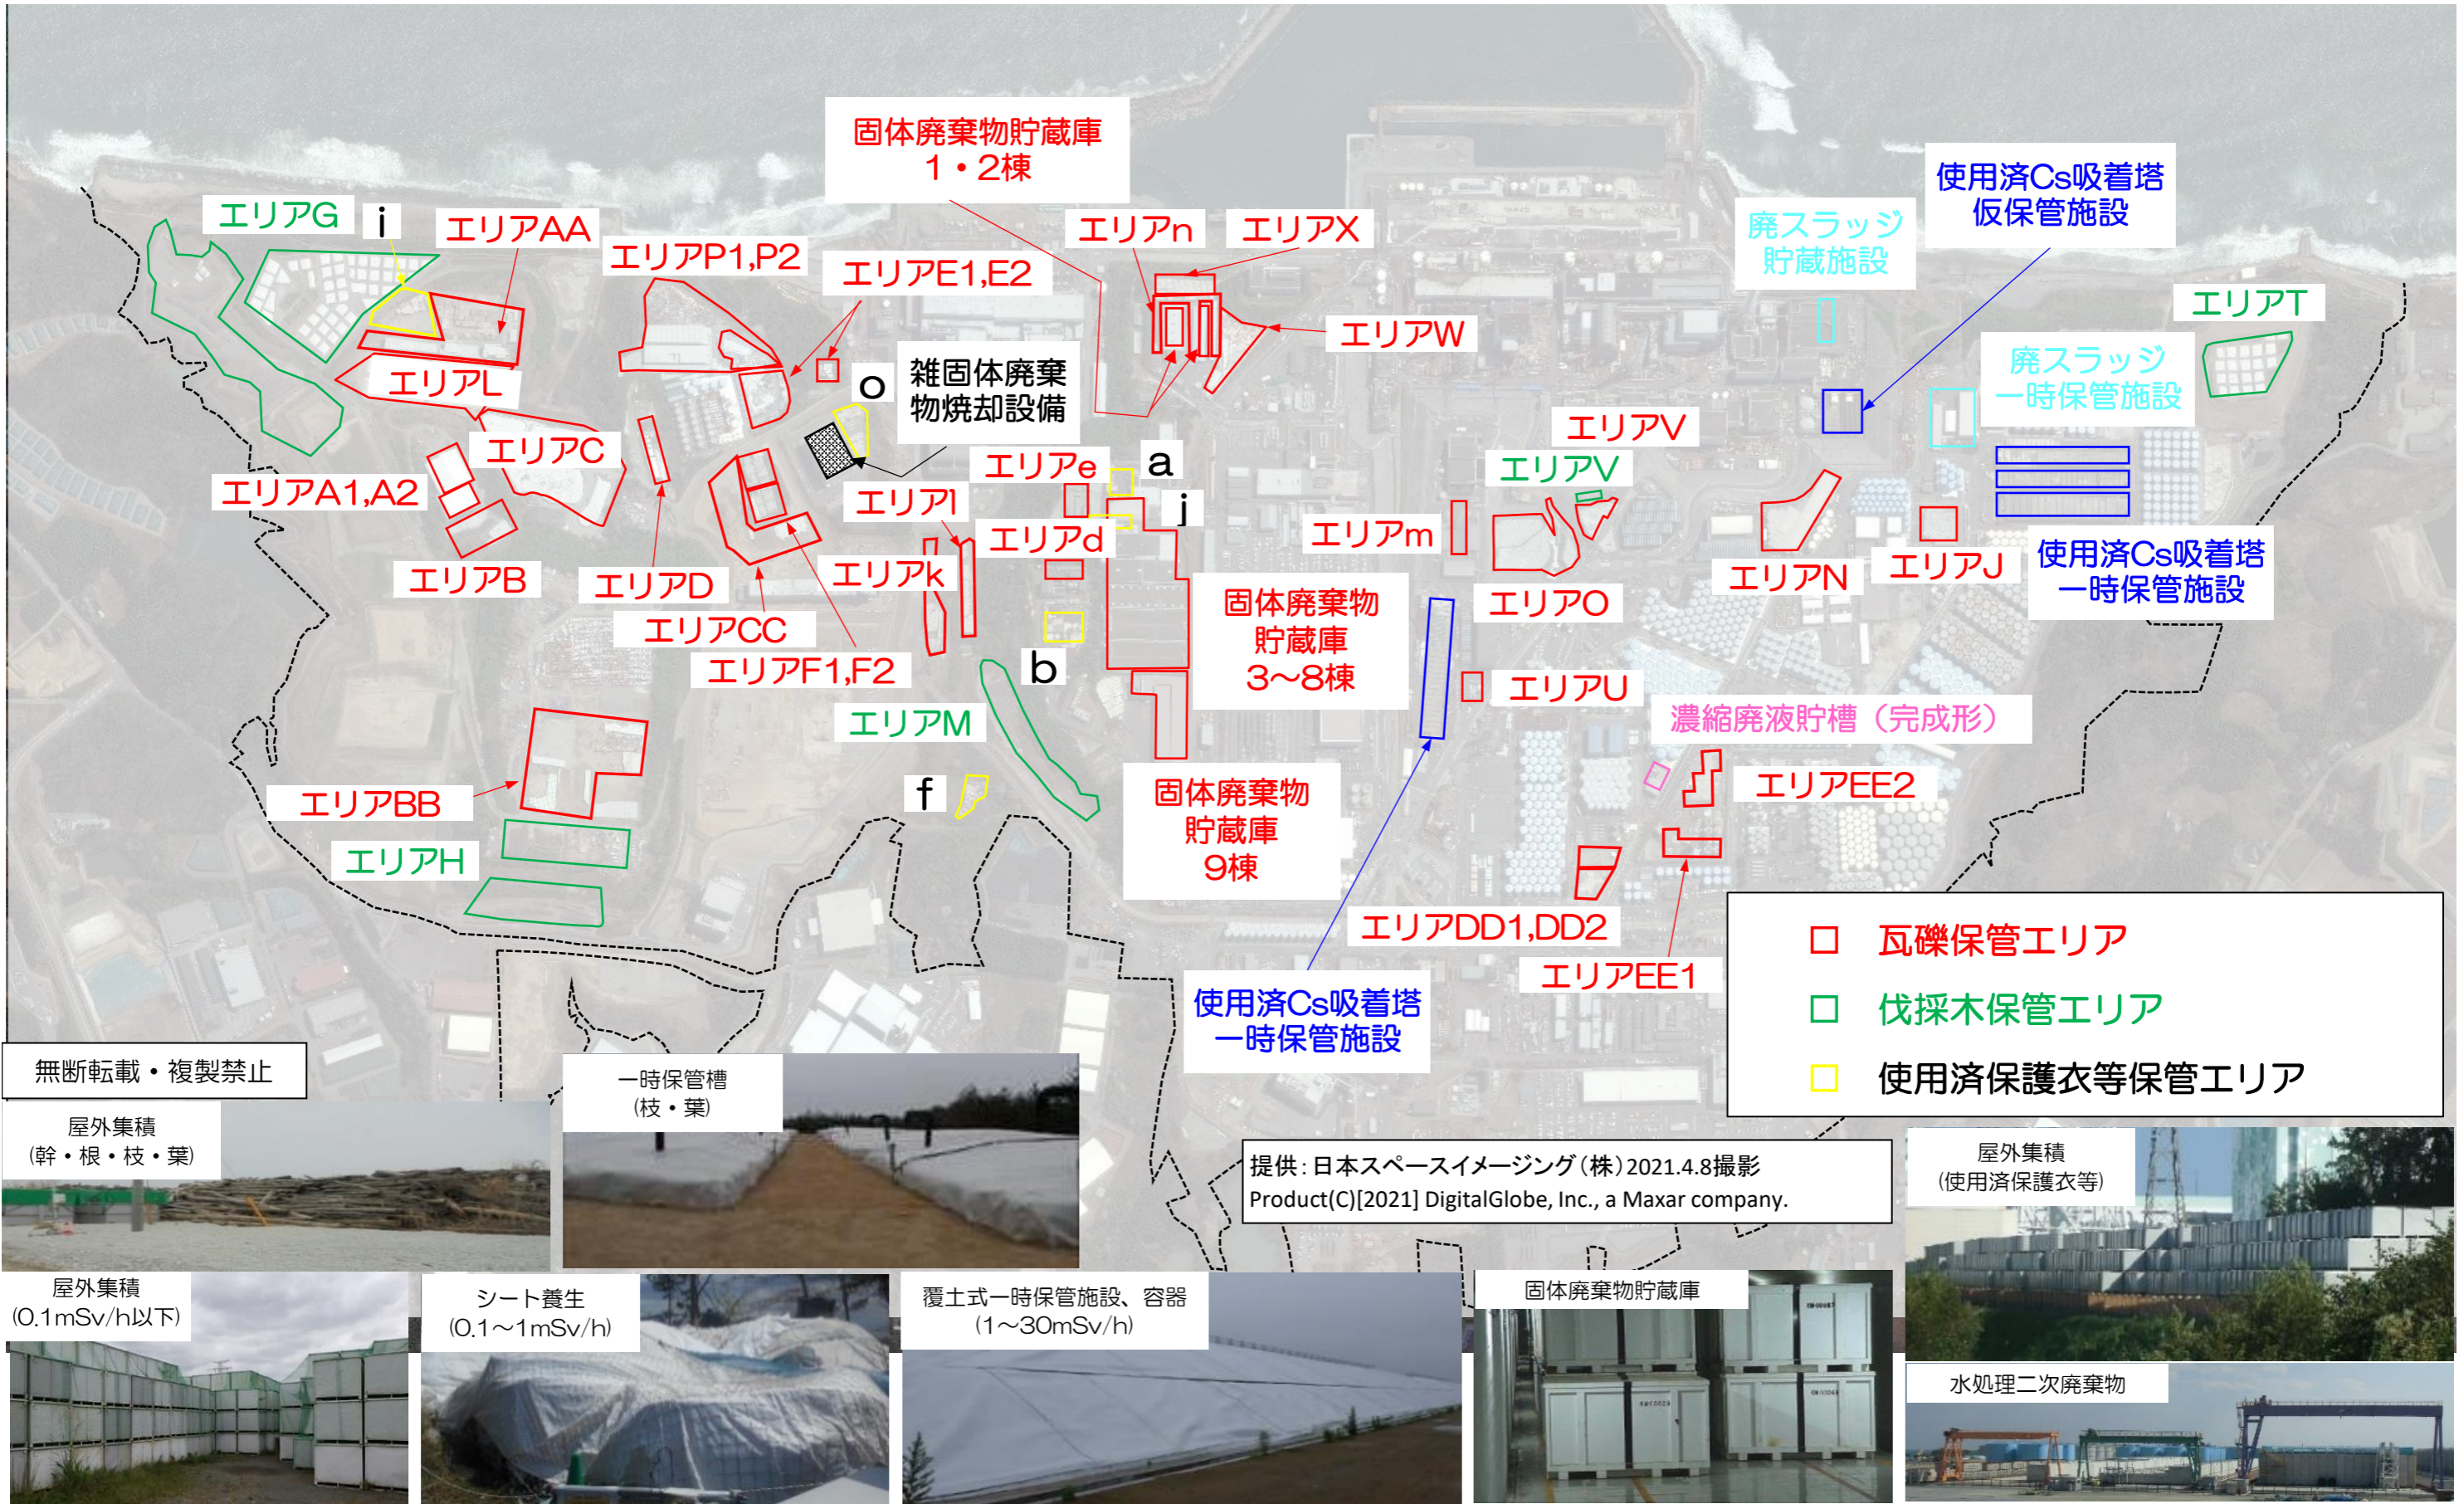

### 瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2023.6.30時点)

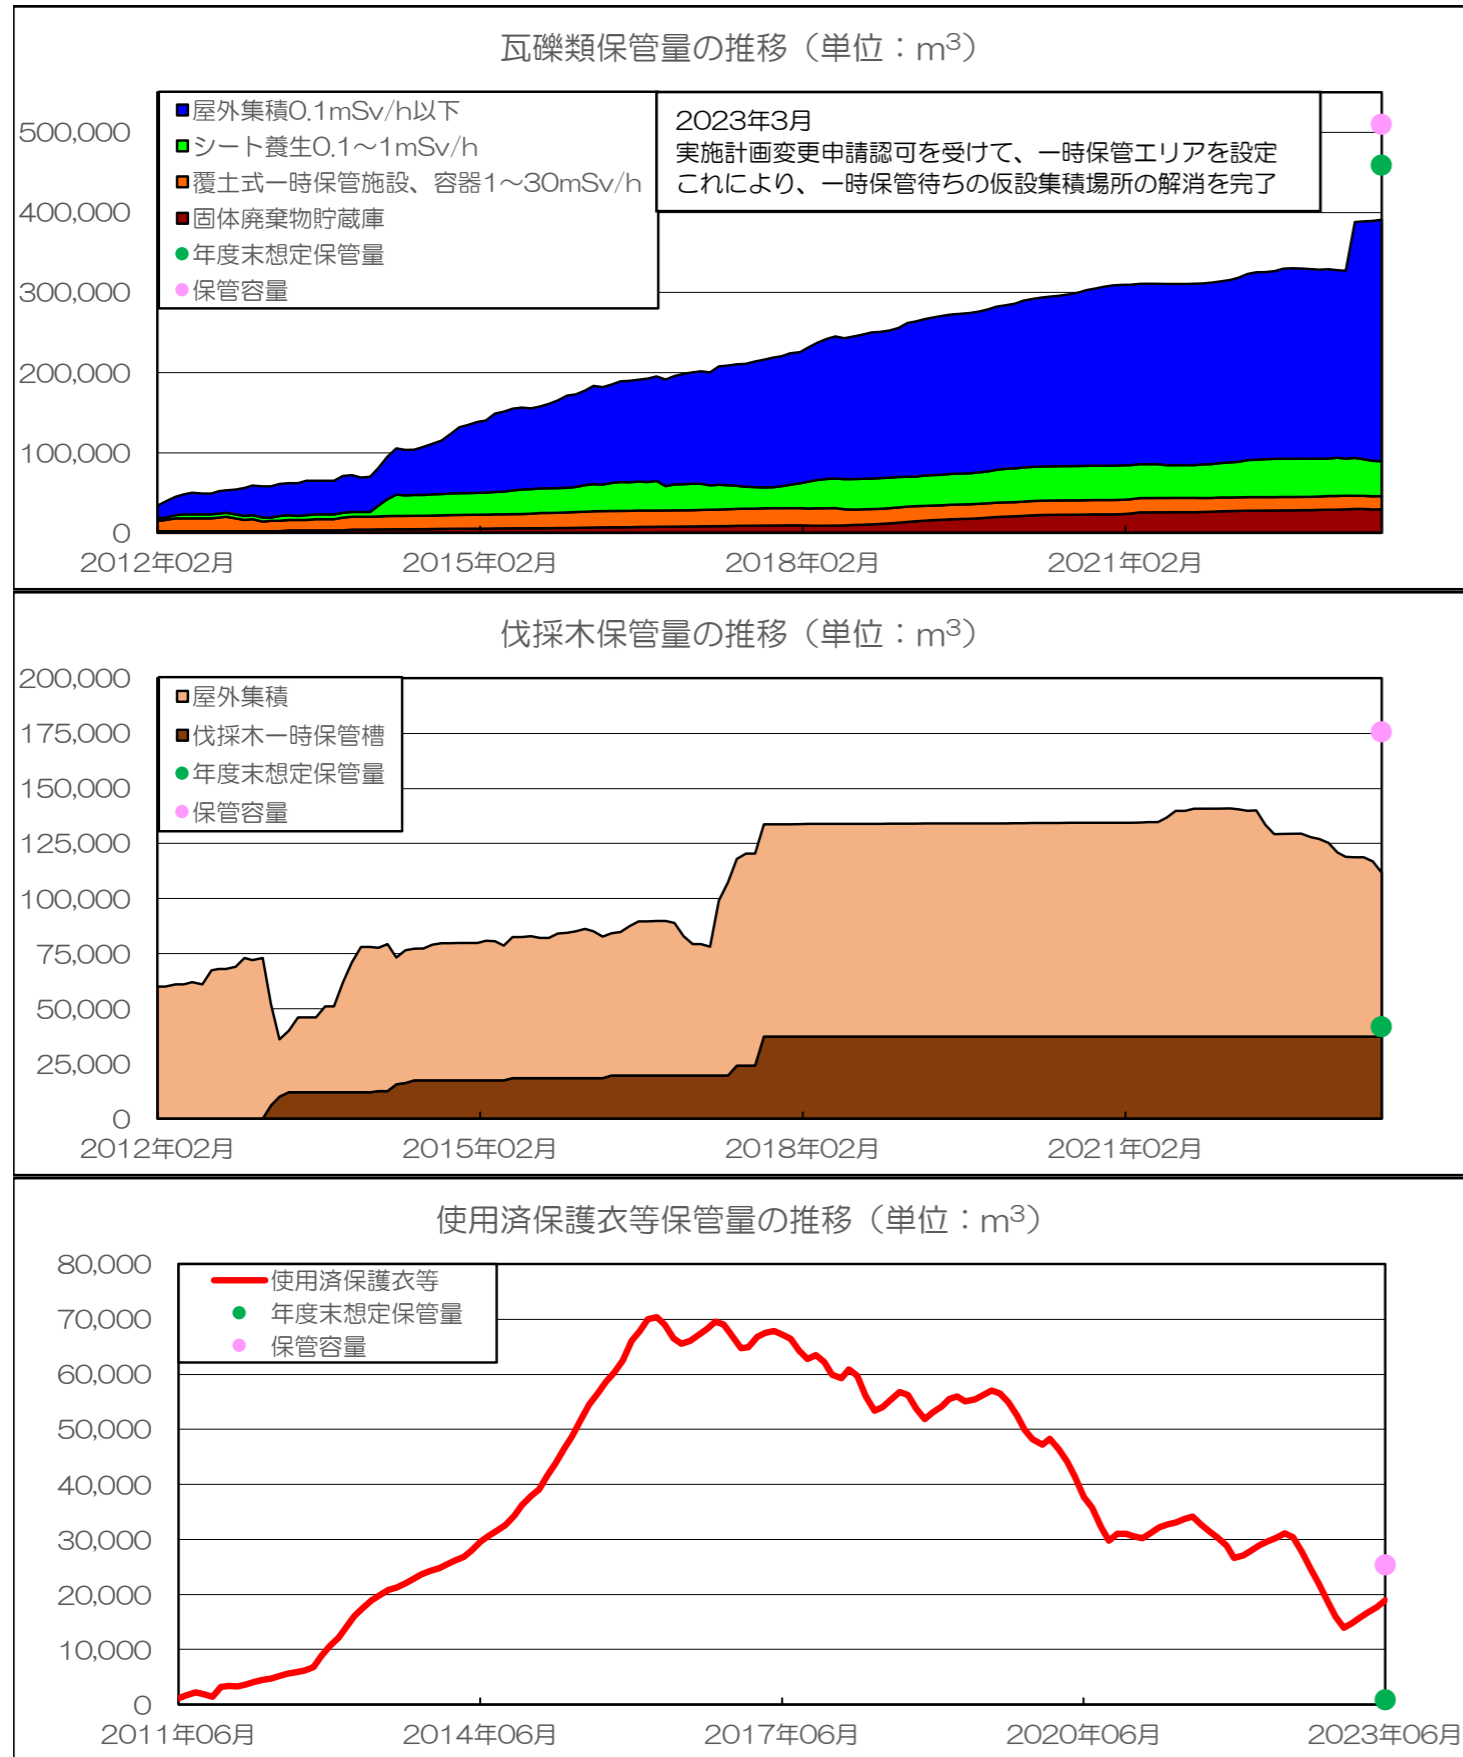

### 水処理二次廃棄物の管理状況(2023.7.6時点)

