

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年7月3日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

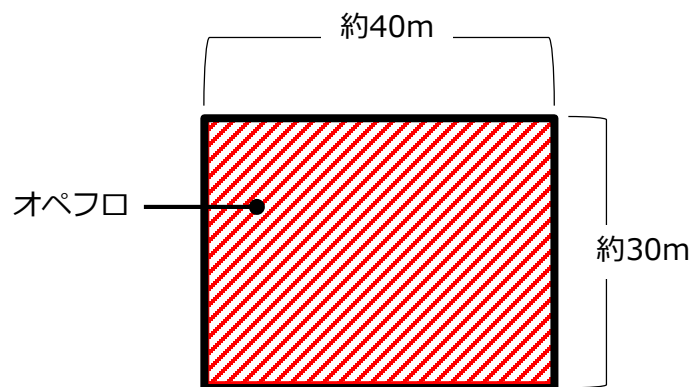
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

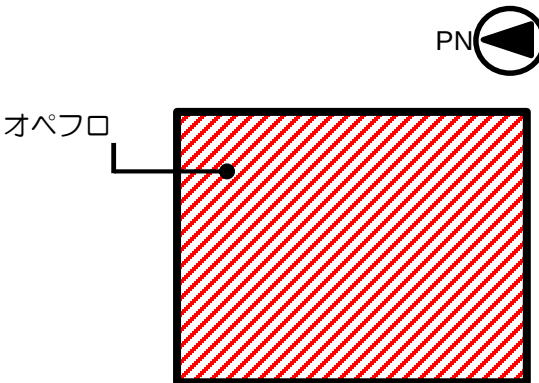
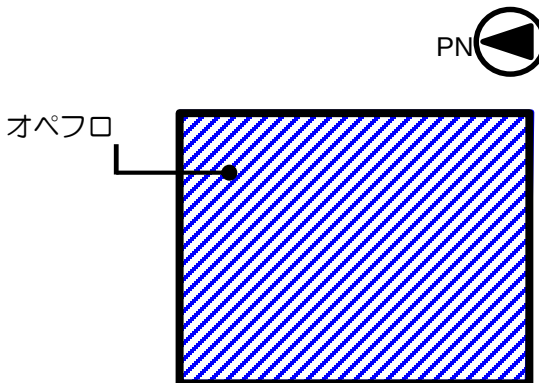
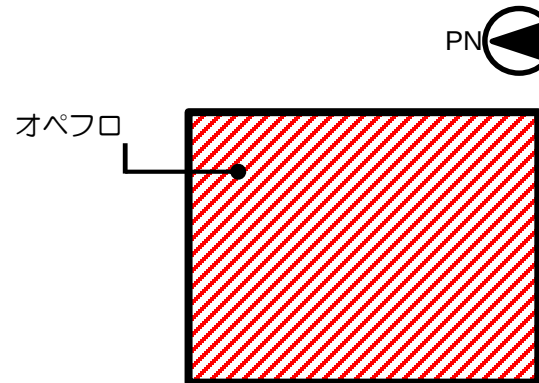


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（6月）	実績（6月）	計画（7月）
完了予定日：6月 17日 	完了日：6月 25日 	完了予定日：7月 23日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年7月2日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

5月	金	25（日）	26（月）	27（火）	28（水）	29（木）	30（金）	31（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	○	－	－	－	－	－	－
	散布実施	○	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※13	7.57E-05（最大） ND（最小）	7.65E-05（最大） ND（最小）	7.96E-05（最大） ND（最小）	9.17E-05（最大） ND（最小）	7.73E-05（最大） ND（最小）	1.01E-04（最大） ND（最小）	8.63E-05（最大） ND（最小）
6月	土	1（日）	2（月）	3（火）	4（水）	5（木）	6（金）	7（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※14	5.84E-05（最大） ND（最小）	9.46E-05（最大） ND（最小）	7.84E-05（最大） ND（最小）	6.75E-05（最大） ND（最小）	6.14E-05（最大） ND（最小）	8.64E-05（最大） ND（最小）	7.05E-05（最大） ND（最小）
	日	8（日）	9（月）	10（火）	11（水）	12（木）	13（金）	14（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※15	1.26E-04（最大） ND（最小）	1.04E-04（最大） ND（最小）	8.86E-05（最大） ND（最小）	9.17E-05（最大） ND（最小）	9.98E-05（最大） ND（最小）	5.95E-05（最大） ND（最小）	7.31E-05（最大） ND（最小）
	月	15（日）	16（月）	17（火）	18（水）	19（木）	20（金）	21（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	○	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※16	8.11E-05（最大） ND（最小）	8.06E-05（最大） ND（最小）	6.51E-05（最大） ND（最小）	7.85E-05（最大） ND（最小）	9.44E-05（最大） ND（最小）	1.01E-04（最大） ND（最小）	8.26E-05（最大） ND（最小）
	火	22（日）	23（月）	24（火）	25（水）	26（木）	27（金）	28（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	○	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※17	7.29E-05（最大） ND（最小）	9.16E-05（最大） ND（最小）	1.01E-04（最大） ND（最小）	7.47E-05（最大） ND（最小）	6.24E-05（最大） ND（最小）	7.96E-05（最大） 7.46E-07（最小）	9.30E-05（最大） ND（最小）
7月	水	29（日）	30（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※18	1.01E-04（最大） ND（最小）	8.87E-05（最大） ND（最小）	8.87E-05（最大） ND（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）	－（最大） －（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年7月2日時点
