


福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

号機	1号機		2号機		3号機		4号機	
	3月6日	3月27日	3月6日	3月27日	3月6日	3月27日	3月6日	3月27日
原子炉注水状況	給水系：2.5m ³ /h CS系：2.0m ³ /h (3/6 11:00 現在)	給水系：2.5m ³ /h CS系：1.9m ³ /h (3/27 11:00 現在)	給水系：2.0m ³ /h CS系：3.6m ³ /h (3/6 11:00 現在)	給水系：2.0m ³ /h CS系：3.5m ³ /h (3/27 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：5.5m ³ /h ※1 (3/6 11:00 現在)	給水系：2.1m ³ /h CS系：3.6m ³ /h (3/27 11:00 現在)		
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：17.5℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：17.8℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：17.7℃ (3/6 11:00 現在)	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)：19.8℃ 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)：20.2℃ VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)：20.1℃ (3/27 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：30.3℃ RPV温度 (TE-2-3-69R)：30.6℃ (3/6 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)：33.6℃ RPV温度 (TE-2-3-69R)：34.2℃ (3/27 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1)：29.6℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：29.8℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：21.3℃ (3/6 11:00 現在)	RPV下部ヘッド温度 (TE-2-3-69L1)：32.6℃ スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)：32.6℃ RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)：24.4℃ (3/27 11:00 現在)		
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：18.7℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：17.2℃ (3/6 11:00 現在)	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)：21.0℃ HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)：19.7℃ (3/27 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：30.8℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1)：30.6℃ (3/6 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)：34.9℃ SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2- 16B (TE-16-114G#1)：34.0℃ (3/27 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：28.3℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：26.7℃ (3/6 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A)：31.5℃ 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)：30.1℃ (3/27 11:00 現在)	—	—
原子炉格納容器 圧力	107.2kPa abs (3/6 11:00 現在)	107.2kPa abs (3/27 11:00 現在)	6.59kPa g (3/6 11:00 現在)	5.45kPa g (3/27 11:00 現在)	0.27kPa g (3/6 11:00 現在)	0.26kPa g (3/27 11:00 現在)		
窒素封入流量 ※2	RPV：13.03Nm ³ /h PCV：20.48Nm ³ /h (3/6 11:00 現在)	RPV：13.15Nm ³ /h PCV：20.67Nm ³ /h (3/27 11:00 現在)	RPV：16.38Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※3 (3/6 11:00 現在)	RPV：16.45Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※3 (3/27 11:00 現在)	RPV：16.83Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※3 (3/6 11:00 現在)	RPV：16.84Nm ³ /h PCV：-Nm ³ /h ※3 (3/27 11:00 現在)		
原子炉格納容器 水素濃度 ※4	A系：0.18vol% B系：-vol% ※5 (3/6 11:00 現在)	A系：0.00vol% B系：0.00vol% (3/27 11:00 現在)	A系：0.04vol% B系：0.04vol% (3/6 11:00 現在)	A系：0.07vol% B系：0.06vol% (3/27 11:00 現在)	A系：0.17vol% B系：0.17vol% (3/6 11:00 現在)	A系：0.16vol% B系：0.16vol% (3/27 11:00 現在)		
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135)	A系：1.21E-03Bq/cm ³ B系：- ※5 (3/6 11:00 現在)	A系：1.58E-03Bq/cm ³ B系：1.29E-03Bq/cm ³ (3/27 11:00 現在)	A系：ND(2.3E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.2E-01Bq/cm ³ 以下) (3/6 11:00 現在)	A系：ND(2.3E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(2.2E-01Bq/cm ³ 以下) (3/27 11:00 現在)	A系：ND(3.3E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(3.4E-01Bq/cm ³ 以下) (3/6 11:00 現在)	A系：ND(3.4E-01Bq/cm ³ 以下) B系：ND(3.4E-01Bq/cm ³ 以下) (3/27 11:00 現在)		
使用済燃料 プール水温度	12.0℃ (3/6 11:00 現在)	14.0℃ (3/27 11:00 現在)	12.6℃ (3/6 11:00 現在)	13.6℃ (3/27 11:00 現在)	10.1℃ (3/6 11:00 現在)	11.5℃ (3/27 11:00 現在)	21℃ (3/6 11:00 現在)	22℃ (3/27 11:00 現在)
FPC 貯蔵タンク 水位	3.22m (3/6 11:00 現在)	2.50m (3/27 11:00 現在)	3.77m (3/6 11:00 現在)	3.34m (3/27 11:00 現在)	5.34m (3/6 11:00 現在)	3.57m (3/27 11:00 現在)	34.23×100mm (3/6 11:00 現在)	48.80×100mm (3/27 11:00 現在)


※1: 作業に伴い、原子炉注水流量変更中
※2: 使用状態の温度・圧力で流量補正した値を記載する。
※3: 窒素封入停止中
※4: 指示値がマイナスの場合は0.00vol%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計器精度によりマイナス表示される場合があるため)
※5: 計器点検に伴いデータ欠測

※ 1～3号機の原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、約15℃～約40℃(3/27現在)である。
格納容器内圧力や格納容器からの放射性物質の放出量等のパラメータについては有意な変動はなく、総合的に冷温停止状態を維持と判断。


1号機

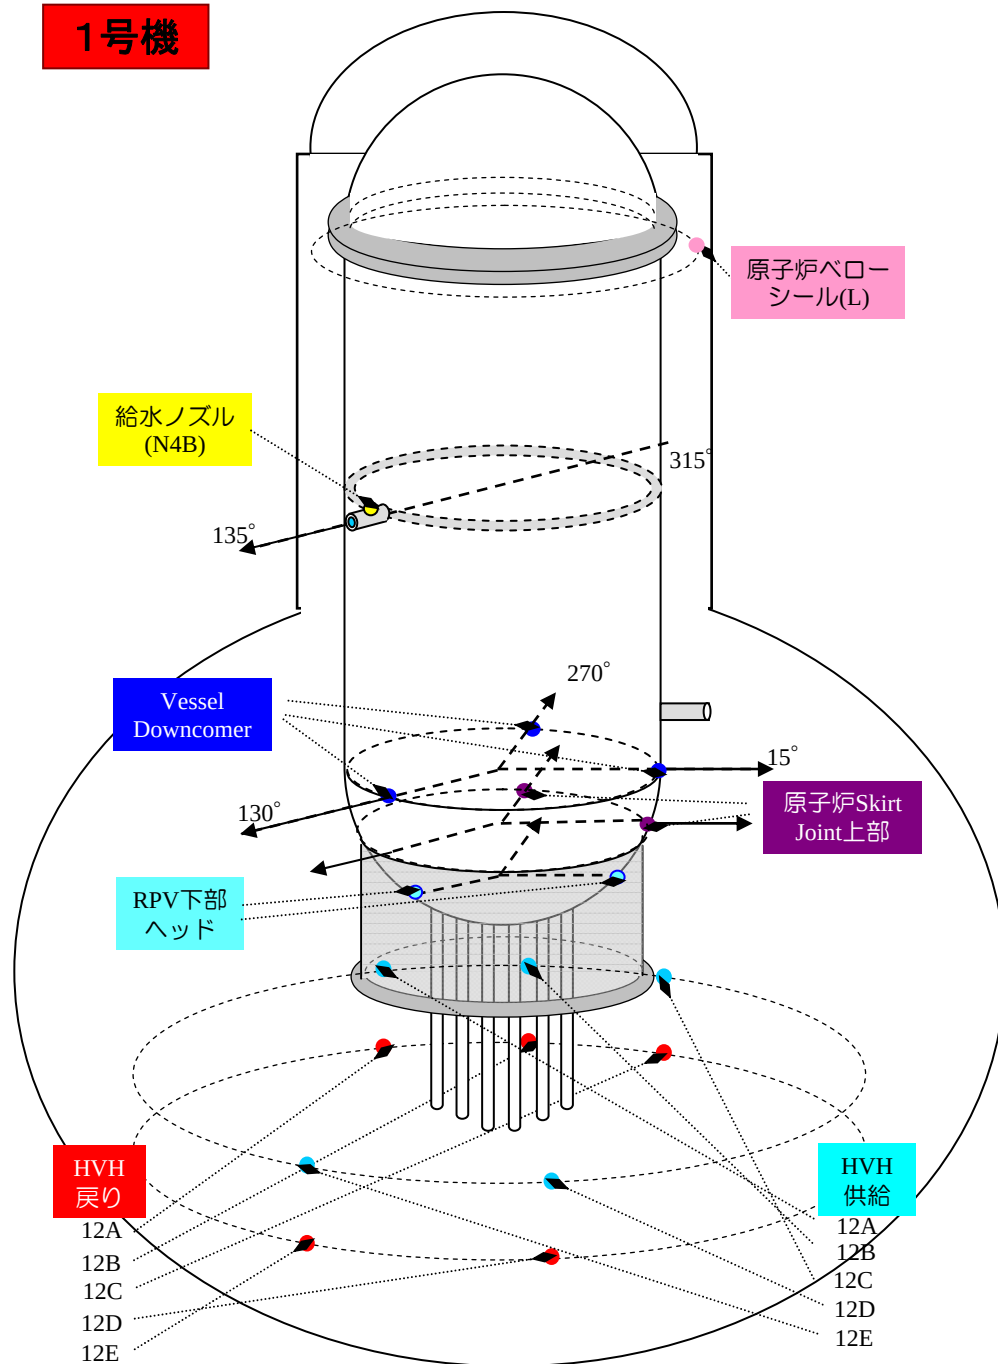


1号機 原子炉圧力容器まわり温度(12/22~3/27)

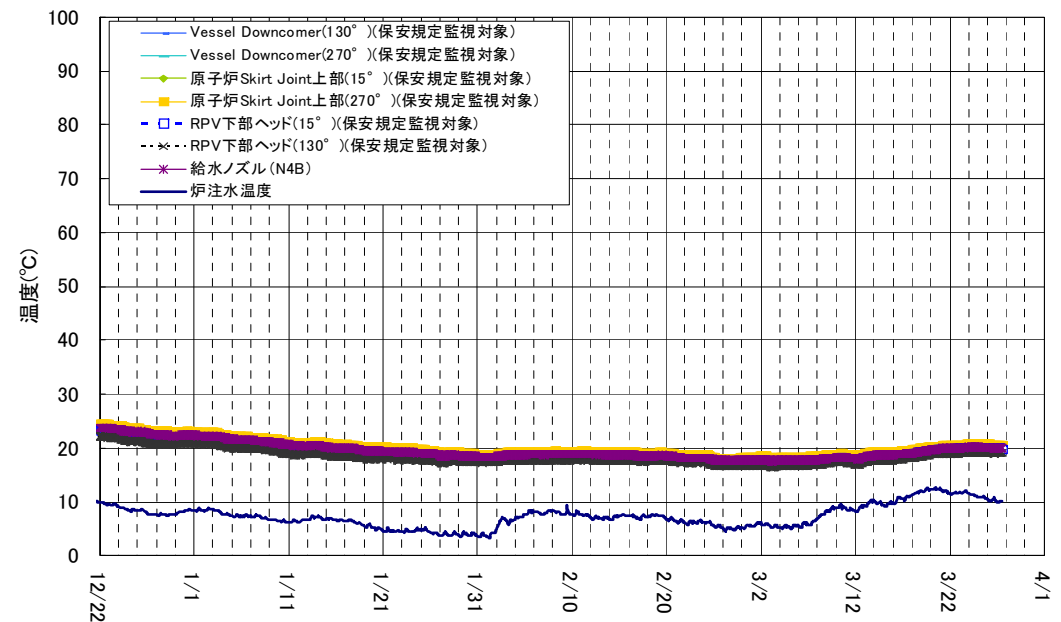


1号機 D/W雰囲気温度(12/22~3/27)

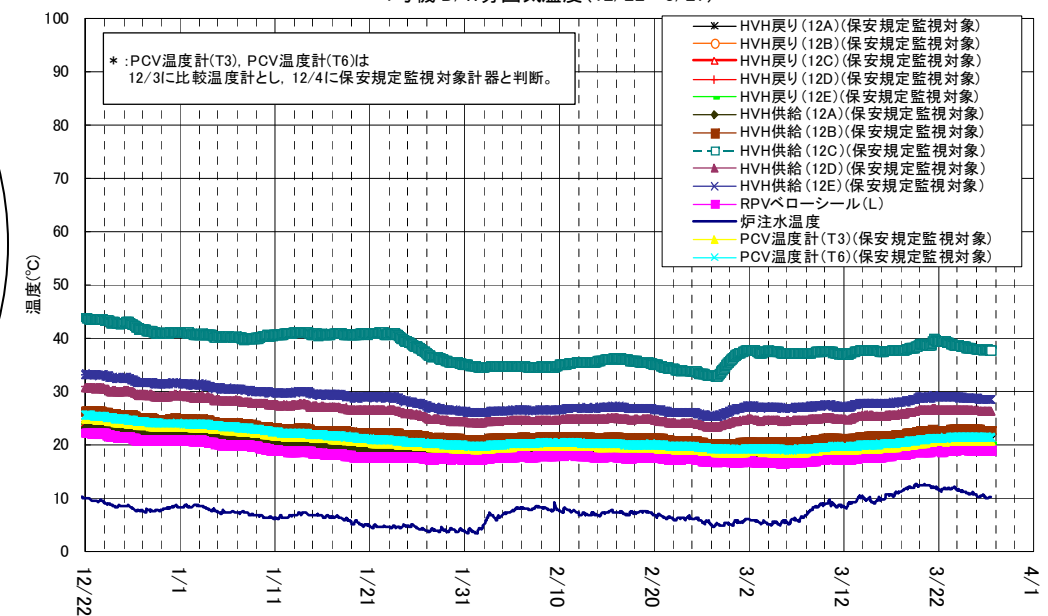


2号機

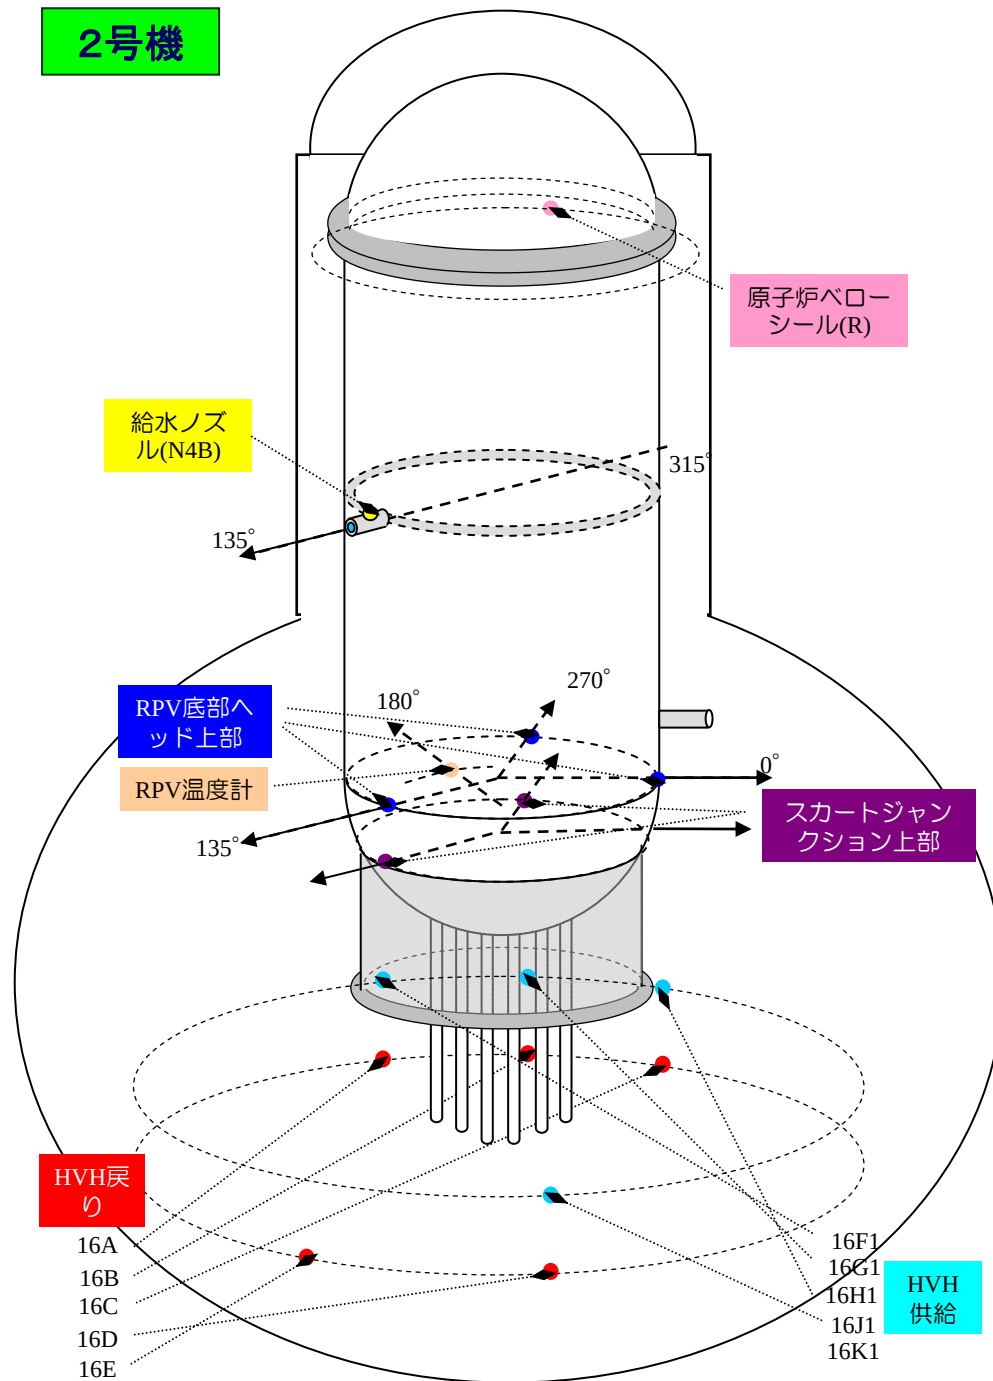


2号機 原子炉压力容器まわり温度 (12/22~3/27)

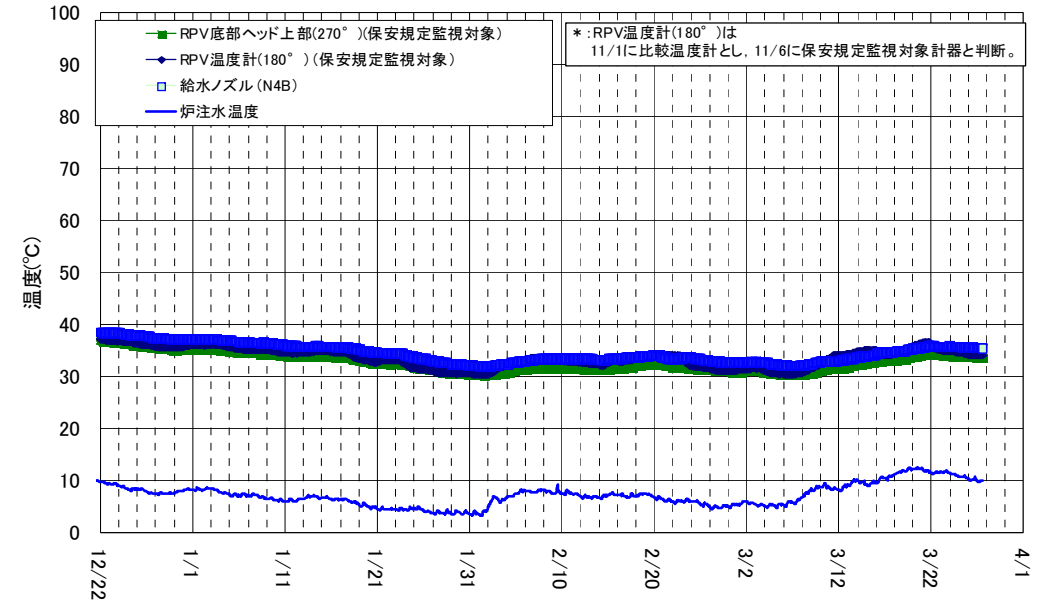


2号機 D/W雰囲気温度 (12/22~3/27)

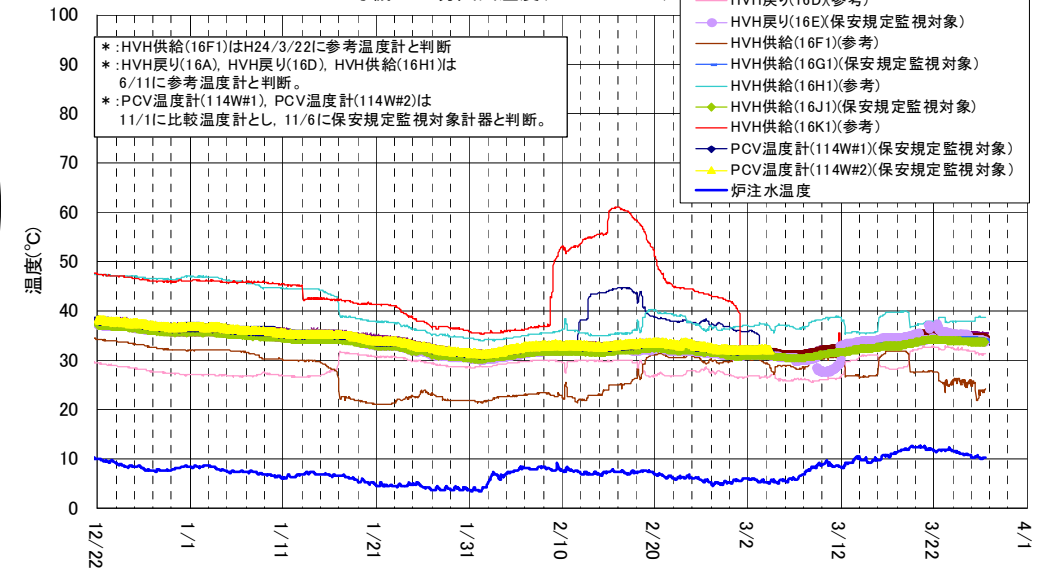

3号機

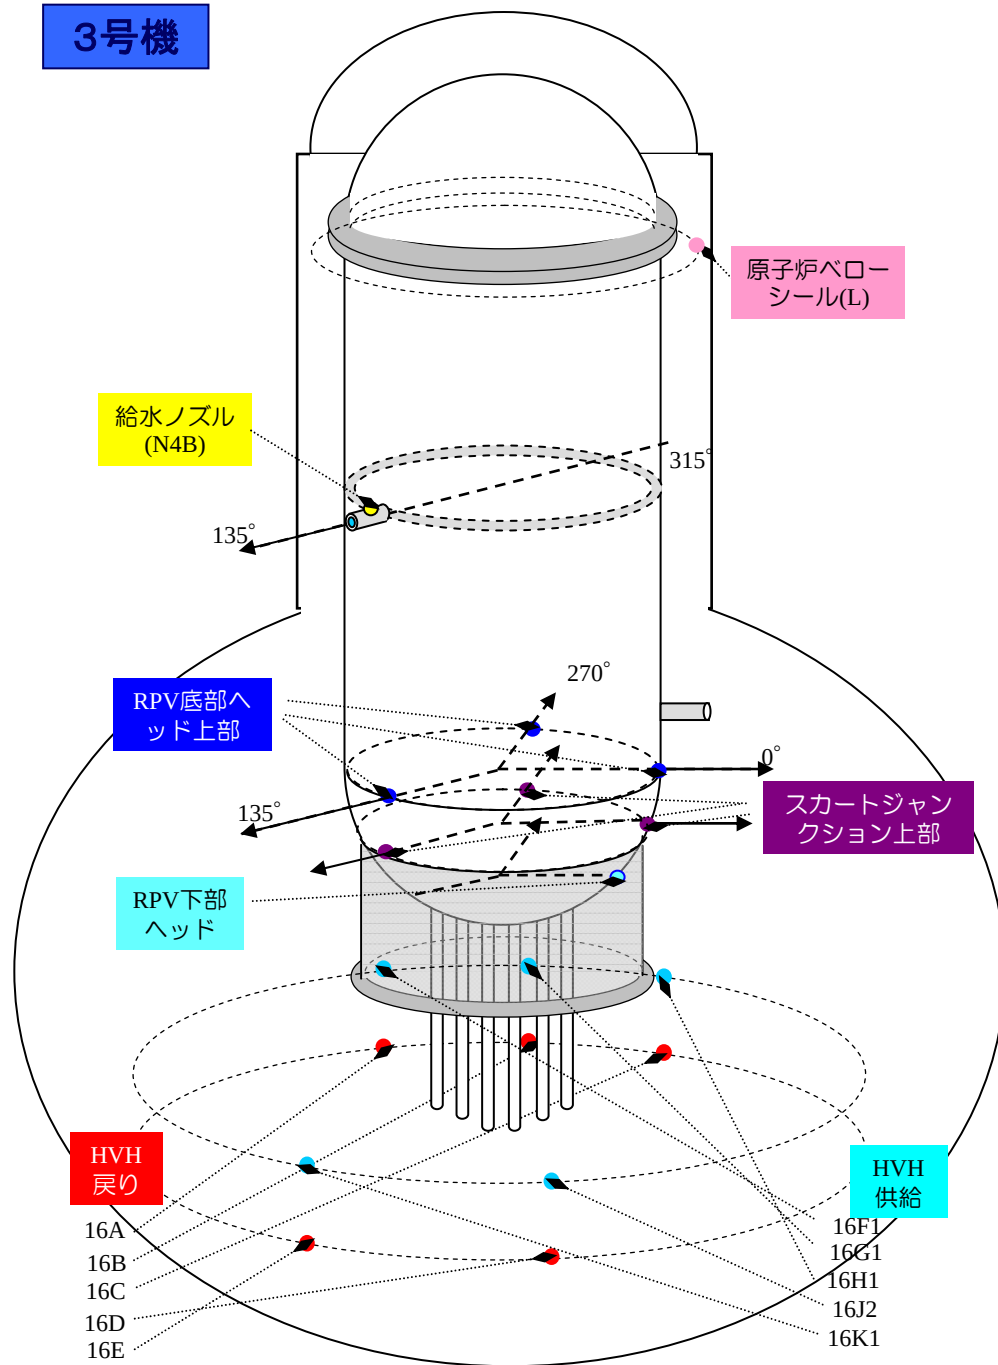

3号機 原子炉圧力容器まわり温度(12/22~3/27)

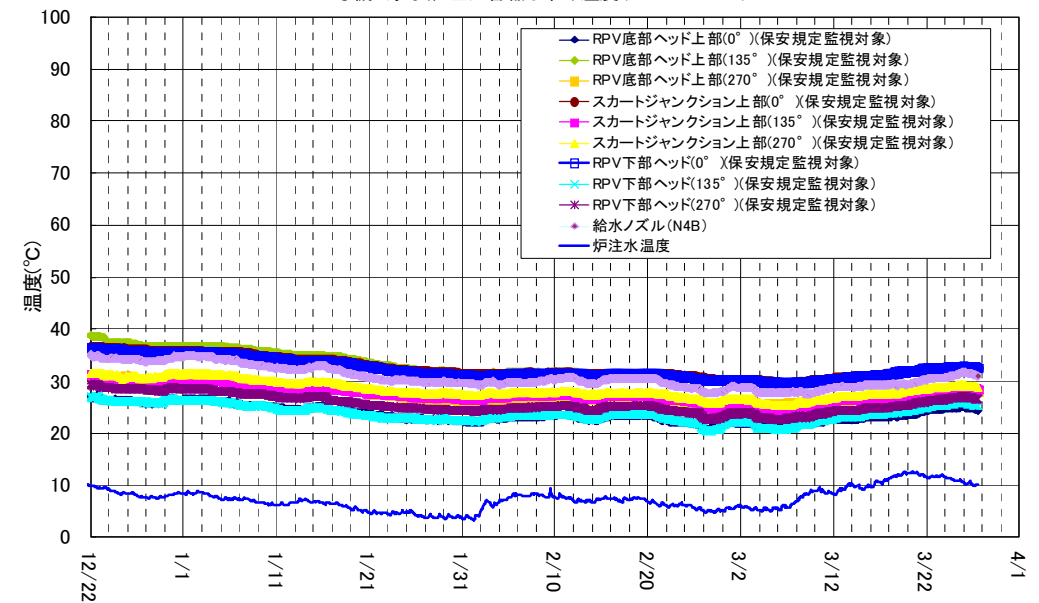

3号機 D/W雰囲気温度(12/22~3/27)

