

ガレキ・伐採木の管理状況(2014. 6.30時点)

保管場所	エリア境界 空間線量率 (mSv/h)	種類	保管方法	保管量※1		前回報告比※2 (2014.5.31)		変動理由※3	エリア※4 占有率
				数量	単位	増減	単位		
固体廃棄物貯蔵庫	0.03	ガレキ	容器	4,500	m <sup>3</sup>	微増	m <sup>3</sup>	—	37%
A:敷地北側	0.50	ガレキ	仮設保管設備	2,400	m <sup>3</sup>	微増	m <sup>3</sup>	—	33%
C:敷地北側	0.01	ガレキ	屋外集積	37,400	m <sup>3</sup>	+500	m <sup>3</sup>	①②	66%
D:敷地北側	0.01	ガレキ	シート養生	2,600	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	88%
E:敷地北側	0.02	ガレキ	シート養生	4,400	m <sup>3</sup>	+400	m <sup>3</sup>	②	61%
F:敷地北側	0.01	ガレキ	容器	600	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	99%
J:敷地南側	0.03	ガレキ	屋外集積	4,600	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	96%
L:敷地北側	0.01未満	ガレキ	覆土式一時保管施設	8,000	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	100%
O:敷地南西側	0.03	ガレキ	屋外集積	13,800	m <sup>3</sup>	-800	m <sup>3</sup>	③	50%
Q:敷地西側	0.15	ガレキ	容器	5,700	m <sup>3</sup>	微増	m <sup>3</sup>	—	93%
U:敷地南側	0.01未満	ガレキ	屋外集積	700	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	100%
W:敷地西側	0.04	ガレキ	シート養生	19,100	m <sup>3</sup>	+100	m <sup>3</sup>	②	65%
合計(ガレキ)				103,900	m <sup>3</sup>	+400	m <sup>3</sup>	—	64%
G:敷地北側	0.01未満	伐採木	伐採木一時保管槽	7,300	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	27%
H:敷地北側	0.01	伐採木	屋外集積	12,800	m <sup>3</sup>	-500	m <sup>3</sup>	③	72%
I:敷地北側	0.02	伐採木	屋外集積	10,500	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	100%
M:敷地西側	0.01	伐採木	屋外集積	36,500	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	81%
T:敷地南側	0.01	伐採木	伐採木一時保管槽	10,100	m <sup>3</sup>	+1,200	m <sup>3</sup>	④	44%
V:敷地西側	0.02	伐採木	屋外集積	0	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	—	0%
合計(伐採木)				77,200	m <sup>3</sup>	+700	m <sup>3</sup>	—	56%

※1 端数処理で100m<sup>3</sup>未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。

※2 100m<sup>3</sup>未満を端数処理しており、微増・微減とは100m<sup>3</sup>未満の増減を示す。

※3 主な変動理由: ①タンク設置関連工事 ②凍土遮水壁設置関連工事  
③エリア内の保管物整理 ④チップ化した枝葉の搬入 等


※4 ガレキ等の積上げ高さの変更等による保管容量の増加。

水処理二次廃棄物の管理状況(2014. 7.29時点)


保管場所	種類	保管量		前回からの増減 (2014.6.24)		保管量/保管容量
		数量	単位	増減	単位	
使用済セシウム吸着塔 保管施設	セシウム吸着装置使用済ベッセル	514	本	0	本	40%
	第二セシウム吸着装置使用済ベッセル	110	本	+2	本	
	多核種除去設備保管容器	365	基	+35	基	
	多核種除去設備処理カラム	3	塔	0	塔	
	モバイル式処理装置使用済ベッセル	20	本	+2	本	
廃スラッジ貯蔵施設	廃スラッジ	597	m <sup>3</sup>	0	m <sup>3</sup>	85%



### ガレキ保管量の推移

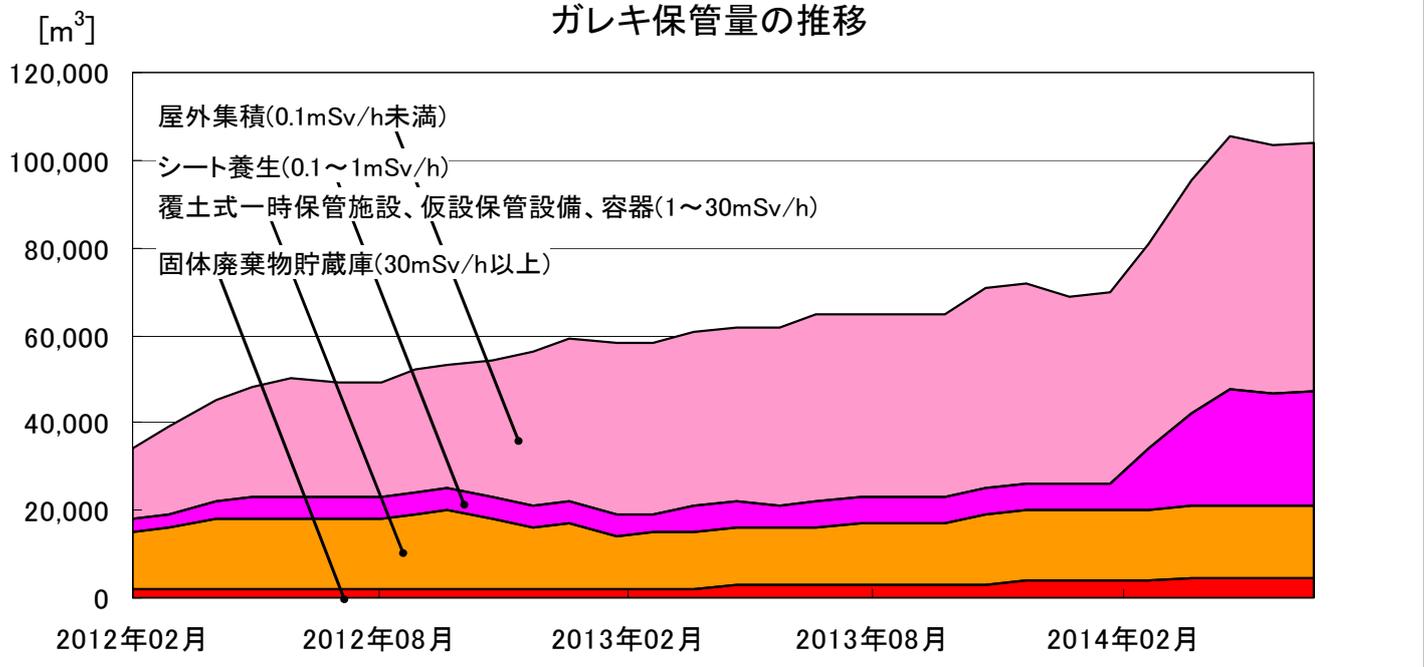

### 伐採木保管量の推移

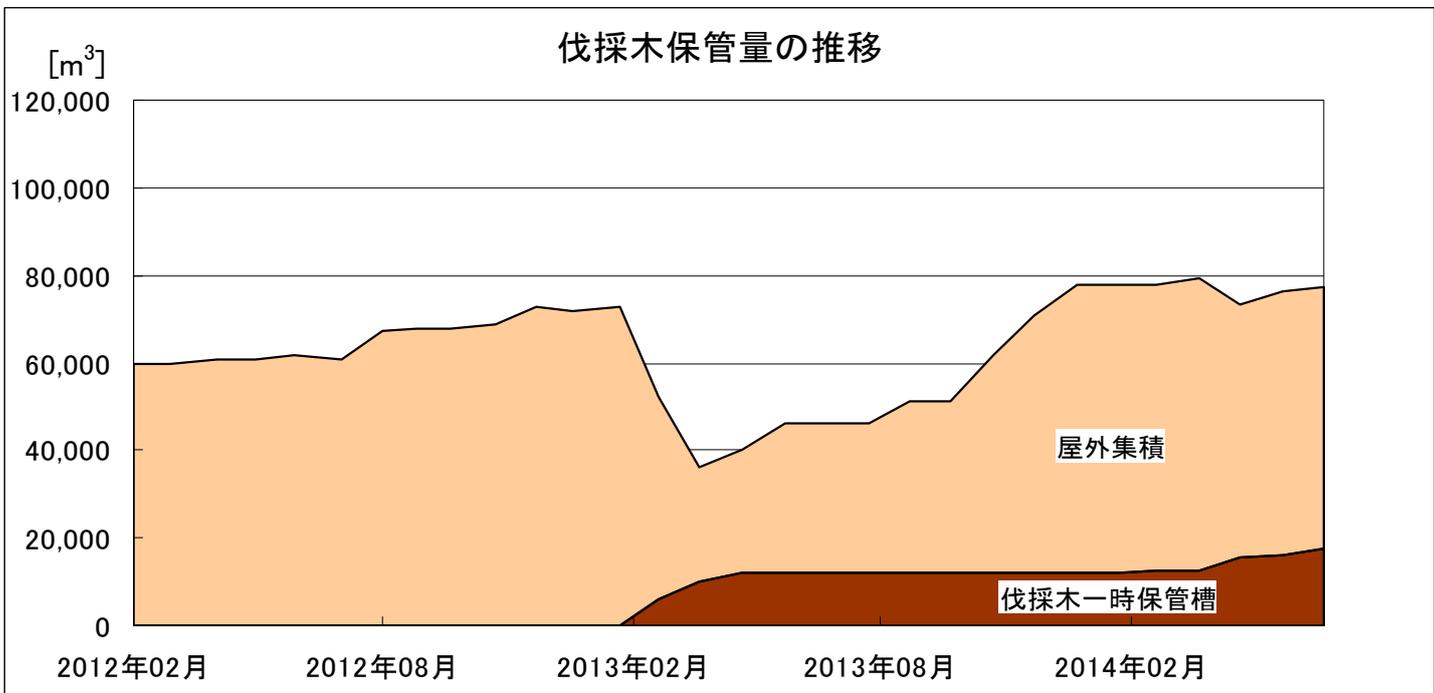

### 水処理二次廃棄物保管量の推移

