

1F4、共用プールにおける クレーン・燃料取扱機等の点検ならびに 4号機燃料取り出し作業の再開について

平成26年9月25日

東京電力株式会社




無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

1

概要

- ① 2013年11月から、4号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を実施中(2014年6月30日時点:新燃料22体, 使用済燃料1166体, 合計1188体共用プールへ移送済み)。次の②、③により一時中断。
- ② 燃料取り出し作業に使用しているクレーン・燃料取扱機等について、法令等に基づき点検を実施。機器のトラブル等なく点検作業は終了。
- ③ 共用プールでは、4号機の変形燃料等を保管するための使用済燃料貯蔵ラックの取り替え工事を実施(ラック据付まで完了。9月18,19日に行う性能確認は、燃料取り出し作業と干渉しないよう実施)。
- ④ 上記②及び③が完了したため、燃料取り出し作業を9月4日より再開。
- ⑤ 9月13日よりキャスク2基の点検(外観検査, 遮へい検査, 熱検査等)を順次実施中。燃料取り出し作業が一時的に中断するものの、取り出し完了については使用済燃料は11月、新燃料は12月を予定しており、安全を最優先として、慎重に作業を進めていく。

スケジュール(案)

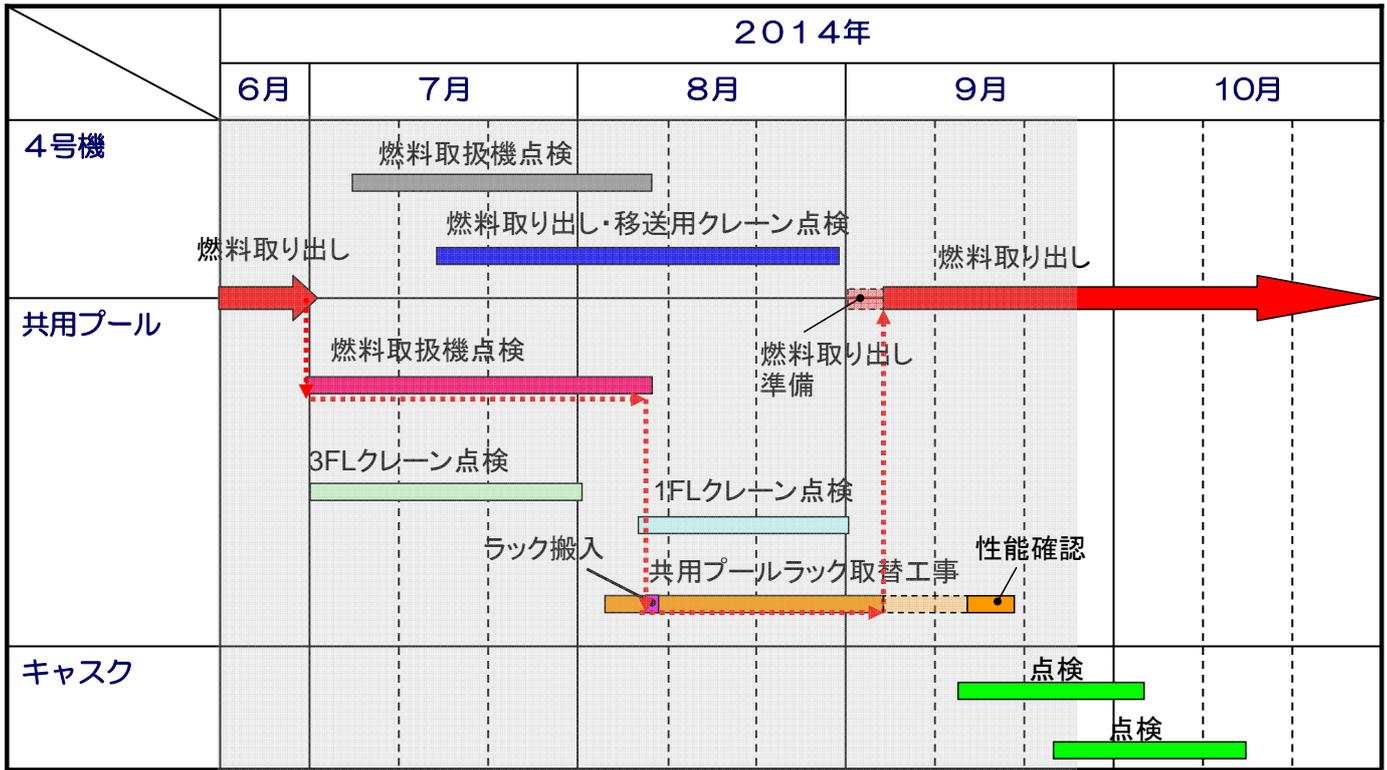

- ・4号機燃料取り出し作業は、9月4日より再開
- ・カスク2基の点検(外観検査, 遮へい検査, 熱検査等)を9月13日より実施

共用プール鳥瞰図

