

滞留水の貯蔵及び処理の状況概略

- ①建屋内滞留水水位及び貯蔵量
 - ・建屋内滞留水水位は運転上の制限を満足
 - ・処理装置(第二セシウム吸着装置)は運転中
- ②廃棄物発生量
 - ・除染装置停止中のため、廃スラッジ貯蔵量は変動なし
- ③処理水タンク貯蔵量
 - ・淡水化装置による処理により、淡水受タンク及び濃縮塩水タンク貯蔵量は変動あり
 - ・蒸発濃縮装置は全台停止中
- ④5, 6号機滞留水貯蔵量
 - ・構内散水によりF・Hエリア等タンク貯蔵量は変動あり


①建屋内滞留水水位及び貯蔵量

施設	貯蔵量	T/B建屋内水位
1号機	約14,000m ³	OP.2,861
2号機	約21,900m ³	OP.3,019
3号機	約21,800m ³	OP.2,795
4号機	約16,400m ³	OP.2,775
合計	約74,100m ³	


貯蔵施設	貯蔵量	水位
プロセス主建屋	約15,280m ³	OP.4,318
高温焼却炉建屋	約4,440m ³	OP.3,090
合計	約19,720m ³	

②廃棄物発生量

廃スラッジ




保管量:597/700[m³] ※3



保管量:508/1860体 ※1


- 中低レベル(既設)
- 中低レベル(追設予定)
- 高レベル(既設)
- 高レベル(追設予定)
- 移送ホース布設ルート
- 淡水注水ルート

F・Hエリア等タンク



水量:19408/21800[m³] ※2,3,4

④5, 6号機滞留水貯蔵量




水量:303974/341100[m³] ※2,3,6


貯蔵量合計(③+④)

- ※1 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル及び多核種除去設備の保管容器、処理ラムを含む
- ※2 装置稼働中につき水位が静定しないため参考扱い
- ※3 貯蔵容量は運用上の上限を示す(タンクの貯蔵容量は10の位を切り捨てて表記)
- ※4 Hエリアのタンク(約3,000m³分)、地下貯水槽 iv (約3,400m³(運用上の上限値))及び5,6号機周辺仮設タンク(約4,500m³)を5,6号機滞留水に使用
- ※5 多核種除去設備(ホット試験中)の処理済水を貯蔵するが、タンクの運用状況に応じて淡水や濃縮塩水を貯蔵。5,6号機滞留水を貯蔵中の地下貯水槽 iv を除いた値
- ※6 地下貯水槽 i、iii、vi の貯蔵容量(水位上限80%)を含む。各地下貯水槽からの移送が完了次第、貯蔵容量から除く


RO及び蒸発濃縮装置後 淡水受タンク 濃縮廃液貯槽 RO後濃縮塩水受タンク 処理水貯槽 処理水タンク総容量




水量:24644/31400[m³] ※2,3




水量:6709/9500[m³] ※2,3



水量:250892/263400[m³] ※2,3,6




水量:2321/15000[m³] ※2,3,5



水量:284566/319300[m³] ※2,3,5,6

③処理水タンク貯蔵量

2, 3号機タービン建屋及びプロセス主建屋, 高温焼却炉建屋の水位グラフ

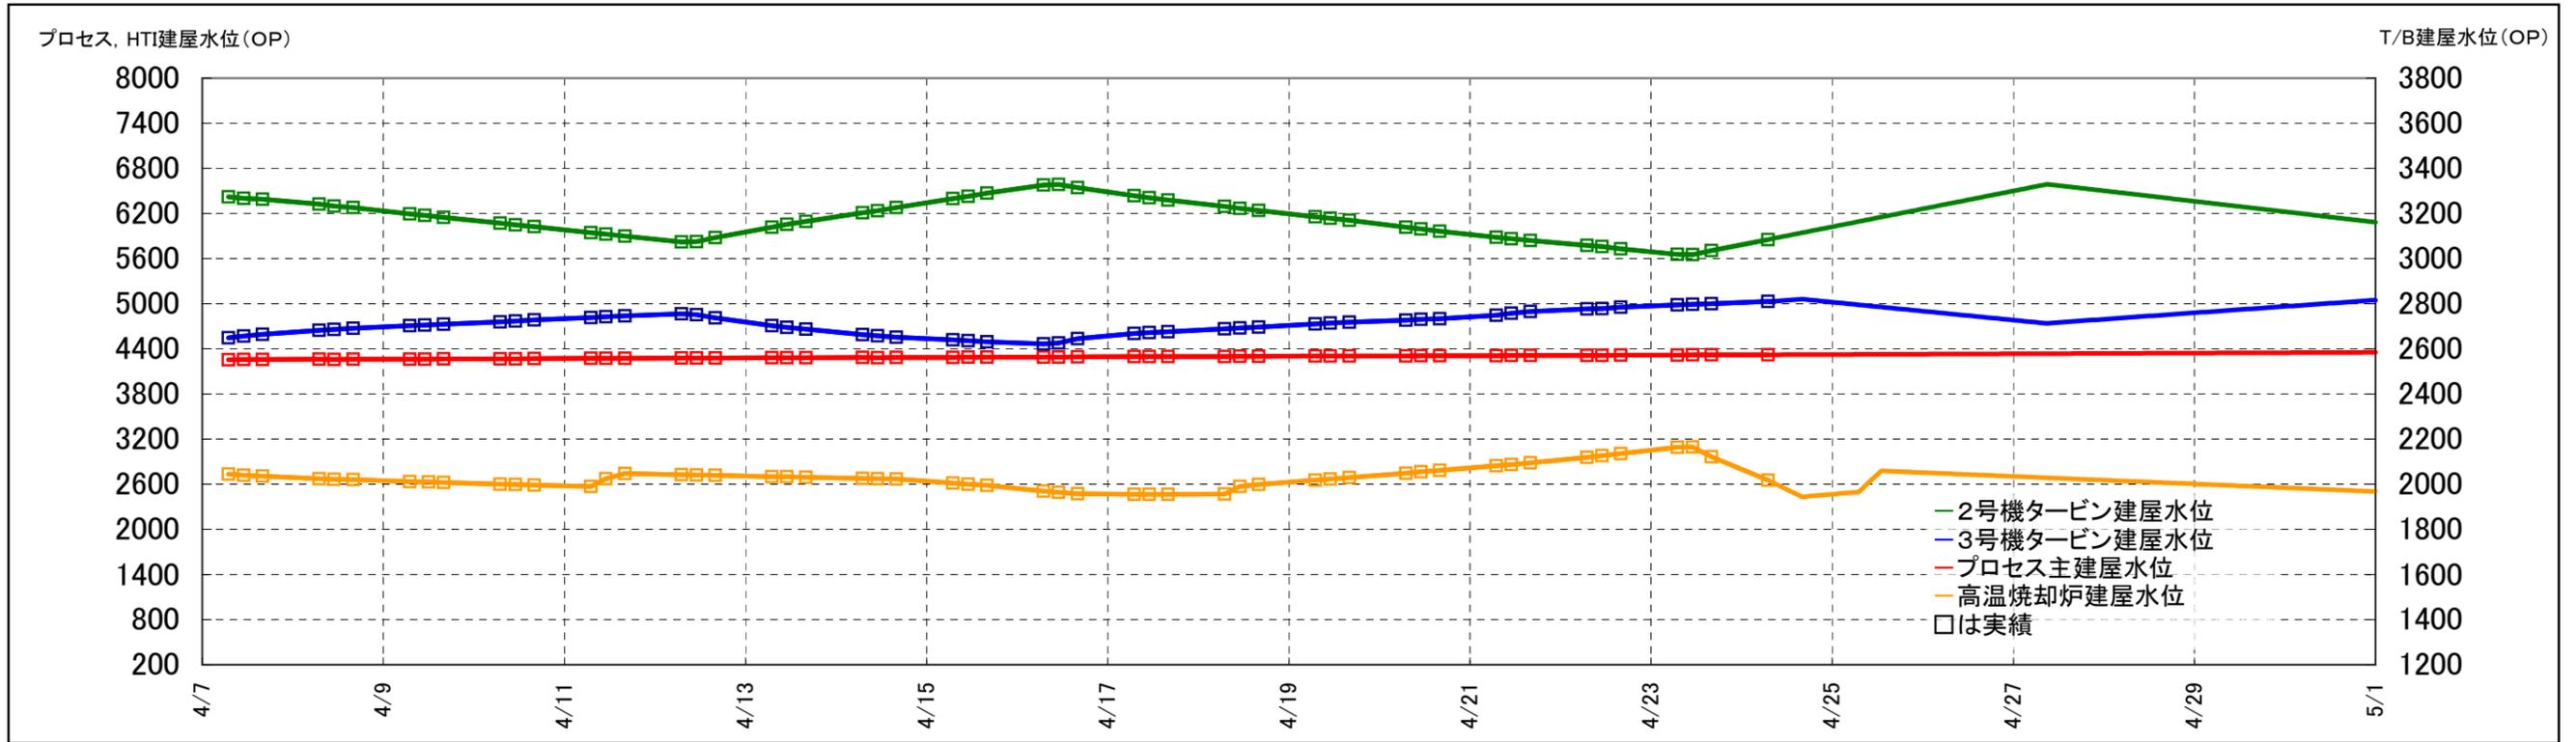

処理装置の稼働状況

