環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		12月	1月	2月	3月	4月	備　考
環境線量低減対策	放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実　績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ （３０mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新） ・構内全域の走行サーベイ[1回／３ヶ月] ○線量低減対策 ・土捨場南側エリア（伐採・表土除去・路盤舗装等） ・土捨場北側エリア　（除草・伐採・盛土等） （予　定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ （３０mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新） ・構内全域の走行サーベイ[1回／３ヶ月] ○線量低減対策 ・土捨場南側エリア（伐採・表土除去・路盤舗装等） ・土捨場北側エリア　（除草・伐採・盛土等） 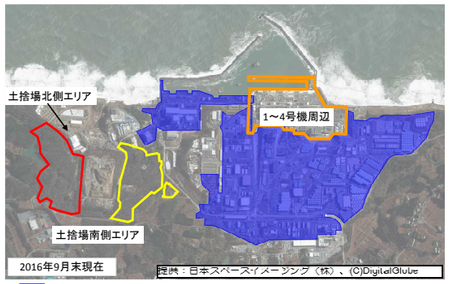 エリア平均で 5μSv/hを達成したエリア	検討・設計							
				現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ） 構内全域の走行サーベイ（第4四半期分） ■線量低減対策 ①１～４号機周辺　※ ②その他エリア 土捨場南側エリア　（伐採・表土除去・路盤舗装　等） 土捨場北側エリア　（除草・伐採・盛土　等）				▽下期報告 ～2018年1月予定 ～2019年11月予定	※１～４号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。 （使用済燃料プール対策分野　参照）
	海洋汚染拡大防止 ・遮水壁の構築 ・繊維状吸着材浄化装置の設置 ・港湾内の被覆 ・浄化方法の検討	（実　績） 【海底土被覆】必要な範囲について２層目被覆 【排水路付替】A系排水路付替え工事（準備工・試掘調査） （予　定） 【4m盤地下水対策】港湾内海水モニタリング 【排水路付替】A系排水路付替え工事（準備工・試掘調査・本体工事・ヤード造成他）	検討・設計							
				現場作業	港湾内海水モニタリング 海底土被覆(2層目被覆) 最新工程反映～1/31→～12/26 A系排水路付替え工事（準備工・試掘調査） 準備工・試掘調査延長のため～1/22→～2/5 A系排水路付替え工事（本体工事・ヤード造成他）				～2016年12月26日完了 ～2018年3月通水予定	
	評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実　績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・敷地内におけるダスト濃度測定（毎週） ・降下物測定（月１回） ・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング（毎日～月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（隔週） （予　定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・敷地内におけるダスト濃度測定（毎週） ・降下物測定（月１回） ・港湾内、発電所近傍、沿岸海域モニタリング（毎日～月1回） ・20km圏内 魚介類モニタリング（月1回 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（隔週）	検討・設計	1.2.3.4u放出量評価	1.2.3.4u放出量評価				
				現場作業	2uR/B 1uR/B 4uR/B 3uR/B 1.2.3.4uR/B測定 敷地内ダスト測定 降下物測定 海水・海底土測定（発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖） 20km圏内 魚介類モニタリング					
