東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2018/7/26現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り		作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		6月	7月	8月	9月	10月	備　考
						24	1 8 15 22 29	5 12 19 下	上 中 下	前 後	
労働環境改善	防護装備	1	防護装備の適正化検討	（実　績） ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始（2016年3月8日） （予　定） ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※（運用範囲の拡大等） ※管理対象区域を３つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討				
					現場作業		管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化				
	人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	（実　績） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） （予　定） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価				
						熱中症予防対策の実施（4～10月）					
	健康管理	3	長期健康管理の実施	（実　績） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き ・2018年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 （予　定） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き ・2018年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 ・2018年度対象者（社員）への「白内障検査」（福島）実施	現場作業	健康相談受付				
						【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用清算手続き、2018年度検査案内準備（退職者及び協力企業作業員）				
								新規追加	社員・白内障検査（福島）		
		4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実　績） ・１Ｆ救急医療室の2018年9月までの医師確保完了（固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師） （予　定） ・１Ｆ救急医療室の10～12月の勤務医師調整	検討・設計			1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整			
					現場作業		1F救急医療室9月までの医師確保完了				
	要員管理、労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	（実　績） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 （予　定） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況集約▼ ▽作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況集約▽	▽作業員の確保状況調査依頼		
						作業員の確保状況（6月実績/8月予定）と地元雇用率（6月実績）についての調査・集計		作業員の確保状況（7月実績/9月予定）と地元雇用率（7月実績）についての調査・集計	作業員の確保状況（8月実績/10月予定）と地元雇用率（8月実績）についての調査・集計		
		6	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	（実　績） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 （予　定） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック				
					現場作業						
	車両点検整備	7	構内専用車両の点検整備	（実　績） ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 ・未点検の構内専用車両の整備の実施 （予　定） ・未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 ・未点検の構内専用車両の整備の実施	検討・設計		未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定（8月分）	未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定（9月分）			
					現場作業		未点検の構内専用車両の整備の実施				

東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2018/7/26現在

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定	6月	7月				8月				9月			10月		備　考
				24	1	8	15	22	29	5	12	19	下	上	中	下	前	後	
労働環境改善																			

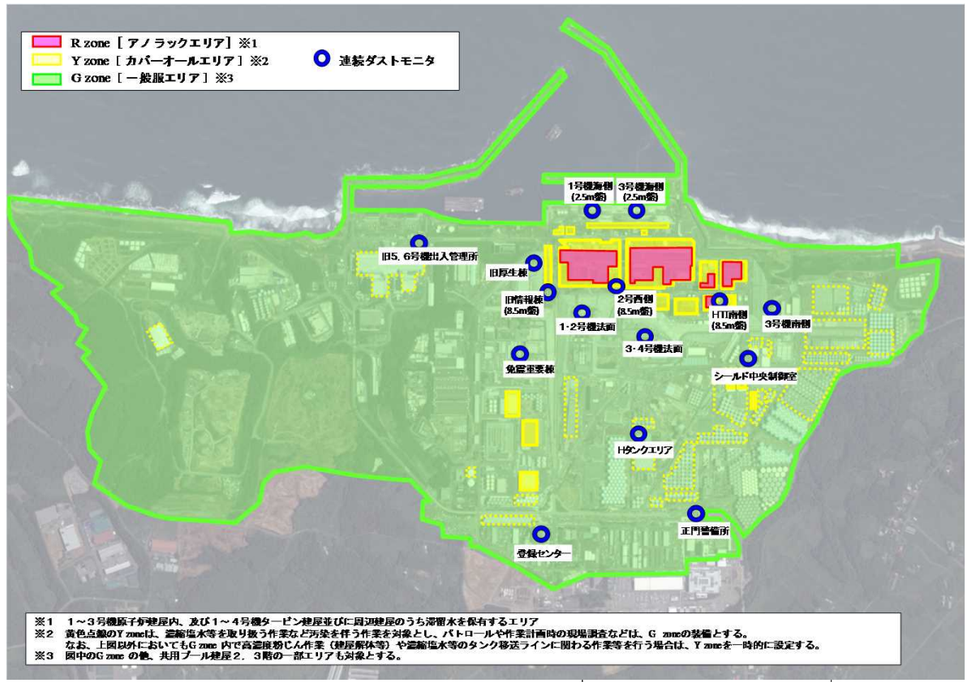

提供：日本スペースイメージング，©DigitalGlobe

管理対象区域の運用区分　レイアウト
