放射性廃棄物処理・処分　スケジュール
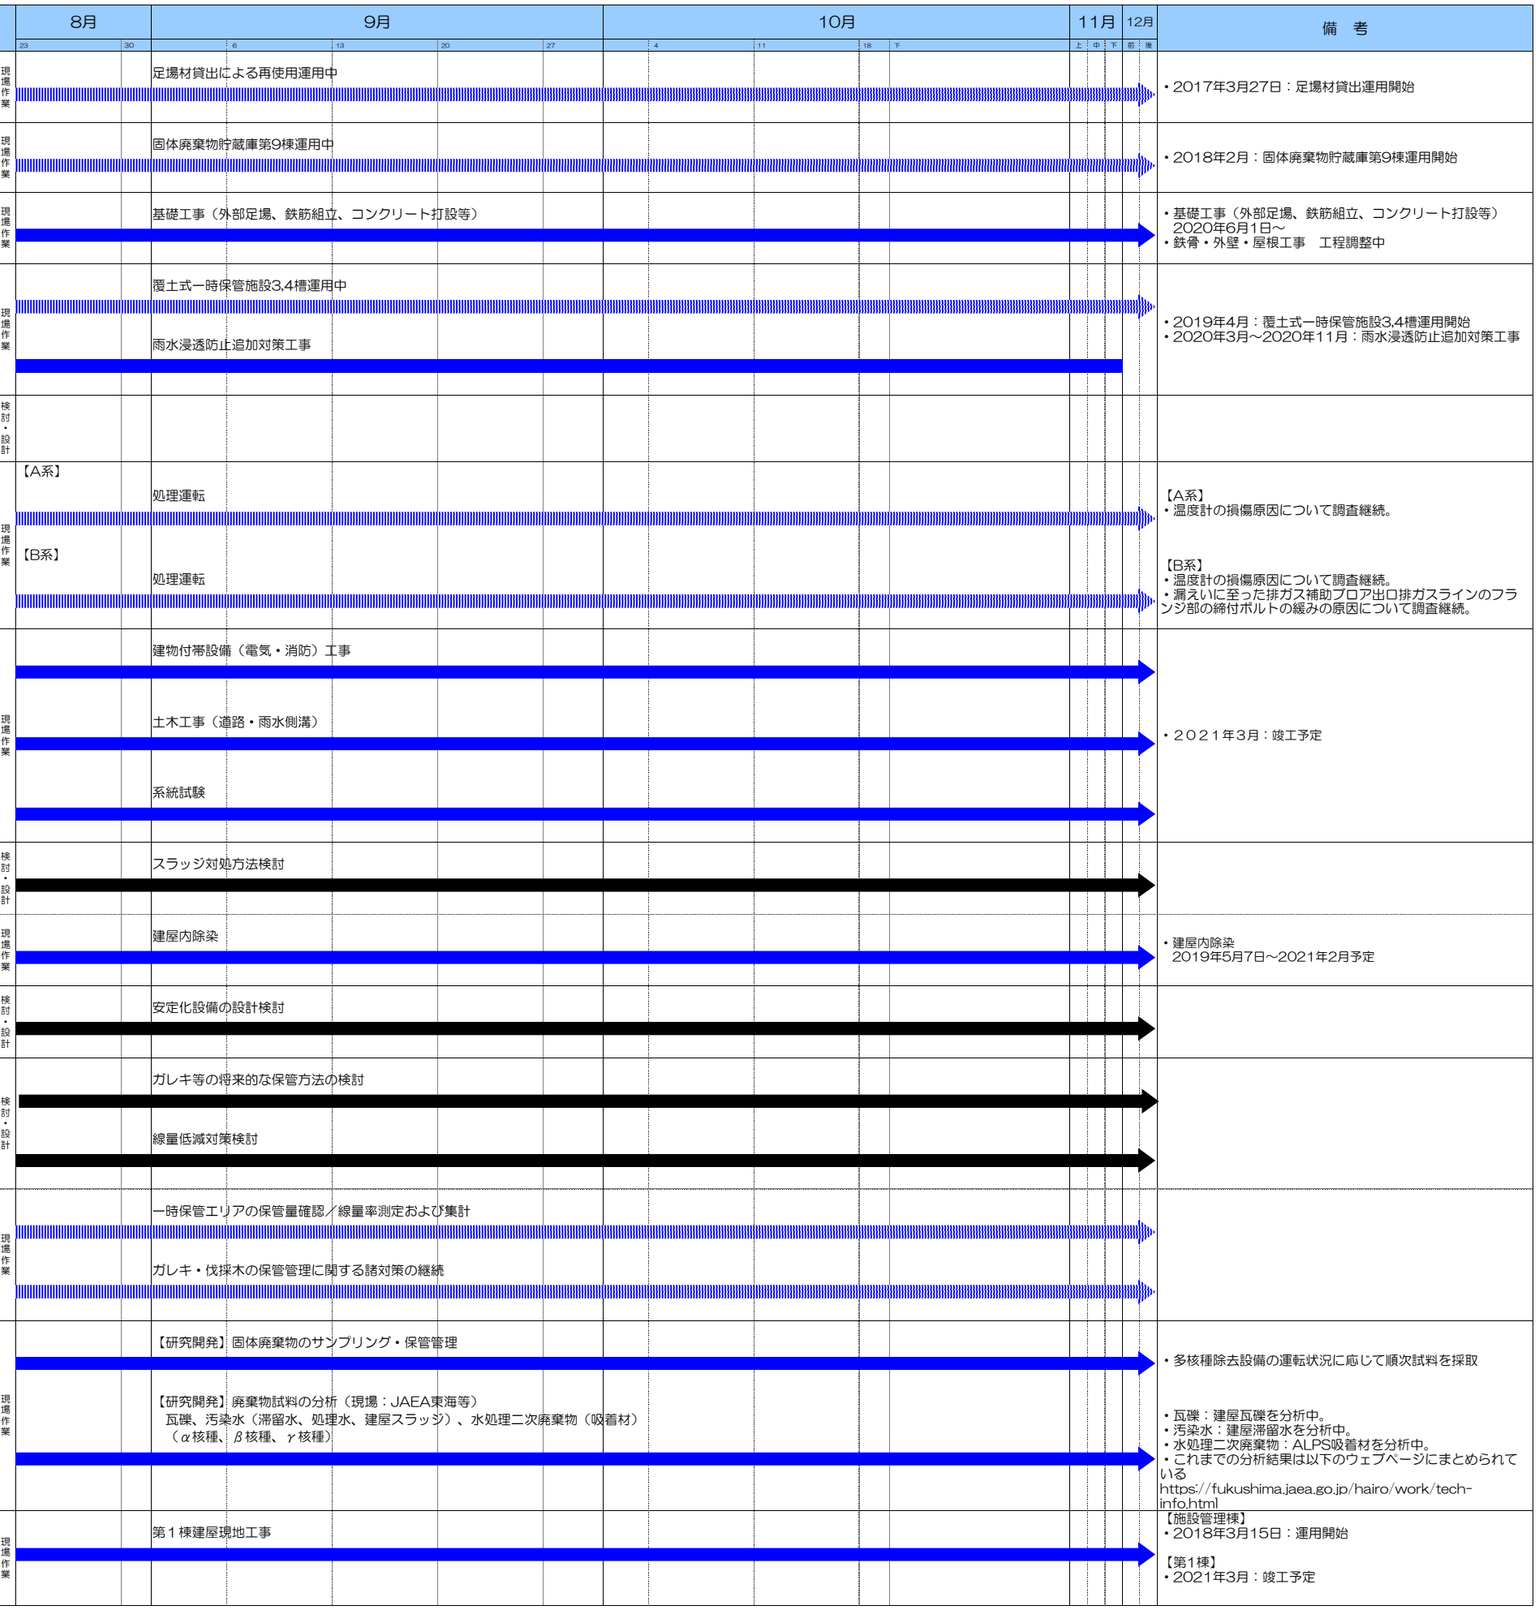
分野名	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		備　考
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	保管管理計画	1．発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	（実　績） ・足場材貸出による再使用運用中	現場作業	・2017年3月27日：足場材貸出運用開始
		2．保管適正化の推進	固体廃棄物貯蔵庫の設置	（実　績） ・固体廃棄物貯蔵庫第9棟運用中	現場作業	・2018年2月：固体廃棄物貯蔵庫第9棟運用開始
			大型廃棄物保管庫の設置	（実　績／予　定） ・基礎工事（外部足場、鉄筋組立、コンクリート打設等）	現場作業	・基礎工事（外部足場、鉄筋組立、コンクリート打設等） 2020年6月1日～ ・鉄骨・外壁・屋根工事　工程調整中
			覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	（実　績／予　定） ・覆土式一時保管施設3,4槽運用中 ・雨水浸透防止追加対策工事	現場作業	・2019年4月：覆土式一時保管施設3,4槽運用開始 ・2020年3月～2020年11月：雨水浸透防止追加対策工事
			一時保管エリアの追設／拡張	（実　績／予　定）	検討・設計	
			雑固体廃棄物焼却設備	（実　績） ・処理運転　（A・B系）	現場作業	【A系】 ・温度計の損傷原因について調査継続。 【B系】 ・温度計の損傷原因について調査継続。 ・漏えいに至った排ガス補助ブロア出口排ガスラインのフランジ部の締付ボルトの緩みの原因について調査継続。
			増設雑固体廃棄物焼却設備	（実　績／予　定） ・建物付帯設備（電気・消防）工事 ・土木工事（道路・雨水側溝） ・系統試験	現場作業	・２０２１年３月：竣工予定
			除染装置（AREVA）スラッジ	（実　績／予　定） ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内除染	検討・設計 現場作業	・建屋内除染 2019年5月7日～2021年2月予定
			ALPSスラリー安定化設備	（実　績／予　定） ・安定化設備の設計検討	検討・設計	
	保管管理計画	3．瓦礫等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減		（実　績／予　定） ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続	検討・設計 現場作業	
	処理・処分計画	4．固体廃棄物の性状把握		（実　績／予　定） ・【研究開発】固体廃棄物のサンプリング・保管管理 ・【研究開発】廃棄物試料の分析（現場：JAEA東海等）	現場作業	・多核種除去設備の運転状況に応じて順次試料を採取 ・瓦礫：建屋瓦礫を分析中。 ・汚染水：建屋滞留水を分析中。 ・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材を分析中。 ・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/work/tech-info.html
		5．JAEA分析・研究施設の整備（施設管理棟、第１棟、第２棟）		（実　績／予　定） ・第1棟建屋現地工事 連絡通路等工事（連絡通路内装工事、1,2,3階ダクト工事等） 主要内装設備等工事（鉄セル等の搬入・据付等）	現場作業	【施設管理棟】 ・2018年3月15日：運用開始 【第1棟】 ・2021年3月：竣工予定
