環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		8月		9月				10月			11月			12月			1月			2月			3月以降	備　考
					20	27		3	10	17	24	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
環境線量低減対策	放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実　績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒8月22日（第2四半期分） ○線量低減対策 ・建屋エリア（3号機海側等）　（建物除去・路盤舗装　等） （予　定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒10月～11月（1～4号機周辺） 12月（5，6号、物揚げ場） 1月（Jタンク） 2月～3月（Hタンク） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒11月（第3四半期分）、2月（第4四半期分） 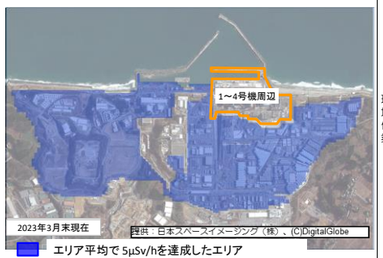 エリア平均で5μSv/hを達成したエリア	検討・設計																									
				現場作業																							10月2日～3月31日実施予定 5月、8月、11月、2月実施予定
				検討・設計																							
		海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実　績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】　深浅測量２０２２年度 （予　定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（雨期）） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量２０２３年度（7月3日～12月20日）	現場作業	■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング ■排水路対策 排水路モニタリング K排水路上流部調査(浄化材の効果の確認) K排水路上流部調査(枝管サンプリング) 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 ■深浅測量 準備作業 現場作業 工程変更																					（継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施） （継続実施）
	評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実　績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予　定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（1回／月） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計	1,2,3,4u放出量評価					1,2,3,4u放出量評価															（継続運用）	
				現場作業			3u		2u　4u	1u																（継続実施） 降下物測定 海水・海底土測定（発電所周辺, 茨城県沖, 宮城県沖） 20km圏内 魚介類モニタリング	2022年4月 多核種除去設備等処理水放出に係る海域モニタリング強化開始。
