東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却
2024/1/25現在

循環注水冷却スケジュール（1/1）
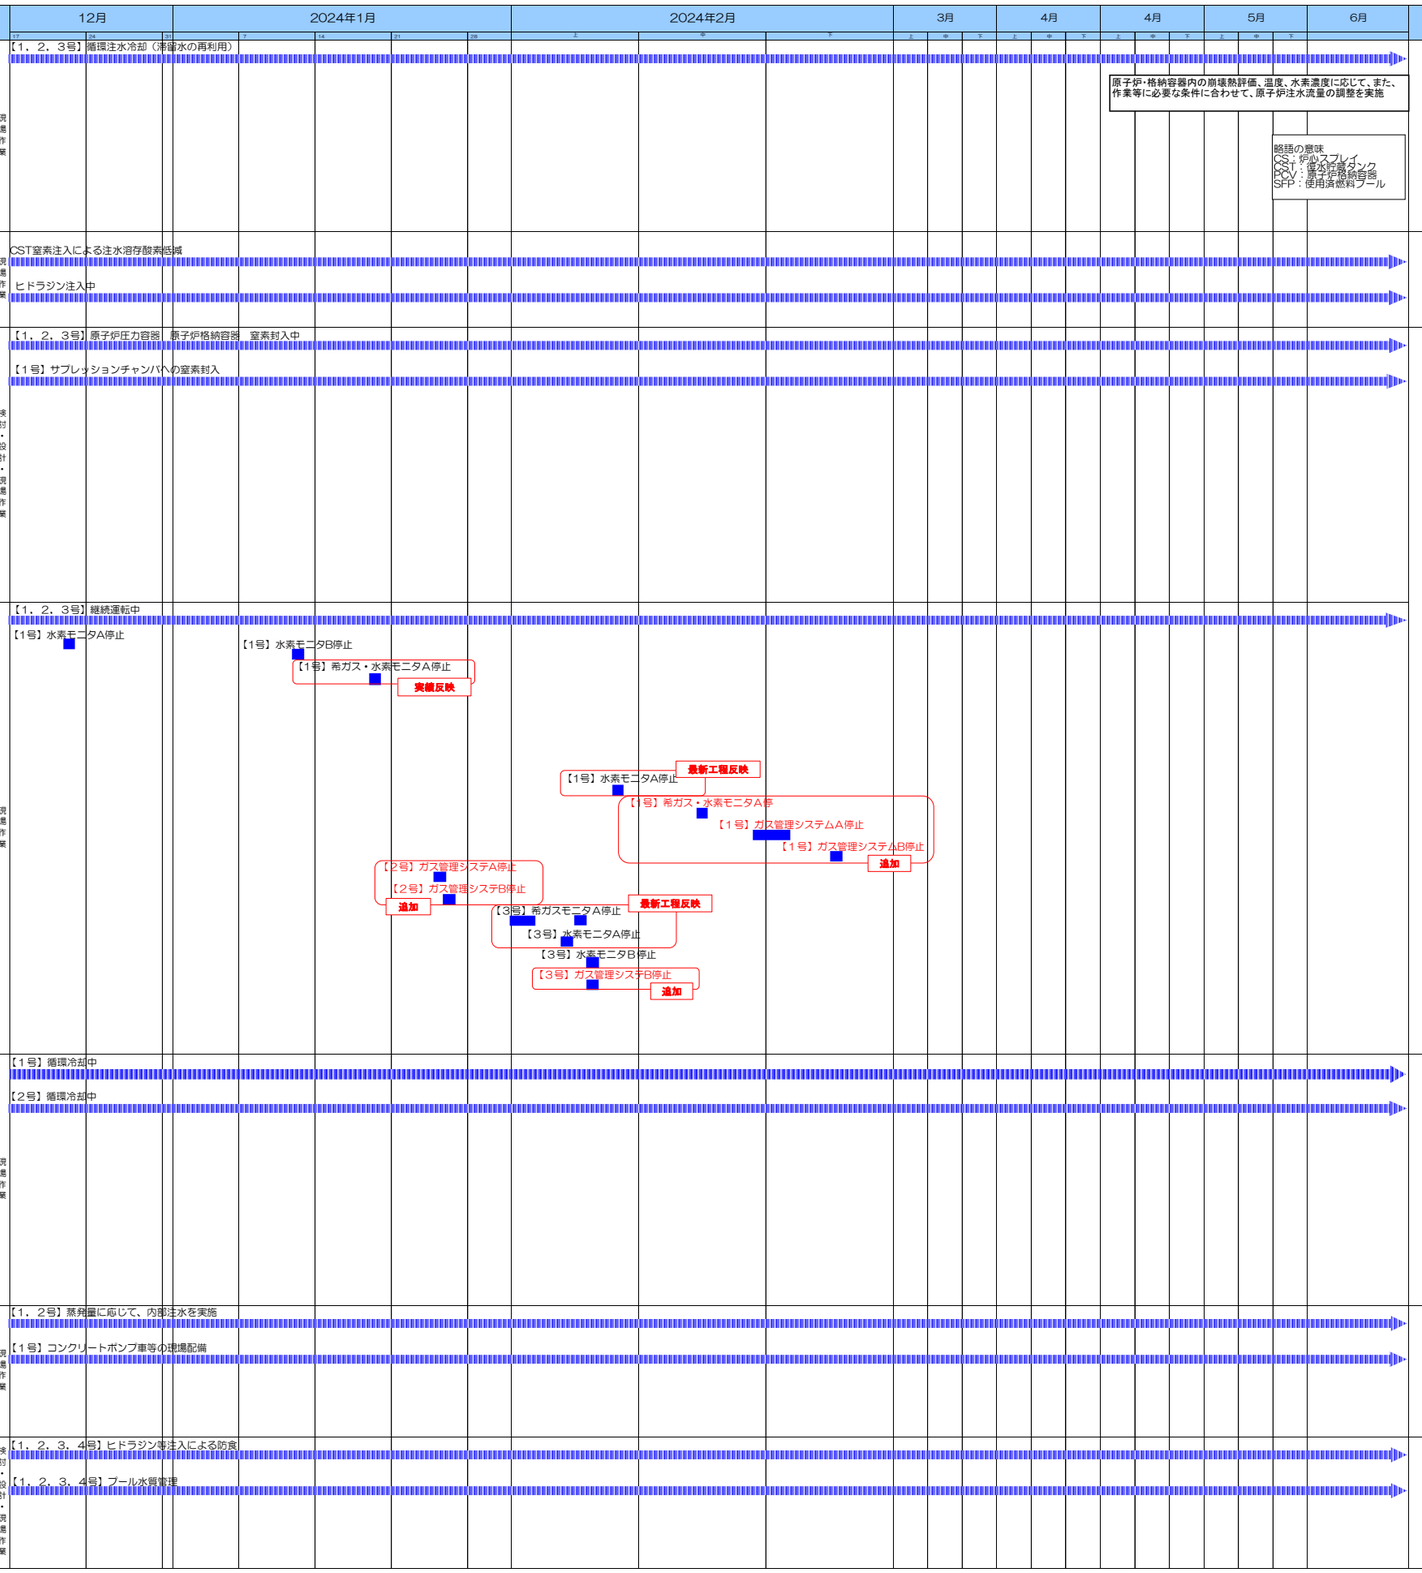
分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	（実　績） ・【共通】循環注水冷却中（継続） （予　定）	現場作業
		海水腐食及び塩分除去対策	（実　績） ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29~）	現場作業
	原子炉格納容器関連	窒素充填	（実　績） ・【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入 - 連続窒素封入へ移行（2013/9/9~）（継続） （予　定）	検討・設計・現場作業
	原子炉格納容器関連	PCVガス管理	（実　績） ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　A系：2023/12/22 ・水素モニタ停止　　B系：2024/1/12 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止　A系：2024/1/19 （予　定） ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　A系：2024/2/9 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止　A系：2024/2/中旬 ・【1号】PCVガス管理システム MCC（A）点検 ・PCVガス管理システム停止　A系：2024/2/20~2/22 ・【1号】PCVガス管理システム 電力制御ユニット点検 ・PCVガス管理システム停止　B系：2024/2/下旬 ・【2号】PCVガス管理システム 制御盤点検 ・PCVガス管理システム停止　A系：2024/1/25 ・PCVガス管理システム停止　B系：2024/1/26 ・【3号】PCVガス管理システム モニタ点検 ・希ガスモニタ停止　A系：2024/2/1,2,6 ・水素モニタ停止　　A系：2024/2/5 ・水素モニタ停止　　B系：2024/2/7 ・【3号】PCVガス管理システム 制御盤点検 ・PCVガス管理システム停止　B系：2024/2/上旬	現場作業
	使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	（実　績） ・【共通】循環冷却中（継続） （予　定）	現場作業
	使用済燃料プール関連	使用済燃料プールへの注水冷却	（実　績） ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業
	使用済燃料プール関連	海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	（実　績） ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業
