東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2024/12/26現在

労働環境改善スケジュール

分野名	括り		作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定	
労働環境改善	防護装備	1	防護装備の適正化検討	（実　績） ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 （予　定） ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業
	ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	（実　績） ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 （予　定） ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業
	人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	（実　績） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM−KY等） ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 （予　定） ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM−KY等）	現場作業
	健康管理	4	長期健康管理の実施	（実　績） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施 （予　定） ・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業
		5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	（実　績） ・１Ｆ救急医療室の勤務医師調整 （予　定） ・１Ｆ救急医療室の勤務医師調整	検討・設計
		6	感染症対策の実施	（実　績） ・インフルエンザ予防接種の実施 （予　定） ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業
	要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	（実　績） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 （予　定） ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計
		8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	（実　績） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 （予　定） ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計 現場作業

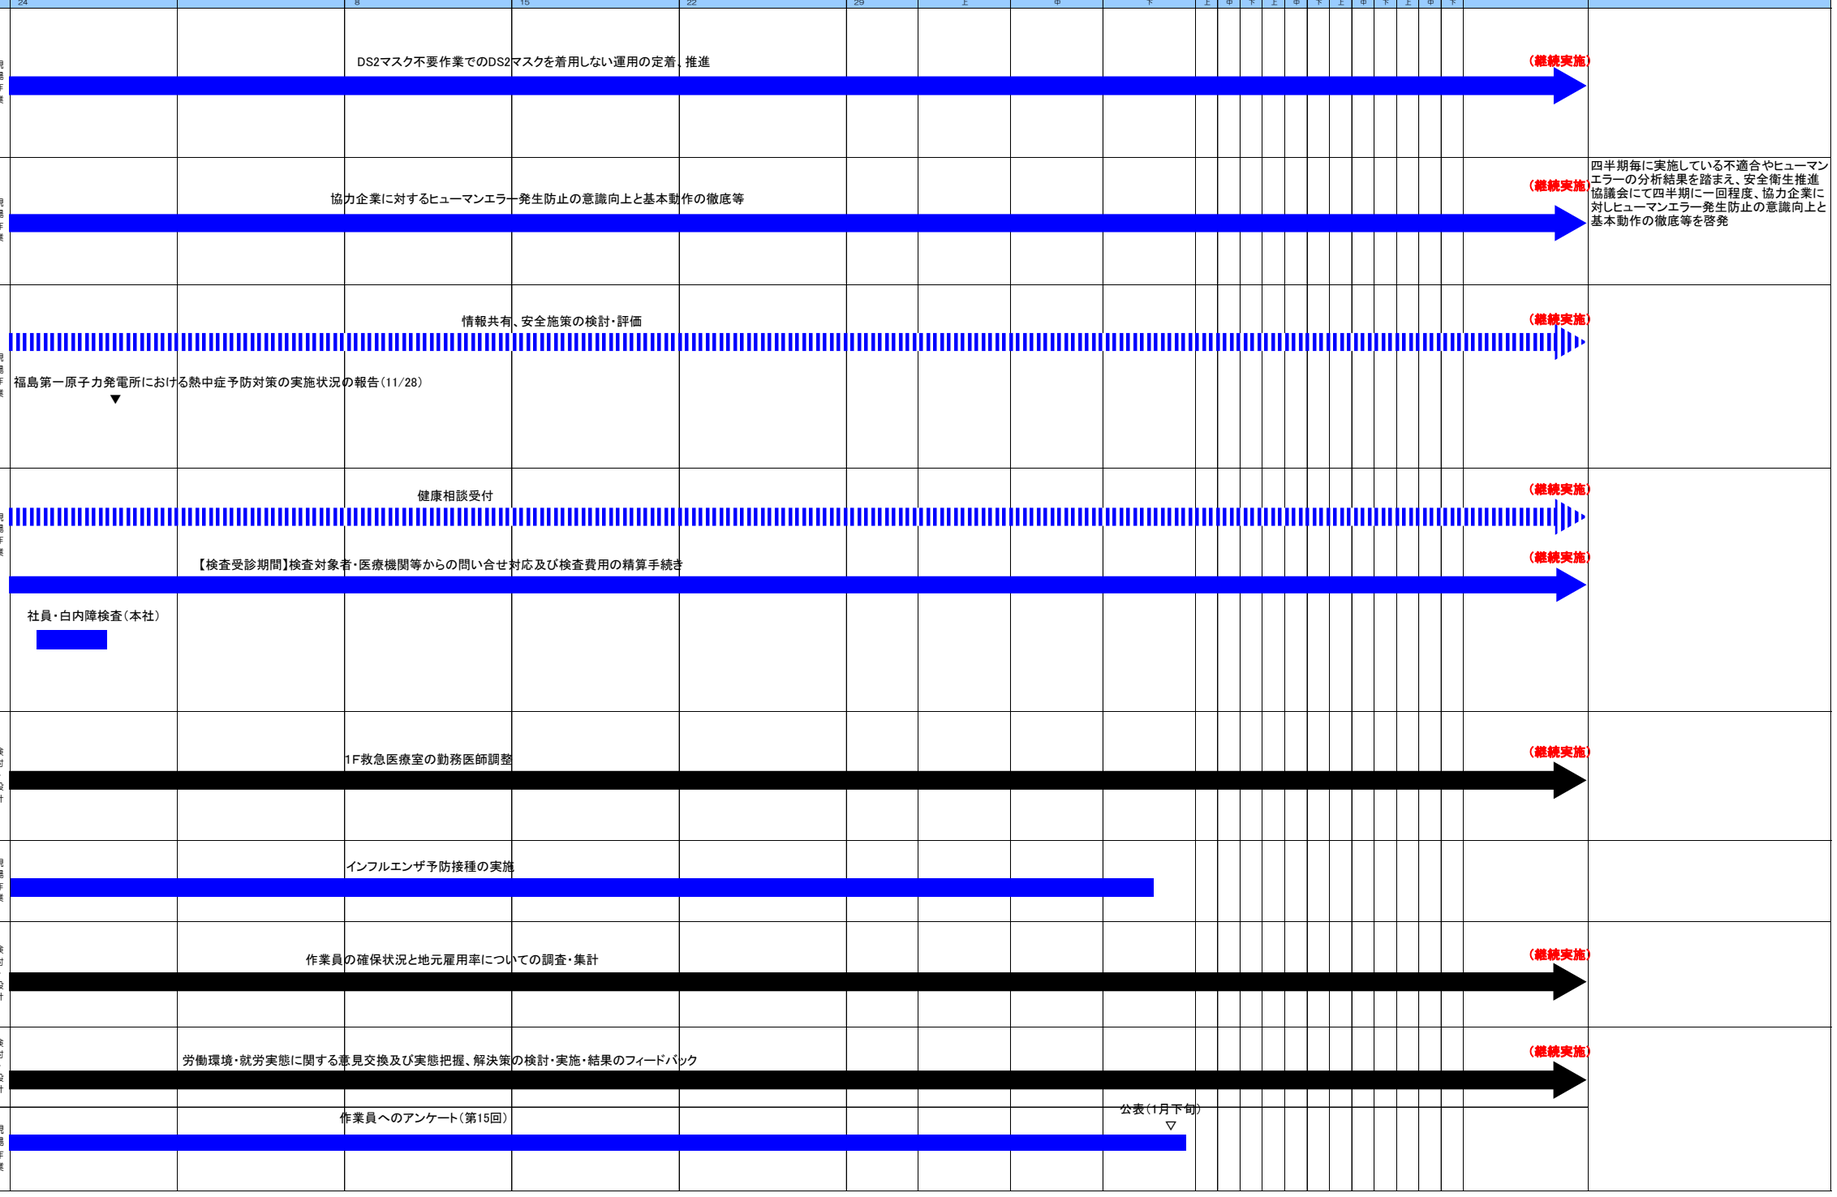

備　考
四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発

東京電力ホールディングス株式会社
労働環境改善
2024/12/26現在

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定	11月	12月				1月			2月			3月			4月			5月			6月以降	備　考
				24	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
労働環境改善																									

廃炉中長期実行プラン2024

年度	2023（実績）	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>
- ：作業の期間
- ：変更が見込まれる期間
- ：工程間の関連
- ：追加した工程
- ：変更/具体化した工程
- ：実施を取り止めた工程
- ＊-＊：リスクマップに関連する工程

※1　1～3号機原子炉建屋内，及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
※2　上記以外においてもG zone内で高濃度がこん作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は，Y zoneを一時的に設定する。
※3　図中のG zoneの他，共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

管理対象区域の運用区分　レイアウト

提供：日本スペースイメージング，
