放射性廃棄物処理・処分　スケジュール
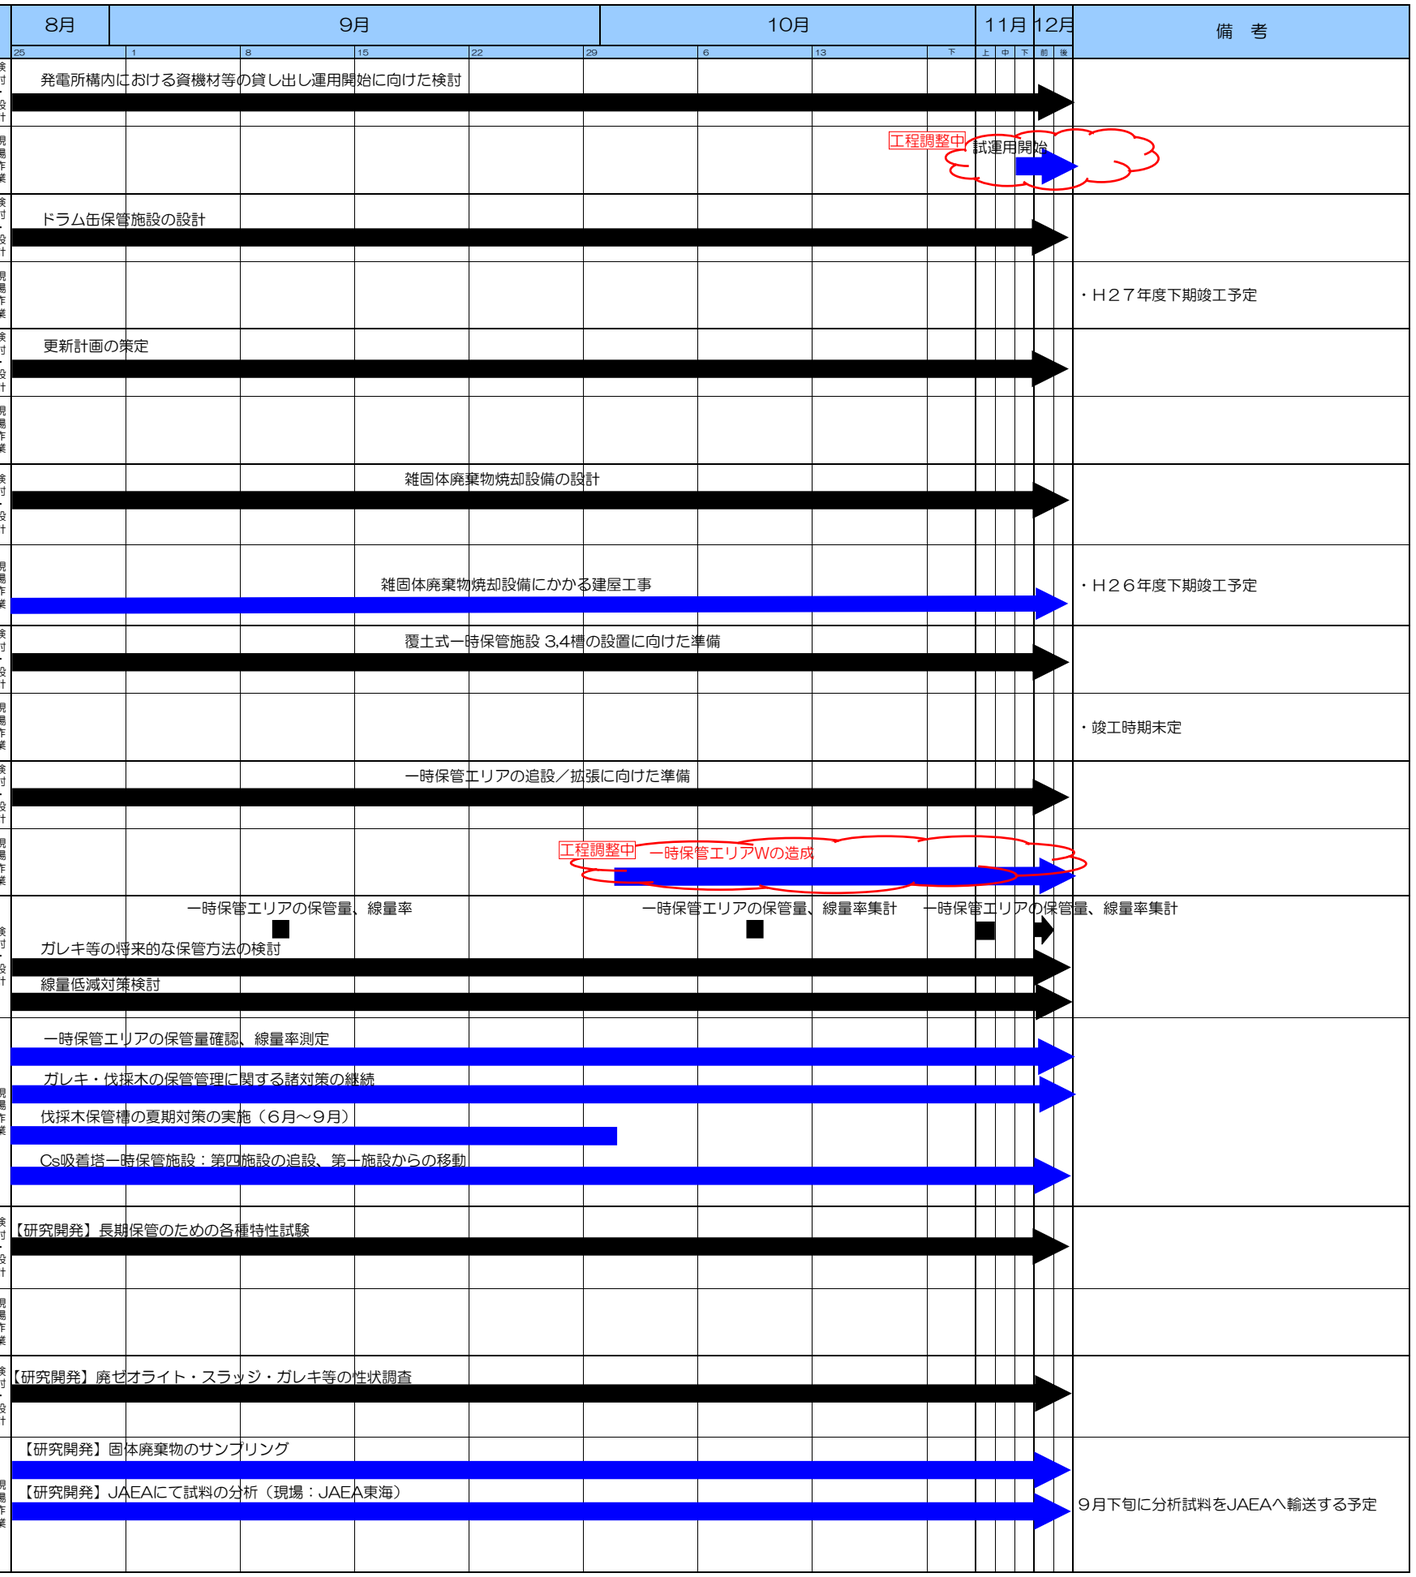
分野名	括り	作業内容		これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定		備　考
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	保管管理計画	１．発生量低減対策の推進	持込抑制策の検討	（実　績） ・発電所構内における資機材等の貸し出し運用開始に向けた検討 （予　定） ・発電所構内における資機材等の貸し出し運用開始に向けた検討	検討・設計	
					現場作業	
		２．保管適正化の推進	ドラム缶保管施設の設置	（実　績） ・ドラム缶保管施設の設計 （予　定） ・ドラム缶保管施設の設計	検討・設計	
					現場作業	・Ｈ２７年度下期竣工予定
			保管管理計画の更新	（実　績） ・更新計画の策定 （予　定） ・更新計画の策定	検討・設計	
					現場作業	
			雑固体廃棄物の減容検討	（実　績） ・雑固体廃棄物焼却設備の設計 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事 （予　定） ・雑固体廃棄物焼却設備の設計 ・雑固体廃棄物焼却設備にかかる建屋工事	検討・設計	
					現場作業	・Ｈ２６年度下期竣工予定
			覆土式一時保管施設 3,4槽の設置	（実　績） ・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備 （予　定） ・覆土式一時保管施設 3,4槽の設置に向けた準備	検討・設計	
					現場作業	・竣工時期未定
			一時保管エリアの追設／拡張	（実　績） ・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備 （予　定） ・一時保管エリアの追設／拡張に向けた準備	検討・設計	
					現場作業	
		３．瓦礫等の管理・発電所全体から新たに放出される放射性物質等による敷地境界線量低減		（実　績） ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続 ・伐採木保管槽の夏期対策の実施 ・Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動 （予　定） ・一時保管エリアの保管量確認／線量率測定および集計 ・ガレキ等の将来的な保管方法の検討 ・線量低減対策検討 ・ガレキ・伐採木の保管管理に関する諸対策の継続 ・Cs吸着塔一時保管施設：第四施設の追設、第一施設からの移動	検討・設計	
					現場作業	
		４．水処理二次廃棄物の長期保管等のための検討		（実　績） ○【研究開発】長期保管方策の検討 （予　定） ○【研究開発】長期保管方策の検討	検討・設計	
					現場作業	
	処理・処分計画	固体廃棄物の性状把握		（実　績） ○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等 ・JAEAにて試料の分析 ・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討 （予　定） ○【研究開発】固体廃棄物の性状把握等 ・固体廃棄物のサンプリング・分析方法検討	検討・設計	
					現場作業	９月下旬に分析試料をJAEAへ輸送する予定
