




				2025年度												2026年度						
項番	主リリース内容	作業内容	進捗	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月				
1	システム切替 2026年4月運用開始 2025年度予算 2025年9月 システム業者決定 2025年9月～10月 ハードウェア調達支援 2025年10月 ハード業者決定 データベース、その他データ移行 2026年2月～3月 仮稼働	追加開発案件の確認、各種調整	終了	<div>★9月中旬システム導入会社確定</div> <div>★9月下旬ハード調達仕様書確定</div> 																		
2		概算予算の作成、提出（2025年度予算）	終了																			
3		予算作成のための事前調整	終了																			
4		次年度予算の作成、提出（2025年度予算）	終了																			
5		システム調達仕様書の調整	終了																			
6		システム調達仕様書の確定、入札	仕様書確定日:8/25 入札予定日:9/12																			
7		ハードウェア調査																				
8		ハードウェア調達支援																				
9		ハード調達仕様書の確定、公示																				
10		ハードウェア設定作業																				
11		レセプト情報管理システム構築作業																				
12		動作確認テスト																				
13		お客様向け手順書作成																				
14		サーバー・クライアント搬入・設置																				
15		データ移行																				
16		仮稼働																				
17		本番運用開始																				
1	システム改修対応 外部IF対応（次期標準共済システムへの連携データ対応）	外部IF内容確認		終了	★R7.1月確認済																	
		外部IF連携テストバリエーション確認																				
		外部IF連携テストの実施																				
2	高額療養費の見直し対応（内容未確定）	NTTDの仕様内容の確認																				
		テストの実施																				
-	審査手数料の階層化対応（金額についての見直しのためシステムに影響しないことを想定）																					

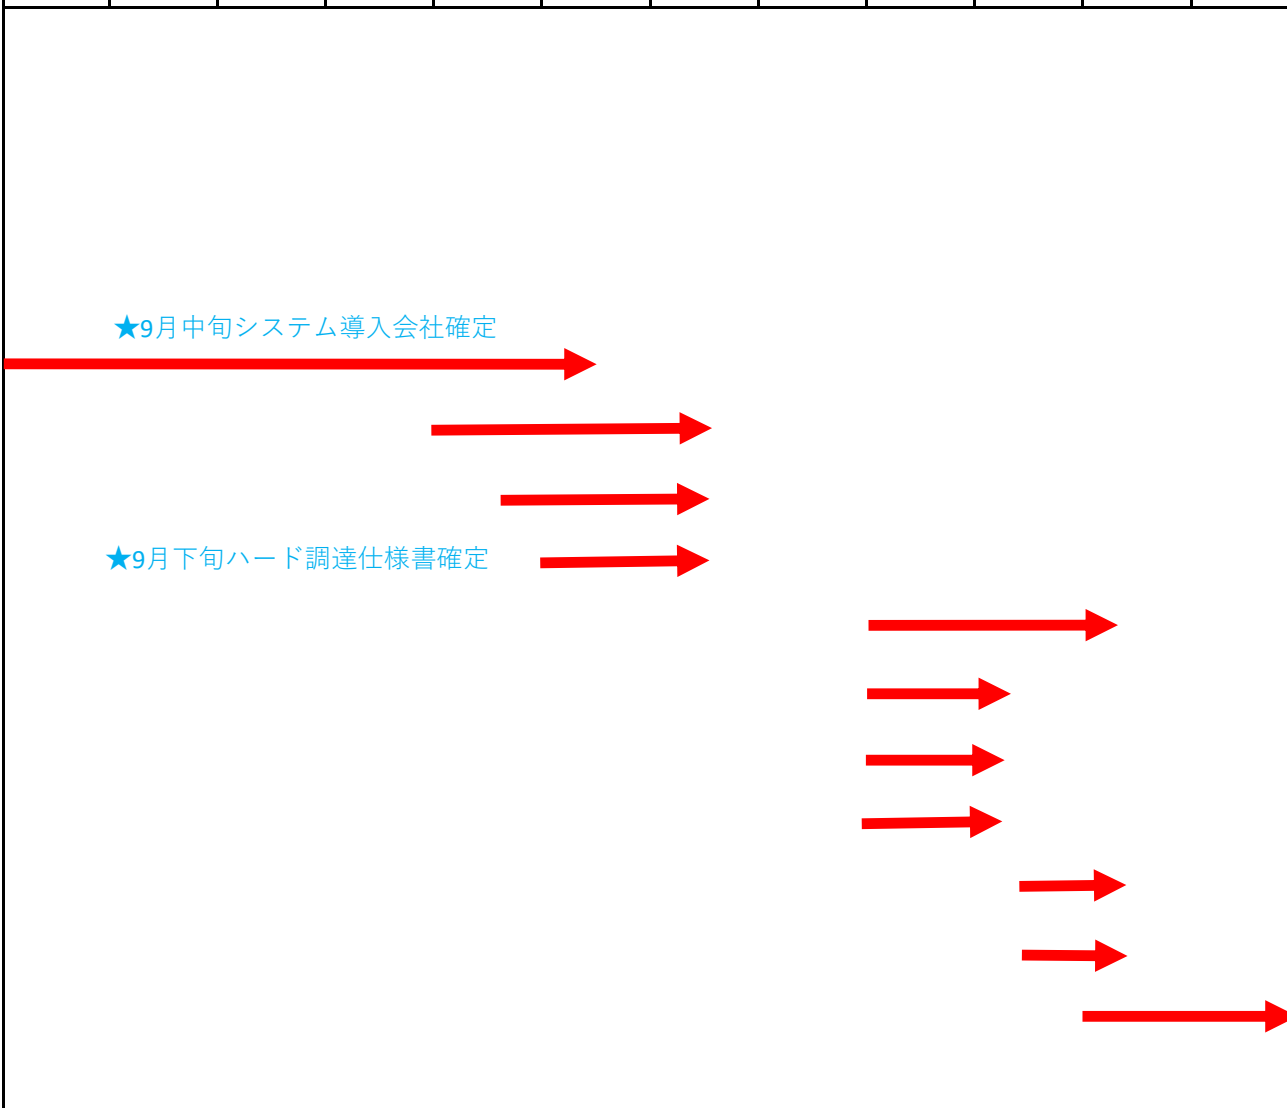
