東京電力株式会社

陸側遮水壁　4週間工程表 （平成27年7月19日～平成27年8月15日）

施工ブロック （削孔完了本数※／全削孔本数※） ※（）内数字は貫通本数再掲	7月													8月													
	先週							今週							来週							再来週						
	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
凡例　準備工： 削孔工： 建込工： 配管工： ブライン循環：																												
1BLK （凍結：75／75本） （測温：16／16本） （建込：75／75本）		ブライン循環							ブライン循環							ブライン循環							ブライン循環					
2BLK （凍結：19／19本） （測温：5／5本） （建込：19／19本）		ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工					
3BLK （凍結：199／199本） （測温：43／43本） （建込：199／199本）		ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工					
4BLK （凍結：33(7)／33(7)本） （測温：7／7本） （建込：33(7)／33(7)本）		ブライン循環、試験凍結工 ※6/3よりブライン供給休止中							ブライン循環、試験凍結工 ※6/3よりブライン供給休止中							ブライン循環、試験凍結工 ※ブライン供給休止(予定)							ブライン循環、試験凍結工 ※ブライン供給休止(予定)					
5BLK （凍結：218(23)／218(23)本） （測温：47(3)／47(3)本） （建込：218(23)／218(23)本）		ブライン循環、貫通施工							ブライン循環、建込工							ブライン循環							ブライン循環					
6BLK （凍結：193(19)／193(19)本） （測温：42／42本） （建込：193(19)／193(19)本）		ブライン循環、試験凍結工、貫通施工、建込工							ブライン循環、試験凍結工、建込工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工					
7BLK （凍結：125(14)／125(14)本） （測温：29(1)／29(1)本） （建込：125(14)／125(14)本）		ブライン循環、試験凍結工、貫通施工、建込工							ブライン循環、試験凍結工、建込工、配管工							ブライン循環、試験凍結工、配管工							ブライン循環、試験凍結工					
8BLK （凍結：102／102本） （測温：22／22本） （建込：102／102本）		ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工					
9BLK （凍結：72(7)／72(7)本） （測温：17(1)／17(1)本） （建込：72(7)／72(7)本）		配管工							配管工																			
10BLK（凍結：65(0)／75(10)本） （測温：20／20本） （建込：60(0)／75(10)本）		削孔工							削孔工																			
11BLK（凍結：147(0)／225(40)本） （測温：35(0)／37(2)本） （建込：142(0)／225(40)本）		試掘工、探査ボーリング工、削孔工							試掘工、探査ボーリング工、削孔工							探査ボーリング工、削孔工												
12BLK（凍結：.112(0)／159(29)本） （測温：29(0)／31(2)本） （建込：76(0)／159(29)本）		建込工							試掘工、建込工							建込工												
13BLK（凍結：42(0)／56(9)本） （測温：15(0)／16(1)本） （建込：42(0)／56(9)本）																												
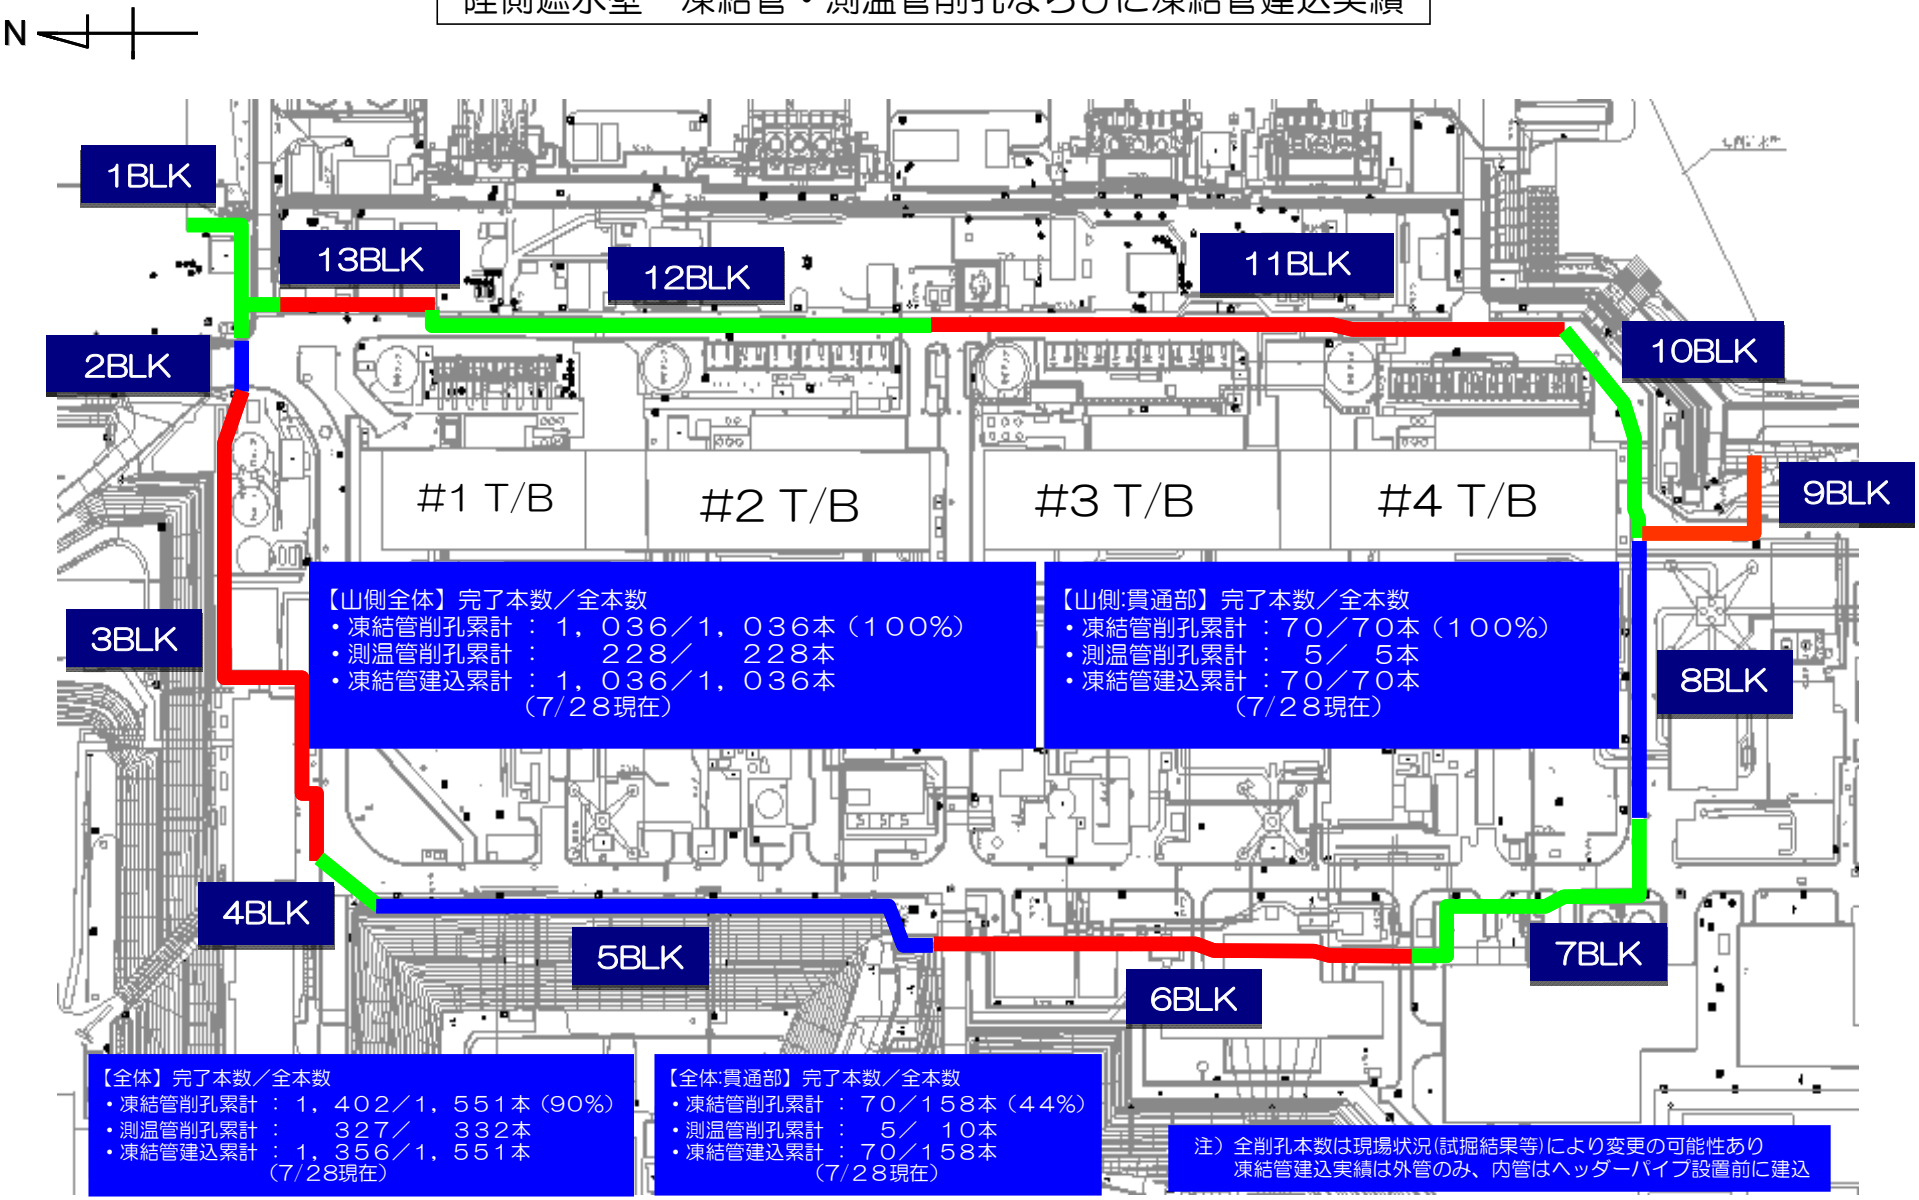
陸側遮水壁　凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績
