2026年度 標準共済システム（第三世代）のプログラムの保守等及びセンタ運用支援業務の委託　調達スケジュール（イメージ）（案）

※本資料はあくまでイメージです。調達担当共済組合の調達事務ルール等を踏まえて、別途確定する必要があります。
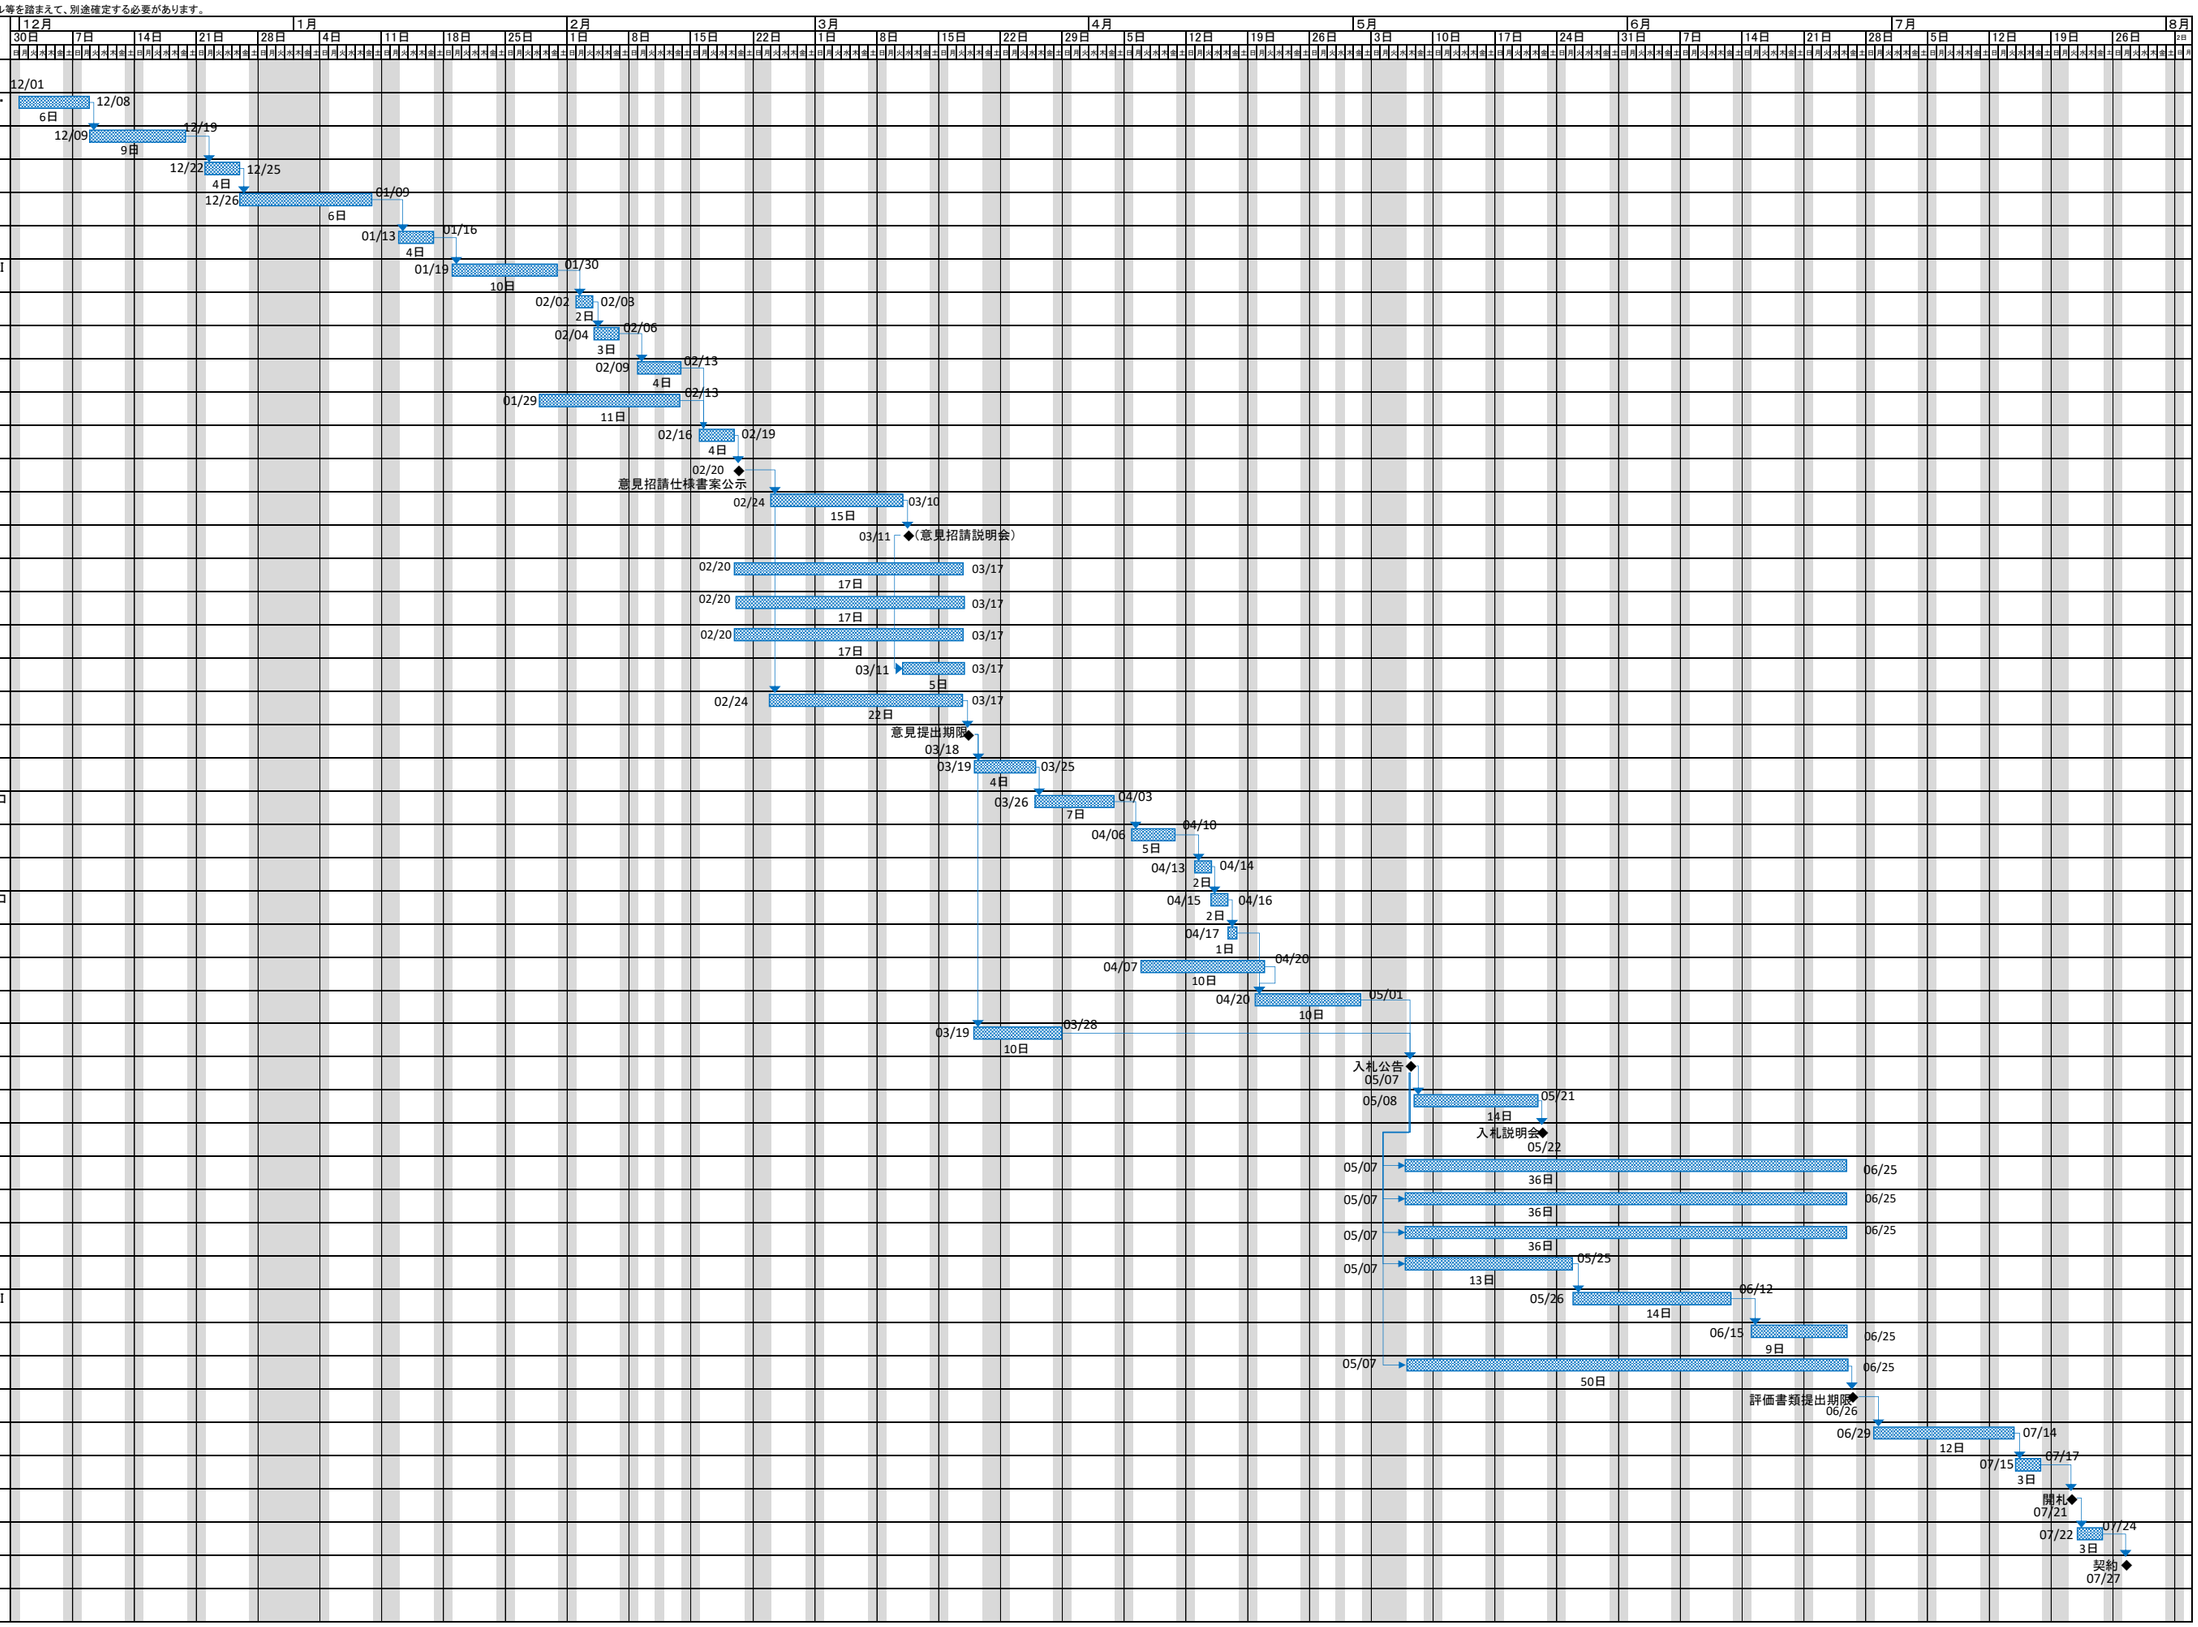
ID	タスクまたはタスク間隔	担当（NRI想定）	開始	終了	期間
1	【2026年度向け調達】		12/01		
2	仕様書案検討	プロマネT・NRI	12/08	12/12	6日
3	参考意見収集等	プロマネT	12/09	12/19	9日
4	仕様書案修正	NRI	12/22	12/25	4日
5	プロマネTによる仕様書案確認（必要に応じて再度参考意見収集等を行う）	プロマネT	12/26	01/09	6日
6	意見照会準備	調達T	01/13	01/16	4日
7	財務省PMOとの調整、19共済意見照会	調達T・NRI	01/19	01/30	10日
8	財務省PMO等からのコメントを踏まえた仕様書案修正	NRI	02/02	02/03	2日
9	プロマネTによる仕様書案確認	プロマネT	02/04	02/06	3日
10	財務省PMOとの最終調整	調達T	02/09	02/13	4日
11	公示用文書等準備（特段制約がなければ先行着手が望ましい）	調達T	01/29	02/13	11日
12	仕様書等共済組合側決裁、公示準備等	調達T	02/16	02/19	4日
13	意見招請仕様書案公示		02/20	02/20	
14	（通常、公示から中二週間（※土日含む））		02/24	03/10	15日
15	（意見招請説明会）	調達T	03/11	03/11	
16	（公示提出期間）		02/20	03/17	17日
17	（仕様書案交付期間）		02/20	03/17	17日
18	（ドキュメント閲覧要領交付期間）		02/20	03/17	17日
19	（ドキュメント閲覧期間（閲覧は執務室内PCによる）		03/11	03/17	5日
20	（公示から最低中20日（※土日含む））		02/24	03/17	22日
21	意見提出期限		03/18	03/18	
22	意見反映後仕様書作成	NRI	03/19	03/25	4日
23	調達T及びプロマネTによる仕様書案確認	調達T・プロマネT	03/26	04/03	7日
24	財務省PMOとの調整、19共済意見照会	調達T	04/06	04/10	5日
25	財務省PMO等からのコメントを踏まえた仕様書案修正	NRI	04/13	04/14	2日
26	調達T及びプロマネTによる仕様書案確認	調達T・プロマネT	04/15	04/16	2日
27	財務省PMOとの最終調整	調達T	04/17	04/17	1日
28	公告用文書等準備（特段制約がなければ先行着手が望ましい）	調達T	04/07	04/20	10日
29	仕様書等共済組合側決裁、公告準備等	調達T	04/20	05/01	10日
30	（意見招請期限から10日（※土日含む））		03/19	03/28	10日
31	入札公告		05/07	05/07	
32	（通常、公告から中二週間（※土日含む））		05/08	05/21	14日
33	入札説明会	調達T	05/22	05/22	
34	（公示文掲出期間）		05/07	06/25	36日
35	（仕様書等交付期間）		05/07	06/25	36日
36	（閲覧要領交付期間と閲覧期間）		05/07	06/25	36日
37	（業者からの質問受付期間）		05/07	05/25	13日
38	質問回答作成	調達T・NRI	05/26	06/12	14日
39	（質問に対する回答閲覧期間）		06/15	06/25	9日
40	（公告の日から最低中50日（※土日含む）に期限（公告日と期限日含め50日））		05/07	06/25	50日
41	入札、総合評価のための書類提出		06/26	06/26	
42	評価作業	評価担当	06/29	07/14	12日
43	評価結果共済内整理	評価担当，調達T	07/15	07/17	3日
44	開札	調達T	07/21	07/21	
45	（低価格調査期間）		07/22	07/24	3日
46	契約	調達T	07/27	07/27
