

分野名

南戸中長期実行プラン2021
目標工程

活り

作業内容

これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月以降

備考

●1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃)

●1号機燃料取り出しの開始(2027～2028年度)

●2号機燃料取り出しの開始(2024～2026年度)

●1～6号機燃料取り出し完了(2031年内)

カバ

燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討

原子炉建屋上部のガレキの撤去

燃料取り出し用カバーの設置工事

1号機

2号機

燃料取扱設備

1号機

2号機

共用プール

燃料受け入れ

乾式キャスク製作

共用プール空き容量確保(既設仮保管設備受入)

乾式保管設備(共用プール用)検討・設計・設置工事

制御棒等高線量機器取り出し

3号機

4号機

(実績)
・燃料取り出し方法の基本検討
・現地調査等
・作業ヤード整備
・大型カバー準備工事(アンカー削孔他)

(予定)
・燃料取り出し方法の基本検討
・現地調査等
・作業ヤード整備
・大型カバー準備工事(アンカー削孔他)

(実績)
・燃料取り出し方法の基本検討
・南側ヤード干渉物撤去
・原子炉建屋オベフロ除染(除染装置試運転・モックアップ含む)
・地盤改良試験施工
・【規制庁との協働調査】原子炉建屋オベフロシールドブラグ調査準備
・原子炉建屋オベフロ遮蔽体設置【構外】オベフロ遮蔽体設置準備・モックアップ

(予定)
・燃料取り出し方法の基本検討
・南側ヤード干渉物撤去
・原子炉建屋オベフロ除染(除染装置試運転・モックアップ含む)
・原子炉建屋オベフロ遮蔽体設置【構外】オベフロ遮蔽体設置準備・モックアップ
・地盤改良
・地盤改良試験施工

燃料取り出し設備の検討・設計

燃料取り出し設備の検討・設計

(実績)
・なし
(予定)
・なし

(実績)
・乾式キャスク製作・検査
(予定)
・乾式キャスク製作・検査

(実績)
・なし
(予定)
・なし

(実績)
・乾式保管設備(共用プール用)検討
(予定)
・乾式保管設備(共用プール用)検討

(実績)
・高線量機器取り出し方法の検討
・プール内調査

(予定)
・高線量機器取り出し方法の検討
・プール内調査
・プール内ガレキ撤去

(実績)
・高線量機器取り出し方法の検討
(予定)
・高線量機器取り出し方法の検討

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計


現場作業

検討・設計

現場作業

検討・設計

<

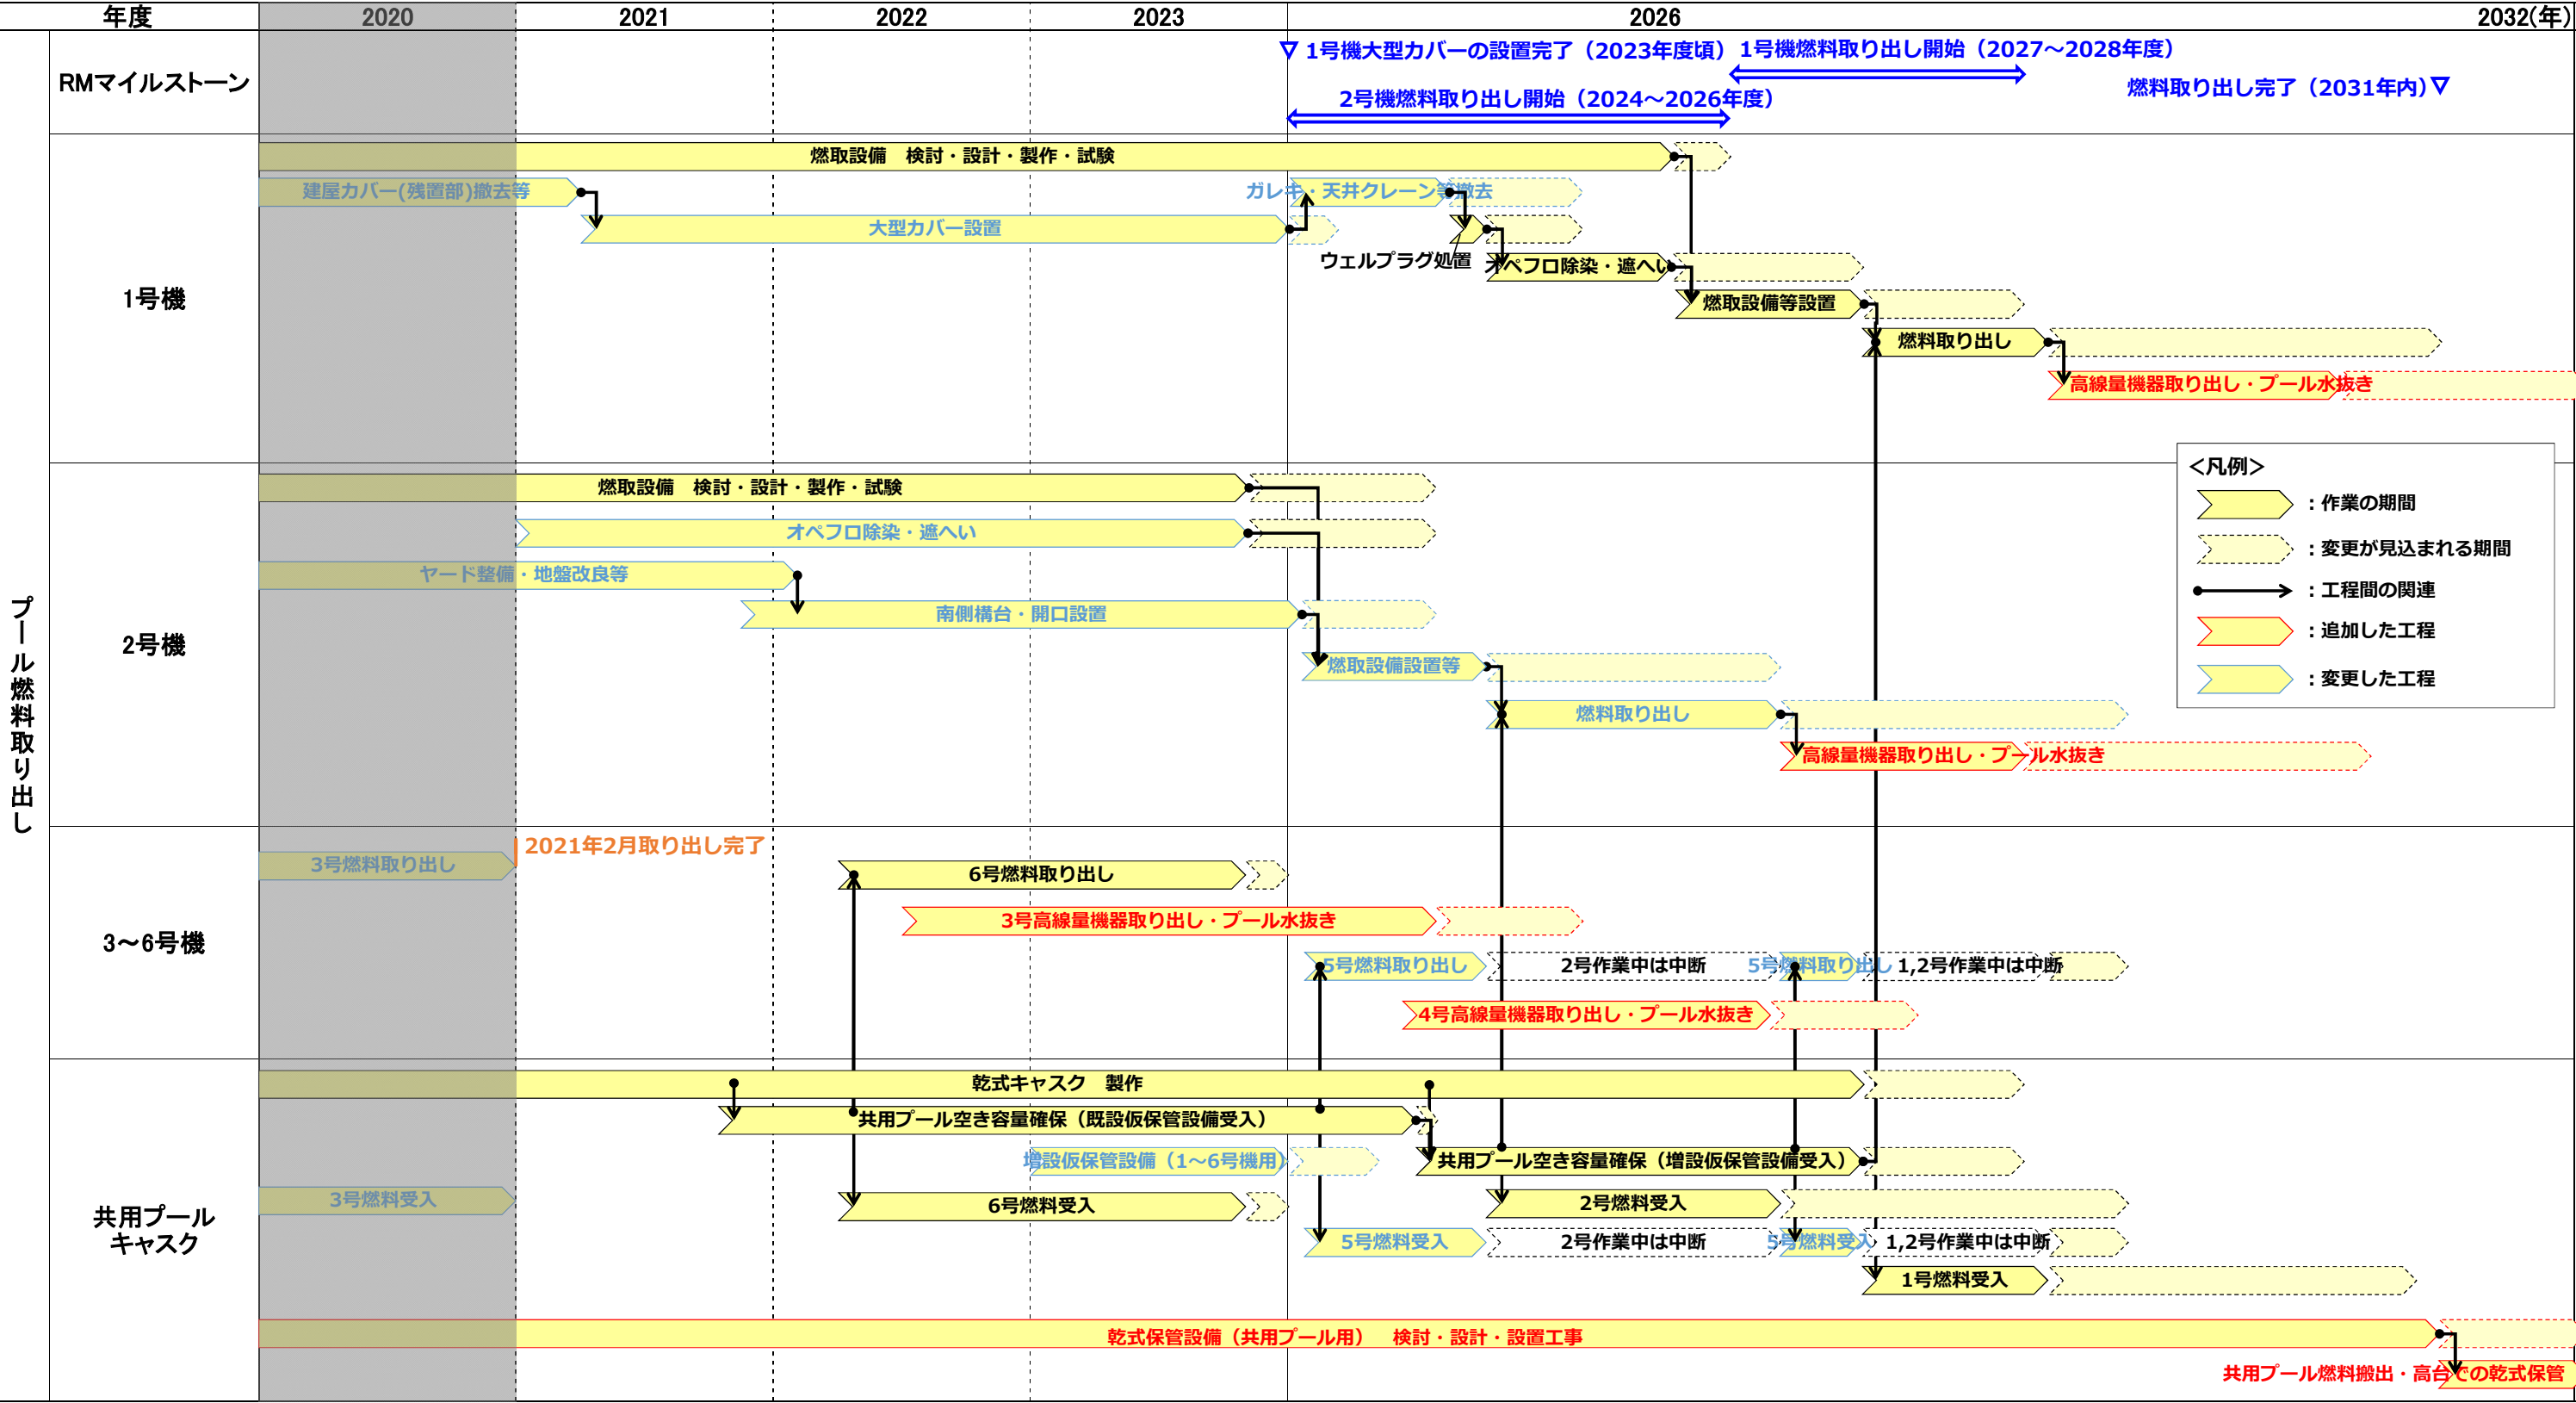

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更した工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
